



KATOWICE
dla odmiany

Sprawozdanie z realizacji w latach
2022-2023

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata
2016-2023

Miasto Katowice
Kwiecień 2025

Spis treści

1. Informacja sprawozdawcza z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice w miejskich podobszarach rewitalizacji	4
1.1 Podobszar Śródmieście	4
1.1.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	4
1.1.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	5
1.1.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze	21
1.2 Podobszar Zawodzie	24
1.2.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	24
1.2.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	25
1.2.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze	27
1.3 Podobszar Załęże	30
1.3.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	30
1.3.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	31
1.3.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze	34
1.4 Podobszar Bogucice	36
1.4.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	36
1.4.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	37
1.4.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze	39
1.5 Podobszar Szopienice-Burowiec.....	42
1.5.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	42
1.5.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	43
1.5.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze	50
1.6 Podobszar Janów-Nikiszowiec	53
1.6.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	53
1.6.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	54
1.6.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze	58
2. Informacja sprawozdawcza z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice w podobszarach występowania problemów przestrzennych	60
2.1 Podobszar Zawodzie – Porcelanowa	60
2.2 Podobszar Dąb – Baildona	63
2.3 Podobszar Kolonia Alfred	65
2.4 Podobszar Wełnowiec – Konduktorska	67
2.5 Podobszar Szopienice - Woźniaka	70
2.6 Podobszar Śródmieście – Raciborska	71
3. Informacja sprawozdawcza z realizacji projektów i polityk horyzontalnych, obejmujących cały obszar Katowic	72
4. Podsumowanie	86

Wstęp

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023” przyjęto po raz pierwszy uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXVII/559/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na podstawie Programu przyjętego uchwałą nr XLVII/1043/22 z dnia 28.04.2022 r., który aktualizował pierwotnie przyjęty dokument i obowiązywał do 31 grudnia 2023 r.

Kompleksowe przekształcanie obszarów zdegradowanych jest procesem wielopłaszczyznowym, angażującym różnych interesariuszy, różne źródła finansowania i zmierzającym do wielowymiarowej poprawy wskazanych obszarów. Część bezpośrednich i pośrednich rezultatów interwencji jest widoczna z opóźnieniem. Niezbędnym elementem prawidłowej realizacji Programu są działania związane z monitoringiem i ewaluacją. Sprawozdanie z realizacji Programu było narzędziem bieżącego monitoringu, służącego kontroli postępu prac w ramach realizacji poszczególnych projektów (podstawowych i pozostałych), identyfikacji ewentualnych zagrożeń realizacji Programu, czy też o koniecznych działaniach zaradczych. Informacje zgromadzone w ramach poszczególnych raportów sprawozdawczych będą również wykorzystane do opracowania raportu ewaluacyjnego.

W ramach monitorowania wdrażania Programu Rewitalizacji, we współpracy z członkami Zespołu Wdrażającego ds. realizacji LPR, zgromadzono informacje o charakterze jakościowym, obejmujące dane o stopniu realizacji działań i projektów podejmowanych w poszczególnych podobszarach rewitalizacji **w latach 2022-2023** przez komórki i jednostki organizacyjne Miasta Katowice oraz podmioty zewnętrzne (instytucje publiczne, sektor biznesu i organizacje pozarządowe).

Informacja sprawozdawcza obejmuje zarówno **projekty podstawowe** tj. ujęte w Załączniku nr 1 do LPR, jak i **pozostałe przedsięwzięcia** podejmowane w obszarze rewitalizacji, ukierunkowane na ograniczenie negatywnych zjawisk i poprawę sytuacji w obszarze.

Dla celów sprawozdawczości rzeczowej i finansowej w odniesieniu do projektów podstawowych zakończonych przez Miasto, za punkt odniesienia przyjęto stan na dzień 31.12.2023 roku - uchwałą nr IV/34/24 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2023 rok, względem LPR przyjętego dnia 28.04.2022 r. (uchwałą nr XLVII/1043/22). Dla projektów, których harmonogram realizacji wykracza poza rok 2023 (w tym jej rozpoczęcie) bądź od których odstąpiono, informacja o stanie realizacji uwzględnia upływ czasu.

Informację w zakresie realizacji projektów zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne zgromadzono na podstawie wypełnionych i odesłanych kart monitoringowych, rozesłanych uprzednio do projektodawców. Każdoroczna informacja zwrotna informująca o zmianie projektów zewnętrznych stanowi jednocześnie podstawę do rozważenia kolejnej aktualizacji LPR.

Materiał sprawozdawczy przedstawiono w podziale na poszczególne podobszary rewitalizacji: **podobszary miejskie** oraz **podobszary występowania problemów przestrzennych**. Informacja o danym podobszarze zawiera: zestawienie projektów podstawowych wraz z wykonanym zakresem rzeczowym w okresie sprawozdawczym, skorelowaną z nim mapę z zaznaczonymi lokalizacjami projektów, a także opis pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, kompleksowy pakiet wiedzy o działaniach miasta i podmiotów zewnętrznych w nim podejmowanych. Szczegółowe dane finansowe i opis wykonanego zakresu rzeczowego dla poszczególnych zrealizowanych projektów miejskich prezentuje Załącznik 1.

1. Informacja sprawozdawcza z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice w miejskich podobszarach rewitalizacji

1.1 Podobszar Śródmieście

1.1.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Cel rewitalizacji	Kierunki działań
– depopulacja – starzenie się – bezrobocie – ubóstwo i wykluczenie społeczne – przestępczość – zły stan środowiska – zły stan techniczny budynków	Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej obejmujące poprawę warunków zamieszkania, odnowę przestrzeni publicznych oraz podniesienie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców wyłączonego z korzyści rozwoju społeczno-gospodarczego Katowic.	wymiar społeczno-kulturowy: – tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, – rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, – wspieranie większego zaangażowania seniorów zarówno w sprawy dzielnicy, jak i ich aktywnego włączenia w ofertę społeczno-kulturalną miasta, – poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, wymiar infrastrukturalno-środowiskowy: – tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, – podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej.

Rysunek 1. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Śródmieście



* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 1 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2023; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (przesunięto na lata następne), O – odstąpiono od realizacji

5

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
3	Miasto Katowice (MOPS) NGO Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43	2015-2018	5 838 981 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
4	Miasto Katowice Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”	2013, 2015-2020	66 435 365 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
5	Miasto Katowice Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „św. Jana”	2019-2024; 2026-2027	7 433 226 zł	nd.	4 291 zł	W roku 2022 brak wykonanego zakresu. W roku 2023 trwała aktualizacja dokumentacji projektowej oraz prace projektowe.	P
6	Miasto Katowice Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	2005-2019	272 896 544 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
7	Miasto Katowice Przebudowa strefy śródmiejskiej – obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	2016-2023	44 790 528 zł	14 640 805zł	7 255 075 zł	W roku 2022 trwały prace budowlane (dot. Budowy maszyn do parkowania). Został zawarty aneks na wykonanie robót dodatkowych i wydłużenie terminu wykonania umowy. Ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem ul. Tylnej Mariackiej w strefę toalet publicznych oraz zespołu pojemników na odpady komunalne. W roku 2023 zakończono prace związane z budową automatycznego parkingu. Zakończono odbiory techniczne oraz testy, w listopadzie parking oddano do użytkowania mieszkańcom. Zakończono prace związane z zagospodarowaniem ulicy Tylnej Mariackiej.	R
8	Miasto Katowice (KZGM) Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową	2015-2016	750 000 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
9	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI (oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15)	2015-2019	1 436 697 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
10	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III (oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43)	2015-2019	2 404 051 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
11	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A (LO VIII przy ul. 3 Maja 42)	2016, 2018, 2020-2022	10 900 736 zł	4 755 706 zł	nd.	W roku 2022 zakończono termomodernizację wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42. Zadanie zakończone.	Z
12	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II (Dom Dziecka „Stanica”)	2015-2018, 2020-2022	2 125 451 zł	21 638 zł	nd.	W roku 2022 uregulowano należności za pełnienie usług Inżyniera Kontraktu i Inwestora zastępczego dot. termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Plebiscytowej 46 - 46a w Katowicach (siedziby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych DOM 1 - 3 w Katowicach). Zadanie zakończone.	Z
13	Miasto Katowice (KZGM) Budowa placu zabaw ze strefą fitness	2015-2016	744 098 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
14	Miasto Katowice Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek".	-	-	nd.	nd.	Przesunięto realizację zadania na lata kolejne.	P
15	Miasto Katowice Rozbudowa, modernizacja oraz termomodernizacja bazy dydaktyczno-administracyjnej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach	2011-2018	15 450 000 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
16	Miasto Katowice Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej	2016-2017	996 370 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
17	Miasto Katowice Strefa Innowacji Miasta Katowice – Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii	2018-2019	999 204 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
18	Miasto Katowice Przebudowa budynku Warszawska 4 / Teatralna 7	-	-	nd.	nd.	Odstąpiono od realizacji zadania.	O
19	Miasto Katowice Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego	2018-2019	1 000 000 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
20	Miasto Katowice Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach – Miejski Inkubator Przedsiębiorczości	2016-2019	5 473 128 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
21	Miasto Katowice (MOPS) Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap	2019-2021	826 833 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
22	Miasto Katowice (MOPS) Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu	2020-2021	2 070 133 zł	1 217 972 zł	nd.	W roku 2022 w ramach Centrum Społecznościowego w Śródmieściu zrealizowano m.in.: warsztaty artystyczne, warsztaty zielarskie, spotkania z dietetykiem, pikniki integracyjne, wyjazdy edukacyjno-integracyjne, szkolenie z pierwszej pomocy. Kontynuowano również realizację Programu wspierającego reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Zawodzie. W ramach Programu objęto wsparciem 16 osób biernych zawodowo, z których 14 podjęło pracę. W ramach Centrum Społecznościowego w Zawodziu realizowano m.in. spotkania „Klubu Mieszkańca”, spotkania „Klubu Wolontariusza”, spotkania edukacyjno-integracyjne, wyjścia integracyjne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych. W ramach działań senioralnych zrealizowano m.in. spotkania ze specjalistą ds. organizowania społeczności lokalnej, wyjścia do filharmonii, spotkanie wielkanocne, zajęcia taneczne oraz sportowe. Zadanie zakończone.	Z
23	Miasto Katowice Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza	-	-	nd.	nd.	Odstąpiono od realizacji zadania.	O
24	Miasto Katowice (ZZM) Zazielenienie bulwarów Rawy (BO)	2019-2020	118 741 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończono.	Z
25	Miasto Katowice (MZUiM) Nowy Plac Rostka – strefa przyjazna mieszkańcom. Przebudowa placu, odnowienie nawierzchni jezdni, odnowienie chodników, nowe drzewa, rośliny, ławki, stacja wypożyczania rowerów	2020-2021	537 275 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
26	Miasto Katowice (ZZM) Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	2021-2023	17 158 243 zł	1 296 736 zł	15 510 458 zł	W roku 2022 podpisano umowę na roboty budowlane. W ramach prac nad dokumentacją projektową konieczne było uwzględnienie dodatkowego zakresu, co opóźniło rozpoczęcie robót budowlanych, dodatkowo konieczne były uzgodnienia przyłączy sieci. W roku 2023 wyłączono z ruchu kołowego ul. Warszawską na odcinku od ul. Dyrekcyjnej do ul. Szkolnej oraz znacznie uspokojono go od ul. Szkolnej do ul. Francuskiej - za sprawą wprowadzenia strefy Tempo 30 oraz zmian w organizacji ruchu na tym fragmencie ul. Warszawskiej. Zasadzono 70 drzew oraz kilka tysięcy sztuk krzewów i bylin, ustawiono elementy małej architektury. Zadanie zakończone.	Z
27	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 4, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11	2019-2023	9 731 519 zł	329 212 zł	5 667 676 zł	W 2021r. zakończono roboty budowlane w budynku przy ul. Słowackiego 11 i św. Jana 14 W 2022 w budynku przy ul. Gliwickiej 4 odstąpiono od części umowy zawartej z wykonawcą w roku 2020 na wykonanie robót budowlanych, gdyż wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych na wartość przekraczającą 50% wartości przedmiotu umowy. Konieczne było zwiększenie środków na zadaniu. Przygotowane zostały dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót. W wyniku postępowania wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. Przekazano plac budowy oraz wykonano roboty rozbiórkowe. W roku 2023 kontynuowano roboty budowlane dot. robót budowlanych w budynku przy ul. Gliwickiej 4 (ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana stolarki otworowej, budowa indywidualnych instalacji c.o. i ccw., remont dachu, elewacji frontowej, klatek schodowych i piwnic). Zadanie zakończone.	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
28	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	2021-2023	2 276 243 zł	0	1 336 403 zł	W roku 2022 została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Nastąpił odbiór końcowy dokumentacji. Przygotowane zostały materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, planowanych do wykonania w 2023 r. W roku 2023 realizowano prace budowlane.	R
29	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	2022-2026	5 212 964 zł	135 300 zł	131 784 zł	W roku 2022 kontynuowano realizację umowy . Opracowana i odebrana została dokumentacja Etapu I i II. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. W roku 2023 roboty w zakresie przygotowania pomieszczenia wężła ciepłego zostały zakończone, nastąpił odbiór techniczny. Trwały prace projektowe na przebudowę budynku.	R
30	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	2021-2026	5 842 223 zł	138 zł	1 696 785 zł	W roku 2022 w zakresie przebudowy wewn. instalacji gazowej przeprowadzono procedurę zgłoszenia robót. Po uprawnieniu został założony dziennik budowy. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia i poprawienia dokumentacji. W roku 2023 została podpisana umowa na realizację etapu I z terminem zakończenia do 04.04.2024r. Trwa realizacja robót budowlanych. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na II etap modernizacji.	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
31	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kochanowskiego 14, 14a	2021-2023	212 950 zł	202 950 zł	0	W roku 2022 opracowany został projekt budowlany dla budynku frontowego, projekt rozbiórki oficyny tylnej i garaży oraz koncepcja projektowa dla budowy budynku tylnego. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę oraz wniosek o zaopiniowanie zgodności zamierzenia budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wydano negatywną opinię w zakresie odbudowy oficyny tylnej i w związku z tym prace projektowe zostały wstrzymane. W roku 2023 ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w opracowanej dokumentacji, KZGM przedłożył wykonawcy porozumienie w sprawie wznowienia prac projektowych, którego warunków wykonawca nie przyjął. Zlecenie dokończenia dokumentacji i uzyskania wymaganych pozwoleń zostało ujęte w planie na rok kolejny.	P
32	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach	2019; 2021-2023	2 337 034 zł	1 045 863 zł	1 181 903 zł	W roku 2022 rozpoczęto i realizowano prace obejmujące: docieplenie oraz izolację ścian piwnic, docieplenie ścian, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, remont pomieszczenia wężla ciepłego, likwidację pieców kaflowych, remont dachu, renowację elewacji frontowej, instalację c.o., instalację c.w.u. instalacje elektryczne, wymianę okien, przyłącze kanalizacyjne. W roku 2023 kontynuowano roboty budowlane. Zadanie zakończone.	Z
33	Miasto Katowice "Zielona Strefa Nauki" - Rekonstrukcja zielononiebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy	2022, 2025-2028	2 095 940 zł	95 940 zł	0	W roku 2022 opracowano wstępne studium wykonalności. W roku 2023 realizacja zadania została przeniesiona na lata następne w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych.	P
34	Miasto Katowice Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach	-	-	nd.	nd.	Przesunięto realizację zadania na lata kolejne.	P

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
35	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Opolskiej 13, 13a w Katowicach	2019-2026	6 989 168 zł	133 114 zł	1 039 692 zł	W roku 2022 została opracowana i odebrana dokumentacja Etapu I, II i III. Złożony został wniosek o uzyskanie pozwolenia budowlanego za realizację Etapu I. W roku 2023 zostało ogłoszone postępowanie oraz zawarta umowa na realizację robót budowlanych budynku przy ul. Opolskiej 13 terminem zakończenia do dnia 21.02.2024r. Trwały roboty budowlane.	R
36	Miasto Katowice (MZUiM) Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach	2021-2022	4 295 868 zł	4 198 698 zł	nd.	W roku 2022 w ramach inwestycji rozebrano wyeksploatowaną kładkę oraz most, w miejscu których wybudowano jedno-przęsłowy most o konstrukcji ramowej. Obiekt wyposażony jest w jezdnię, ścieżkę pieszorowerową oraz ścieżkę pieszą. Zadanie zakończone.	Z
37	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej WSZOP	2020-2023	1 000 000 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
38	WM przy ul. Słowackiego 22 i 3 maja 40 w Katowicach Remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Słowackiego 22 i 3 Maja 40 w Katowicach	-	-	b.d.	b.d.	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-
39	Uniwersytet Śląski w Katowicach Rewitalizacja przestrzeni katowickiego kampusu Uniwersytetu Śląskiego	-	-	nd.	nd.	Przesunięto realizację zadania na lata kolejne.	P
40	Uniwersytet Śląski w Katowicach Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego	-	-	nd.	nd.	Przesunięto realizację zadania na lata kolejne.	P
41	BMP Invest Sp. z o.o., Sp. k. Rewitalizacja zdewastowanej substancji mieszkaniowej (lokali mieszkalnych) z przeznaczeniem na najem, najem okazjonalny czy inne formy zakwaterowania wraz z częścią usługową	-	-	b.d.	b.d.	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
42	Epione Sp. z o.o. Rewitalizacja zespołu kamienic z częściową nadbudową w kwartale ulic: Dworcowa, Dyrekcyjna, Mielęckiego	2016-2023 ¹	75 000 000 zł	3 065 834 zł	4 367 140 zł	W roku 2022 zrealizowano dalsze etapy projektowania skutkujące złożeniem i uzyskaniem zaktualizowanych warunków zabudowy. W roku 2023 przygotowano dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W listopadzie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie jego wydania.	R
43	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Inkubator Kultury dla Młodych (wcześniej: Centrum Spotkań Wielopokoleniowych na Starym Dworcu w Katowicach)	2022-2023 ²	700 000 zł	nd.	b.d.	W roku 2022 brak rzeczowego wykonania zadania. W roku 2023 we współpracy z Fundacją Teatru Śląskiego „Wyspiański” zrealizowano „Program integracji polsko-ukraińskiej” z wykorzystaniem działań teatralnych i artystycznych dla ok. 300 uczestników. W ramach działań społecznych zorganizowano cykl warsztatów dla różnych grup wiekowych, cykl konferencji merytorycznych, wystaw i akcji społecznych, zespołów wolontariackich. Na bazie wspólnego projektu uczestnicy warsztatów przygotowali spektakl, który stanowił podsumowanie współpracy w 2023 r.	R
44	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Centrum Animacji - Strefa Inkubacji "STARTNOW new life" na Starym Dworcu w Katowicach	2022-2023 ³	3 000 000 zł	nd.	b.d.	W roku 2022 brak rzeczowego wykonania zadania. W roku 2023 w ramach działania Akademii Przedsiębiorczości w roku 2023 zorganizowano spotkanie na temat możliwości pozyskania środków unijnych na rozwój działalności gospodarczej. W ramach spotkania odbywały się również spotkania indywidualne związane z tematyką pozyskiwania środków zewnętrznych.	R

¹ Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r.

² Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r.

³ Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
45	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach - etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic (ul. Dworcowa 8) Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach - etap II. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic (ul. Dworcowa 2-4) Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach - etap III i kolejne. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic (ul. Dworcowa 6, 10)	2019-2023	36 000 000	10 000 000	b.d.	W roku 2022 – ul. Dworcowa 8 zakończono prace budowlane obejmujące: zadanie 1 : Prace budowlane, wyburzeniowe i konserwatorskie, zadanie 2 : Prace w zakresie termomodernizacji, zadanie 3: Prace instalacyjne i wykończeniowe. ul. Dworcowa 10: rozpoczęto rewitalizację obiektu, po wcześniejszych pracach zabezpieczających. Wykonano m.in. instalacje sanitarne, elektryczne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont poszycia dachowego. W roku 2023 – ul. Dworcowa 8 zakupiono wyposażenie strefy społecznej, która rozpoczęła funkcjonowanie. ul. Dworcowa 10: zakończono prace remontowe i adaptacyjne obiektu. ul. Dworcowa 2-4 – projekt pozostaje w okresie trwałości. Zadanie zakończone.	Z
46	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Klubokawiarnia społeczno-kulturalna „Na starym dworcu” (wcześniej: Utworzenie Klubu Rozwoju Dzieci i Młodzieży na Starym Dworcu w Katowicach)	2023 ⁴	1 400 000 zł	nd.	nd.	W okresie sprawozdawczym, razem z partnerem społecznym, zrealizowano ok. 10 wydarzeń, w tym warsztaty teatralne, warsztaty z ciałem, spotkanie dla wolontariuszy, warsztaty asertywności dla ponad 200 osób.	R
47	Uniwersytet Śląski w Katowicach Budowa Strefy Akademickiej przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach	-	-	nd.	nd.	Wnioskodawca podjął decyzję o wykreśleniu projektu z LPR.	O
48	Śląskie Kamienice S. A. Konserwacja i przywrócenie stanu pierwotnego zabytkowej elewacji	-	-	bd.	bd.	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-

⁴ Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
49	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zacisze 2 w Katowicach Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Zacisze 2. Kompleksowy remont zabytkowej frontowej elewacji budynku oraz dachu. Likwidacja barier architektonicznych	2017-2023 ⁵	2 000 000 zł	18 100 zł	54 000 zł	W roku 2022 wykonano projekt remontu elewacji oraz dachu. W roku 2023 wykonano remont dachu w części papowej wraz z wymianą obróbek blacharskich, remontem kominów oraz wymianą dachówki.	R
50	Europejski Specjalistyczny Instytut Medyczny JDZ Sp. z o.o. Utworzenie Centrum Integracji Wielopokoleniowej "Pod jednym dachem" wraz z przeprowadzeniem działań remontowych i adaptacyjnych	2018-2023	3 000 000 zł	300 000 zł	b.d.	W roku 2022 wykonano wymianę instalacji elektrycznej, domofonowej, remont części pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu znajdujących się na I i II piętrze. W roku 2023 nie odesłano karty monitoringowej.	-
51	Uniwersytet Śląski w Katowicach SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu	2019-2023	29 216 781 zł	4 329 783 zł	17 926 571 zł	W roku 2022 trwały roboty budowlane. W roku 2023 kontynuowano i zakończono roboty budowlane - prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne budynku, na które składały się m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne, pokrycie dachowe, okładzina ogniochronna, ścianki działowe/ sucha zabudowa ścienna, posadzki, tynki wewnętrzne, roboty wykończeniowe wewnętrzne, urządzenia dźwigowe, stolarka i ślusarka, balustrady, termoizolacja ścian zewnętrznych, remont elewacji zgodnie z programem prac konserwatorskich. Nastąpiła również realizacja zadania projektu polegającego na wyposażeniu budynku w meble, sprzęt wraz z oprogramowaniem. Nad realizacją zadania sprawowany był nadzór inwestorski oraz autorski. Zadanie zakończone.	Z

⁵ Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
52	Kamil Rechowicz-Szawica, Maksymilian Frączek, Małgorzata Myśliwiec – Frączek Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa kamienicy mieszkalnej przy ul. Szkolnej 8 w Katowicach na cele mieszkalno-usługowe	-	-	0	0	W roku 2022 otrzymano wymagane pozwolenia na budowę dla całości projektu, otwarto dziennik budowy, prace wstrzymane do czasu pozyskania finansowania zewnętrznego. W roku 2023 brak wykonania rzeczowego. Realizację zadania przesunięto na lata kolejne.	P
53	KTBS Sp. z o.o. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej poprzez realizację obiektu przy ul. Francuskiej 5 w Katowicach, stanowiącego domknięcie pierzei zabudowy wyznaczonej wzdłuż ulicy Mariackiej przeznaczonego na cele usługowo-społeczno-kulturalne	2019-2023 ⁶	16 058	5 480 zł	10 578 zł	Realizację zadania przesunięto na lata kolejne.	P
54	DUET INVEST Sp. z o.o. Sp. k. (wcześniej: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Duet" Sp. z o.o.) Rewitalizacja budynku kamienicy przy ul. Młyńskiej 13/Wawelskiej 3	2019-2023 ⁷	24 170 000 zł	0	200 000 zł	W roku 2022 wykonano palowanie budynku oraz podłączono Tauron Ciepło. W roku 2023 wykonano pomieszczenie wymiennikowni.	R
55	KTBS Sp. z o.o. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej poprzez realizację przebudowy 3 kamienic mieszkalnych przy ul. Mariackiej 30,32,34 w Katowicach, z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych i społecznych	2019-2023 ⁸	30 032 330 zł	1 349 279 zł	12 946 649 zł	W roku 2022 uzyskano zamienne pozwolenie na budowę mające na celu znaczne ograniczenie kosztów inwestycji. Wyłoniono Generalnego Wykonawcę, podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane. Złożono wniosek o finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopląt. W roku 2023 trwały prace budowlane.	R

⁶ Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r.

⁷ Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r.

⁸ Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
56 ⁹	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13,13a, ul. J. Zarębskiego 5a, 7a i ul. Ks. Bpa H. Bednorza 14	2018-2021	7 210 348 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
57 ¹⁰	Miasto Katowice (CUW/Żłobek Miejski) Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent miękki)	2015-2017, 2019	2 842 045 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
57	Miasto Katowice (CUW/Żłobek Miejski) Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent twardy)	2015-2017	2 836 084 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	
58 ¹¹	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2017-2023	21 253 355 zł	81 774 zł	698 504 zł	- ul. 3 Maja 36: realizacja zakończona w 2017r. - ul. Plebiscytowa 4, 4a: realizacja zakończona w 2017r. - ul. Mikołowska 11, 13: realizacja zakończona w 2016r. - ul. Szeligiewicza 3c: realizacja zakończona w 2018r. - ul. Powstańców 7 i 9: realizacja zakończona w 2020r. - ul. PCK 1: realizacja zakończona w 2017r. - ul. Drzymały 13: realizacja zakończona w 2017r. - ul. Warszawska 6/Teatralna 9: w roku 2023 zaktualizowany został projekt i kosztorys inwestorski na wykonanie robót polegających na zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz kompleksowym remoncie 2 klatek schodowych. Na 2024 rok zaplanowano roboty w budynku Teatralna 9 tj. kompleksowy remont klatek schodowych, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją i roboty towarzyszące. - ul. Warszawska 42: odstąpiono od realizacji zadania w związku z zamiarem wystąpienia przez miasto ze współwłasności - ul. Królowej Jadwigi 6: odstąpiono od realizacji zadania na rzecz zadań o większym stopniu pilności - ul. Astrów 3/Różana: realizacja zakończona w 2017 r.	R

⁹ Projekt realizowany w 3 lokalizacjach w podobszarach: Śródmieście, Załęże, Szopienice-Burowiec. Podana kwota obejmuje wszystkie wskazane lokalizacje.

¹⁰ Projekt realizowany w dwóch lokalizacjach: ul. Uniwersytecka 15 (podobszar – Śródmieście), ul. Marcinkowskiego 13 (podobszar – Zawodzie). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

¹¹ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
						ul. Skłodowskiej 42: w 2022 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji; w roku 2023 przeprowadzono 2 przetargi na wykonanie renowacji i przebudowy przegród zewnętrznych budynku. Pierwszy przetarg unieważniono z powodu braku ofert. W dniu 04.12 nastąpiło otwarcie ofert w ramach drugiego przetargu. Trwała procedura przetargowa. ul. Stawowa 8: w 2022 roku została opracowana dokumentacja i ogłoszone postępowanie publiczne. Wpłynęły oferty przekraczające wysokość środków, przeznaczonych na sfinansowanie zadania. Mimo zwiększenia środków na zadaniu, postępowanie zostało unieważnione i przesunięte na rok kolejny; w roku 2023 zawarta została umowa na wykonanie robót budo-wlanych polegających na wyko-naniu źródła ciepła w postaci pompy ciepła wraz z wymianą i rozbudową instalacji c.o. oraz robotami elektrycznymi i remontem dachu budynku Komisariatu VI Policji. Roboty zostały zakończone, odbiór techniczny nastąpił w dniu 30.10.23r. Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1: w roku 2022 ogłoszone zostało postępowanie konkursowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji. Oferty znacznie przewyższały środki finansowe, zadanie zostało przesunięte na rok kolejny; w roku 2023 ogłoszone zostało postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji. Po zwiększeniu środków finansowych na wykonanie dokumentacji, zawarto umowę. Przesunięto zakończenie zadania na rok 2024, ze względu na rozszerzenie zakresu dokumentacji o wymianę części stropów piwnic, będących w złym stanie technicznym. Trwały prace projektowe.	
59 12	Miasto Katowice (KZGM) Budownictwo mieszkaniowe-komunalne (ul. Kordeckiego 3, 4)	2009-2017	11 967 662 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z

¹² Projekt realizowany w dwóch lokalizacjach: ul. Kordeckiego 3, 4 (podobszar – Śródmieście), ul. Obr. Westerplatte 42-50 (podobszar – Szopienice-Burowiec). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
60	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	2018-2023	1 488 257 zł	1 341 669 zł	nd.	ul. Św. Jana 9: w 2022 roku została zawarta umowa na wykonanie remontu budynku usługowo-mieszkalnego; w 2023 roku zakończono realizację zadania przy ul. Św. Jana 9 ul. Sienkiewicza 17: zadanie zakończone w 2020 r. Zadanie zakończone.	Z
61	Miasto Katowice (ŚTZN) Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w ŚTZN	2015-2018	3 549 561 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
62	Miasto Katowice (ŚTZN/CUW) SOS Szkolenia otwartych szans	2016-2018	525 427 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
63	Miasto Katowice (ŚTZN) Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach	2019	1 449 273 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
64	Miasto Katowice (ŚTZN) SOS_2 szkolenia otwartych szans	2019-2020	625 983 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
65	Miasto Katowice (ŚTZN) SOS_3 szkolenia otwartych szans	2020-2022	1 037 418 zł	280 332 zł	nd.	W roku 2022 zorganizowano kursy: wykorzystywanie nowoczesnych metod analizy spektroskopowej w wybranych zagadnieniach analityki z zakresu ochrony środowiska oraz produktów żywnościowych, dla kandydatów na uczelnie wyższe ITC na poziomie zaawansowanym, spawania metodą MIG/MAG dla nauczycieli, wykorzystywanie nowoczesnych metod analizy chromatograficznej w wybranych zagadnieniach analityki z zakresu ochrony środowiska oraz produktów żywnościowych, dla kandydatów na uczelnie wyższe z matematyki i fizyki na poziomie zaawansowanym, kurs spawania dla	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
						uczniów metodą MMA, kurs z języka angielskiego zaawansowanego, z zakresu SEP, przeprowadzono zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 4 uczniów i 3 nauczycieli odbyło staże zawodowe. Zadanie zakończone.	
66	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach	2017-2023 ¹³	4 198 837 zł	0	39 147 zł	W 2022 roku brak wykonania rzeczowego. W 2023 roku w ramach zadania pn.: Podniesienie jakości programu kształcenia poprzez modernizację zaplecza technicznego Wydziału Artystycznego dokonano zakupu wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej: - zestawu komputerowego z systemem operacyjnym, - oprogramowania audio i video oraz oprogramowania graficznego, - zestawu wyposażenia video, - zestawu wyposażenia audio.	R
67	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Przebudowa (modernizacja) budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach w celu dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawy efektywności energetycznej	2021-2023 ¹⁴	8 859 000 zł	923 zł	7 913 zł	W roku 2022 wykonano dokumentację projektową. W roku 2023 uzgodniono oraz wykonano dokumentację dotyczącą węzła centralnego ogrzewania z Tauron Ciepło Sp. z o.o. Wykonano również usługę geodezyjnego wytyczenia.	R
68	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Przebudowa (modernizacja) budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19 w celu dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawy efektywności energetycznej	2021-2023 ¹⁵	13 300 000 zł	149 545 zł	0	W roku 2022 i 2023 wykonano koncepcje architektoniczne modernizacji części przestrzeni budynku.	R

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22).

W granicach podobszaru Śródmieście planowano do realizacji **68 projektów: 46 miejskich** (w tym 1 dwuetapowo) i **22 pozamiejskich**. Z czego **36 projektów** zrealizowano, w trakcie realizacji jest kolejnych **16 projektów**, natomiast planowanych do realizacji (przesuniętych na lata kolejne) jest **9 projektów**, odstąpiono od **3 projektów**. W zakresie **4 projektów** pozamiejskich brak jest aktualnej informacji sprawozdawczej.

¹³ Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r.

¹⁴ Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r.

¹⁵ Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r.

1.1.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru rewitalizacji Śródmieście, w roku 2022 oraz 2023 r. zrealizowano w ramach:

- **działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu:** funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypożyczania rowerów. W 2022 i 2023 r. funkcjonowały stacje "Katowice Rynek", "Plac Wolności", "Mariacka Kościół", "Plac Sejmu Śląskiego", "Plac Hlonda", "Plac Miarki", „Węzeł Sądowa”, „NOSPR Katowice”, "Plac Rostka", „Rondo gen. J. Ziętka”, „Dworzec PKP – Młyńska”, „Plac Andrzeja”, „Skwer Przyjaciół z Miskolca, „Dworcowa”, „Kościuszki/ Poniatowskiego/ Szeligiewicza” oraz „Rynek – Teatr Śląski”.
- **działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego** w ramach *Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego* m.in. poprzez zwiększenie liczby umundurowanych patroli Policji na ulicach (finansowanie dodatkowych służb patrolowych; w 2022 roku odbyło się 439, a w 2023 roku 705 służb ponadnormatywnych); w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, w 2022 roku zamontowano 21 kamer w ramach zadania pn: „Uzupełnienie punktów kamerowych śródmieścia Katowic o kamery stacjonarne”. Dodatkowo zamontowano 1 kamerę na skrzyżowaniu ul. Wolności i ul. Baczyńskiego, w ramach *Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy*.
- **inwestycji i remontów realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych:**
 - przez jednostki oświatowe (działalność remontowa):** m.in.: w 2022 r. remont: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Szkoły Podstawowej Specjalna nr 7, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach; w 2023 r. remont: Pałacu Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego, Szkoły Podstawowej nr 1, Dom Pomocy Społecznej "Przystań".
- **przedsięwzięć „oddolnych”:**
 1. *Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 – kontynuacja* (BO, Wydział Edukacji i Sportu): wszczęto postępowanie na wykonanie robót budowlanych, wyłoniony został wykonawca.
 2. *Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37 Etap III* (BO, Wydział Edukacji i Sportu): wykonano dokumentację projektową oraz część robót budowlanych, roboty w toku.
 3. *Stawiam na książki!* - Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5 (BO, Wydział Kultury): zakupiono nowe książki oraz doposażenie.
 4. *Pracownia komputerowa na miarę XXI wieku w Szkole Podstawowej nr 1* (BO, Wydział Edukacji i Sportu): zakupiono niezbędne wyposażenie do pracowni komputerowej: monitory, komputery, stoły komputerowe, półki, fotel biurowy, krzesła, materiały instalacyjne, montażowe, drukarkę, niszczarkę.
 5. *Nowoczesny - bezpieczny - kreatywny plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 45* (BO, Wydział Edukacji i Sportu): opracowano projekt wykonawczy. Wykonano roboty budowlane w zakresie: rozbiórki murków, wykonania nowej nawierzchni z gumowych mat przerostowych, zakup i montaż dwóch urządzeń zabawowych, humusowanie i zasianie trawy.
 6. *Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37 - Sensoryczny Plac Zabaw* (BO, Wydział Edukacji i Sportu): opracowano dokumentację projektową. Zlikwidowano istniejące zadrzewienia wzdłuż szkolnego ogrodu przy ul. Lompy, kolidującego z nowobudowanym kompleksem boisk sportowych.

7. *Zielona Konopa (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Katowicach)* (Zielony Budżet, Wydział Edukacji i Sportu): rewitalizacja roślinności i trawników na podwórzach oraz wokół budynku szkoły.
8. *Zielony murek* (Zielony Budżet, ZZM): opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.
9. *Dzielnicowy Bank Drzew* (Zielony Budżet, ZZM): zakup materiału roślinnego do nasadzeń wykonywanych przez mieszkańców.
10. *Koncert charytatywny "Wybieram Wszystko" z okazji 30-lecia Hospicjum Cordis* (Małe Granty, Wydział Kultury)
11. *Koncerty muzyki poważnej* (Małe Granty, Wydział Kultury).
12. *Festyn Rodzinny KFD* (Małe Granty, Wydział Kultury).
13. *Śląski Jazz dla UA* (Małe Granty, Wydział Kultury).

W 2023 r. zrealizowano:

1. *Stawiam na książki! - Filia 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5* (BO, Wydział Kultury).
2. *Multimedialna Szkoła - zakup tablic interaktywnych dla klas I-III* (BO, Szkoła Podstawowa nr 15).
3. *Książka jest dobra na wszystko. Dofinansowanie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej z Oddziałem Książki Mówionej w Katowicach, ul. Ligonja 7* (BO, Wydział Kultury).
4. *Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, mieszczącej się przy ul. Rybnickiej 11, zgodnie z myślą "Czytajmy, bo czytanie jest drugim życiem" (Ignacy Krasicki)* (BO, Wydział Kultury).
5. *Nowoczesna siłownia dla "Konopy"* (BO, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi).
6. *Ogród zmysłów pełen kolorów, dźwięków, zapachów i kształtów czyli Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 45* (BO, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24).
7. *Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 14* (BO, Wydział Kultury).
8. *Nowy sprzęt dla Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach* (BO, Miejskie Przedszkole nr 2)
9. *Manufaktura myśli w ZSO nr 1* (BO, ZSO Nr 1 im. M. Kopernika): zakup stołów, krzeseł, biurek, pomocy dydaktycznych, remont sali lekcyjnej wraz z wymianą posadzki.
10. *Kwiecista oaza w Śródmieściu* (Zielony Budżet, ZZM).
11. *Przywracamy drzewa: nowe nasadzenia w miejscu obumarłych lub usuniętych drzew* (Zielony Budżet, ZZM)
12. *Zielona Mikołowska* (Zielony Budżet, ZZM).
13. *Aleja lipowa - deptak Poniatowskiego* (Zielony Budżet, ZZM): nasadzenia drzew.
14. *Zielona Stawowa* (Zielony Budżet, ZZM): przeprowadzenie robót związanych z sadzeniem drzew.
15. *Zazielenienie ścian oporowych i ekranów akustycznych DTŚ - ulicy Chorzowskiej* (Zielony Budżet, ZZM).
16. *Zazielenienie przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki terenów zielonych przy ul. Szeligiewicza oraz ul. Astrów* (Zielony Budżet, ZZM).
17. *Konkurs dla dzieci pokazujący specyfikę historii Śląska* (Małe Granty, Wydział Kultury).
18. *Przemarsz orkiestry dętej z okazji 100-lecia Hufca Katowice* (Małe Granty, Wydział Kultury).
19. *Przygotowanie wystawy plenerowej Katowice w drodze do Niepodległości* (Małe Granty, Wydział Kultury).
20. *Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2022 roku: VI Piknik Rodzinny pod nazwą „Szkoła wczoraj i dziś” – Obchody jubileuszu 125 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika oraz 65 – lecia szkoły podstawowej nr 37 im. ks. J. Twardowskiego W Katowicach; Tradycja, pasja, rozwój – Złot 100 – lecie Hufca ZHP Katowice.*
21. *Przeprowadzono dwie edycje konkursu na najem wolnych lokali użytkowych pn. „Lokal na kulturę”. Wynajęto lokal przy ul. Krzywej 9 oraz ul. Słowackiego 14.*

Dodatkowo:

- W roku 2022 przyjęto uchwałę nr XLV/1019/22 Rady Miasta Katowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia mpzp dla obszaru w rejonie Alei Górnośląskiej i Parku im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach. Ponadto w 2022 r. i 2023 r. trwała procedura nad zmianą mpzp w rejonie Śródmieścia (uchwała nr XXVIII/583/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r.) dotycząca:
 - części obejmującej Rynek, ul. Mariacką i Wojewódzką- przeprowadzenie procedury opiniowania i uzgodnień z organami, wprowadzenie odpowiednich korekt oraz ponowienie procedury
 - części obejmującej Plac Wolności, ul. 3-go Maja i ul. Andrzeja- przeprowadzenie procedury opiniowania i uzgodnień z organami, wprowadzenie odpowiednich korekt oraz ponowienie procedury
 - części zachodniej- prace wstrzymane w związku ze zmianą Studium
 - pozostałej części- prace związane z wyodrębnianiem kolejnych części planu

Trwała również procedura zmiany mpzp części Śródmieścia w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera (uchwała Rady Miasta nr XXXI/668/21 z dnia 4 lutego 2021 r.).

1.2 Podobszar Zawodzie

1.2.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
– ubóstwo i wykluczenie społeczne, – zły stan środowiska, – zły stan techniczny budynków	wymiar społeczno-kulturowy: – tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, – rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, – poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, wymiar gospodarczo-technologiczny: – aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej, – wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, – kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, wymiar infrastrukturalno-środowiskowy: – tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, – podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej.	Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej Zawodzia obejmujące poprawę warunków zamieszkania i usług wraz z podniesieniem poziomu aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców na rzecz minimalizacji zjawisk wykluczenia społecznego i zwiększenia udziału dzielnicy w rozwoju społeczno-gospodarczym Katowic.

1.2.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 2. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Zawodzie

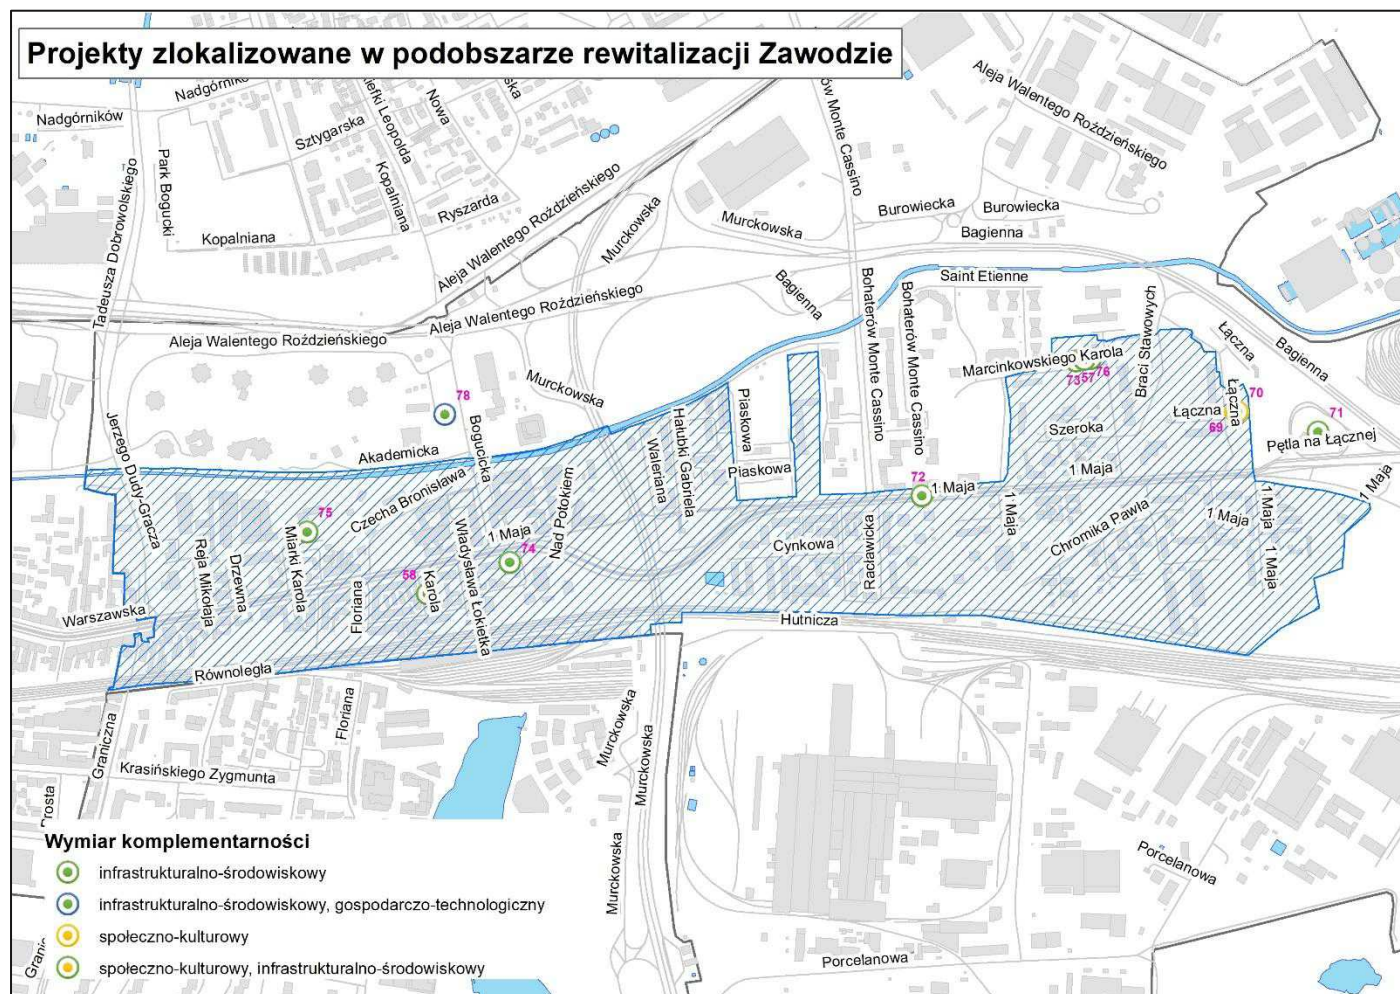


Tabela 2. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 1 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2023; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (przesunięto na lata następne), O – odstąpiono od realizacji

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
57 ¹⁶	Miasto Katowice (CUW/Żłobek Miejski) Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent miękkiej)	2015-2017, 2019	2 842 045 zł	nd.	nd.	ul. Marcinkowskiego 13: Zadanie zakończone.	Z
	Miasto Katowice (CUW/Żłobek Miejski) Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent twardy)	2015-2017	2 836 084 zł	nd.	nd.	ul. Marcinkowskiego 13: Zadanie zakończone.	

¹⁶ Projekt realizowany w dwóch lokalizacjach: ul. Uniwersytecka 15 (podobszar – Śródmieście), ul. Marcinkowskiego 13 (podobszar – Zawodzie). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
58 ¹⁷	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2016-2020	4 256 846 zł	nd.	nd.	ul. Karola 3: zadanie zakończone w 2020 r.	Z
69	Miasto Katowice (MOPS), NGO Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2015-2017	470 303 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
70	Miasto Katowice (MOPS), NGO Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu (w ramach projektu pn. Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2018-2020	671 494 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
71	Miasto Katowice Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”	2015-2020	102 705 656 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
72	Miasto Katowice Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu	2010-2012, 2014-2016	11 512 729 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
73	Miasto Katowice Cyfrowa eksplozja wiedzy – przebudowa i adaptacja pomieszczenia pod supernowoczesną pracownię multimedialno-edukacyjną w MDK „Bogucice – Zawodzie” wraz z jej wyposażeniem	2017-2018	111 000 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
74	Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50	2009-2018	21 921 403 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
75	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII C: X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karola Miarki 6 w Katowicach	2018, 2021-2022	4 265 738 zł	1 104 228 zł	nd.	W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację budynku. Zadanie zakończone.	Z

¹⁷ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
76	Miasto Katowice Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13	-	-	nd.	nd.	Realizację zadania przesunięto na lata kolejne.	P
78	Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uporządkowanie i przygotowanie terenów wzdłuż ulicy Bogucickiej w celu nadania im nowej funkcji prospołecznej (w tym wyburzenie budynku D Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 14) wcześniej: Rewitalizacja terenów wzdłuż ulicy Bogucickiej poprzez nadanie nowej funkcji prospołecznej (w tym wyburzenie budynku D Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 14)	2017-2019	3 109 440 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

W granicach podobszaru Zawodzie przewidziano do realizacji **11 projektów (w tym 1 dwuetapowo): 9 miejskich i 2 pozamiejskich**. Z czego **10 projektów** zrealizowano, natomiast **1 projekt** został przesunięty do realizacji na lata kolejne.

1.2.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Zawodzie, w roku 2022 oraz 2023 zrealizowano w ramach:

- **działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu:** funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypożyczania rowerów. W 2022 r. i 2023 r. funkcjonowała stacja "Centrum przesiadkowe Zawodzie".
- **działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego:** w 2022 r. zamontowano 1 kamerę na skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego i ul. 1-go Maja, 1 kamerę na ul. Bogucickiej w rejonie bulwarów Rawy, 1 kamerę na ul. Dudy Gracza w rejonie bulwarów Rawy, w ramach Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (Wydział Zarządzania Kryzysowego).
- **inwestycji i remontów realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych**
 - **przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 2021 r. wykonano częściowy zakres prac z ramach zadania Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą, a w 2023 r. zakończono realizację zadania.

- **przez jednostki oświatowe (działalność remontowa)** m.in.: w 2022 r. remont: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, Zespołu Szkolno-Przedszkolny nr 6, X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego, Zespołu Szkół nr 1 im. Jerzego Ziętka; w 2023 r. remont: X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach.

– **przedsięwzięć „oddolnych”:**

W 2022 r. zrealizowano:

1. *Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany* (BO, MZUiM): dobudowa brakującego fragmentu chodnika wzdłuż ul. Porcelanowej (przed rondem Fabryki Porcelany) oraz przystosowaniu całego odcinka do ruchu rowerowego.
2. *Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie MBP filii nr 31 w Katowicach ul. Marcinkowskiego 13* (BO, Wydział Kultury): Zakupiono książki, audiobooki oraz 2 monitory i czytnik.
3. *Poprawiamy komfort nauki na Gwiazdach. Wymiana nawierzchni w salach lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6)* (BO, Wydział Edukacji i Sportu)
4. *Zaczytane Zawodzie - zakup książek i doposażenie biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19)* (BO, Wydział Edukacji i Sportu): zakupiono m.in. monitor interaktywny, regały, komputery, czytniki e-book 25 szt., ladę recepcyjną do biblioteki, krzesła obrotowe, pozycje książkowe, mikrofon, radioodtwarzacz, głośnik mobilny. Dla przedszkola zakupiono książki (historyjki obrazowe, Kocham czytać pakiet), układanki symultaniczno-sekwencyjne).
5. *Szkolna przestrzeń edukacji i odpoczynku w katowickim Zawodziu* (BO, Wydział Edukacji i Sportu): zakupiono meble (kanapy, krzesła, fotele, regały stoliki) rośliny, gry planszowe, książki, lampy, koce, poduszki, małe elementy dekoracyjne.
6. *Zadrzewienie Bulwarów Rawy* (Zielony Budżet, ZZM).
7. *Nasz piękny ogród* (Zielony Budżet, Wydział Edukacji i Sportu).
8. *To wiele znaczy dla Zapyłaczy!* (Zielony Budżet, Wydział Kultury).
9. *Koncert karnawałowy pod nazwą "Powróćmy jak za dawnych lat"* (Małe Granty, Wydział Kultury).
10. *Organizacja wydarzenia kulturalnego z okazji "Dnia Kobiet"* (Małe Granty, Wydział Kultury).
11. *Zostań uczniem Pana Kleksa!* - edukacja artystyczna dla katowickich szkół (Małe Granty, Wydział Kultury).
12. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2022 roku: *Spokojne Sprawy – koszyk higieniczny w szkolnej toalecie* X LO im. I.J. Paderewskiego; *Rodzinny Piknik Planszówek w Katowicach Zawodziu* w gmachu i ogrodzie X LO im. I.J. Paderewskiego; *Festyn w Zespole Szkół nr 1 w Katowicach - Dbamy o zdrowie i środowisko; Postrzeganie obozów koncentracyjnych przez młodych mieszkańców Katowic; VII Przegląd i Konkurs Spotów Profilaktycznych, XIX Konkurs lingwistyczny języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych im. L. Zamenhofa, Z własnej grządki smakuje lepiej - założenie i prowadzenie inspektów w ogrodzie szkolnym w ZS nr 1; Muzyczne Zawodzie - organizacja 2 koncertów w MDK Bogucice-Zawodzie; Historyczny pejzaż Śląska Bogucice i Dąb - plenery i wystawy dziedzictwa ziemi katowickiej; Czuwaj Zawodzie – III Edycja. Organizacja biwaku dla mieszkańców oraz przybliżenie sylwetki patrona X Szczepu ZHP w Katowicach Pawła Stellera; Festyn rodzinny – V Zawodziański Dzień Bajtla w Parafii Opatrzności Bożej.*

W 2023 r. zrealizowano:

1. *Rawa to nasza sprawa! Kolorowa ścieżka sensoryczna przy bulwarach Rawy - aranżacja terenu inspirowana ogrodami sensorycznymi wzdłuż chodnika pomiędzy bulwarami Rawy przy ulicy Saint Etienne a ulicą Marcinkowskiego* (BO, ZZM).
2. *Zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 31 w Katowicach, ul. Marcinkowskiego 4c* (BO, Wydział Kultury).

3. *Ławeczka na zielonej trawce - miejsce odpoczynku dla mieszkańców i ich czworonożnych przyjaciół* (BO, ZZM).
4. *Stawiamy na zawodowstwo - remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1* (BO, Zespół Szkół nr 1).
5. *Książkowe gwiazdy - super biblioteka i czytelnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Katowicach* (BO, Szkoła Podstawowa nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6).
6. *To wiele znaczy dla zapylaczy!* (Zielony Budżet, Wydział Kultury): *organizacja 2 warsztatów o tematyce ekologicznej.*
7. *Liceum pod palmami* (Zielony Budżet, X Liceum Ogólnokształcące): *zakup 10 roślin.*
8. *Zakup metalowego kosza na plastikowe nakrętki* (Zielony Budżet, Zespół Szkół nr 1)
9. *Nasz piękny ogród* (Zielony Budżet, Zespół Szkół nr 1).
10. *Zazieleniona ulica 1 Maja* (Zielony Budżet, ZZM).
11. *Nasadenia pnączy na ekranach akustycznych w obrębie miasta* (Zielony Budżet, ZZM).
12. *Rawa - to nasza sprawa! Remont części bulwarów Rawy około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne przystosowanie go dla potrzeb mieszkańców Zawodzia* (BO, ZZM).
13. *Zazielenimy Tu! Zagospodarowanie pasa zieleni w rejonie ulic Bohaterów Monte Cassino i Marcinkowskiego przy ogrodzeniu ośrodka sportowego Słowian* (Zielony Budżet, ZZM).
14. *Niech będzie kolorowo! - skwer pełen kolorów przy ulicy Bohaterów Monte Cassino* (Zielony Budżet, ZZM).
15. *Zazielenienie przestrzeni publicznej dokoła placu zabaw. Pomiędzy Marcinkowskiego 11 a stacją energetyczną. Poprzez: sadzenie krzewów i drzew, pielęgnację zieleni wysokiej, cięcie pielęgnacyjne w koronie drzew, założenie kwietnika* (Zielony Budżet, ZZM).
16. *Zieleń dla mieszkańców Zawodzia na skwerze pomiędzy ulicami 1 Maja 108, 1 Maja 110 oraz Raclawickiej 1-5* (Zielony Budżet, ZZM).
17. *Koncert walentynkowy dla seniorów pod nazwą "Kochać, jak to łatwo powiedzieć"* (Małe Granty, Wydział Kultury)
18. *Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2023 roku: Młodzi potrafią dokumentować – Katowice w Wikipedii; Rodzinny Piknik – Rekreacyjno – Sportowy w Katowicach Zawodziu; XX Konkurs lingwistyczny języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych im. L. Zamenhofs; Operetki czar na Zawodziu; Promienne i flexi czyli nowe babcie, nowa ja i flamenco nuevo; HISTORYCZNY PEJZAŻ ŚLĄSKA. Świerklaniec i Ślemień – plenery i wystawy dziedzictwa Górnego Śląska; Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa; Mamo, Tato – chodźmy do domu kultury – II edycja; Muzyczne Zawodzie; Święto Dzielnicy Zawodzie „Wrześniówka”; Jubileusz 35-lecia powstania Zespołu Akordeonistów „Katowice-Kleofas”; Łączna Łączy – Muzyczno-integracyjne spotkania na Łącznej; Festyn rodzinny – Szósty Zawodziański Dzień Bajtla; Czuwaj Zawodzie – IV edycja. Organizacja biwaku dla mieszkańców oraz przybliżenie sylwetki patrona X Szczepu ZHP w Katowicach Pawła Stellera.*

1.3 Podobszar Załęże

1.3.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
– depopulacja, – bezrobocie, – ubóstwo i wykluczenie społeczne, – przestępczość, – zły stan środowiska, – zły stan techniczny budynków	wymiar społeczno-kulturowy: – tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, – rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, – poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, wymiar gospodarczo-technologiczny: – aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej, – wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, – kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, wymiar infrastrukturalno-środowiskowy: – tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, – podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej	Wzmocnienie atrakcyjności społeczno-gospodarczej dzielnicy i minimalizacja zjawisk wykluczenia społecznego wraz z poprawą warunków życia oraz lepszym wykorzystaniem potencjału endogenicznego na rzecz wzrostu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz postaw obywatelskich mieszkańców

1.3.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 3. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Załęże

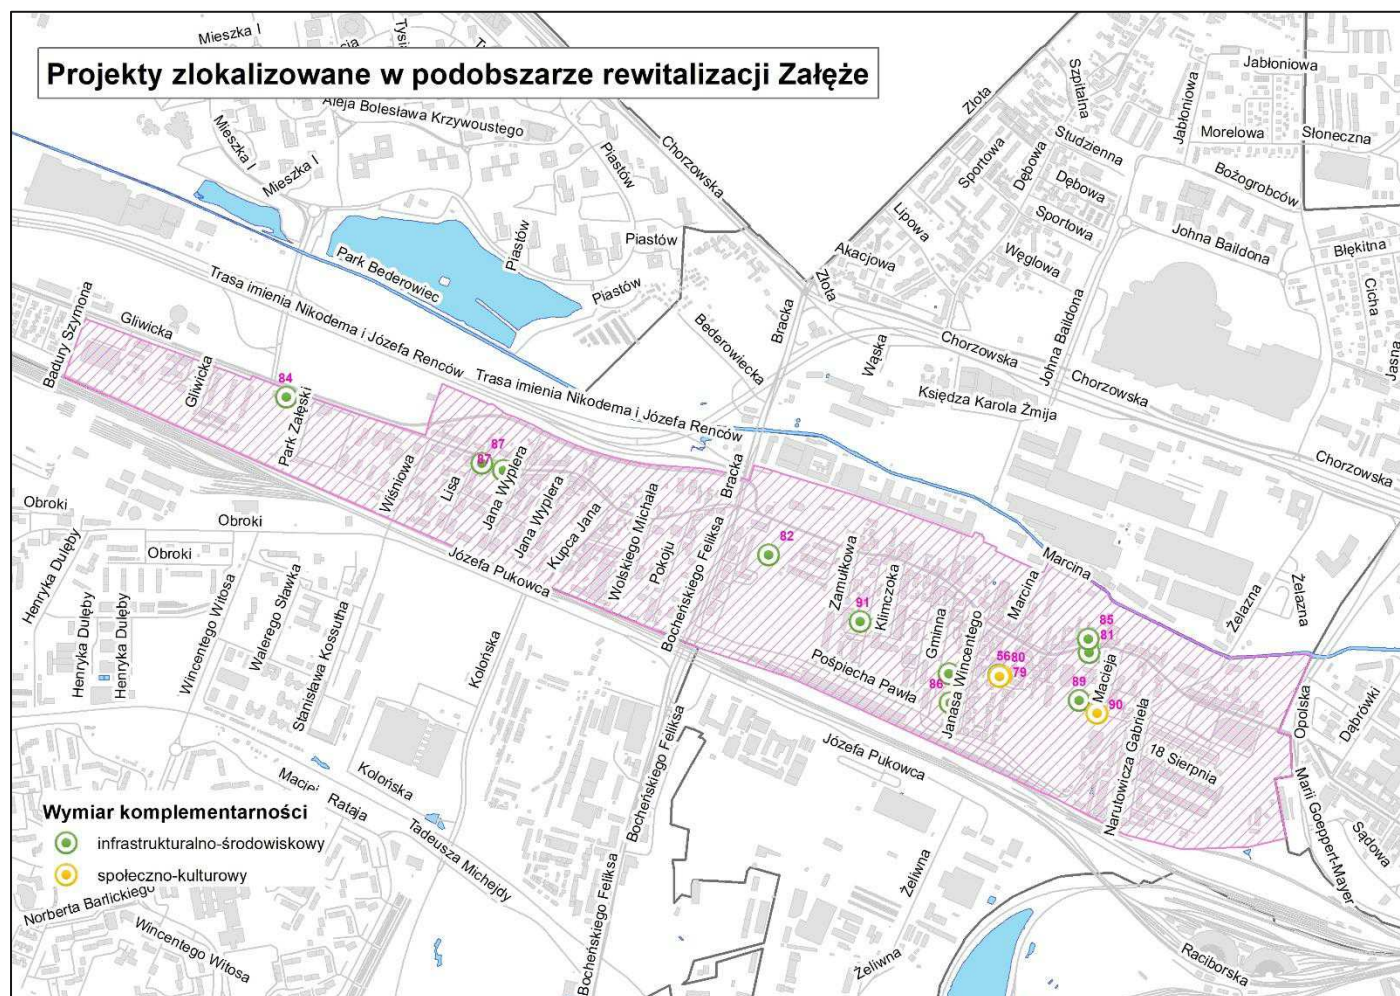


Tabela 3. Projekty podstawowe w podobszarze Załęże - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 3 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2023; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (przesunięto na następne), O – odstąpiono od realizacji

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
56 18	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13,13a, ul. J. Zarębskiego 5a, 7a i ul. Ks. Bpa H. Bednorza 14	2018-2021	7 210 348 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z

¹⁸ Projekt realizowany w 3 lokalizacjach w podobszarach: Śródmieście, Załęże, Szopienice-Burowiec. Podana kwota obejmuje wszystkie wskazane lokalizacje.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
58 19	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2016	350 150 zł	nd.	nd.	ul. Gliwicka 148 – realizacja projektu zakończona w 2016 roku. Zadanie zakończone dla lokalizacji.	Z
79	Miasto Katowice (MOPS + ZSiP nr 2) Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" – I etap	2017-2020	972 259 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
80	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" – II etap	2020-2023	1 087 596 zł	695 892 zł	nd.	W 2022 roku realizowano działania animacyjne (w tym dla dzieci i młodzieży), środowiskowe, kulturalne (spotkania autorskie, podróżnicze i rodzinne), wsparcie specjalistyczne, warsztaty dla mieszkańców (m.in. literacko - artystyczne, profilaktyczno - edukacyjne, plastyczne, kulinarne), wydarzenia lokalne (wystawy, koncerty zawody sportowe, pikniki). Zadanie zakończone.	Z
81	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Gliwicka 74a w Katowicach)	2014-2020	1 473 454 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
82	Miasto Katowice (ZZM) Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach	2017-2019	2 035 751 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
83	Miasto Katowice Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych	2016-2018	125 343 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
84	Miasto Katowice Budowa wodnych placów zabaw w Katowicach (wodny plac przy ul. Gliwickiej 214)	2018	1 660 500 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
85	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego położonego przy ulicy Gliwickiej 93 w Katowicach (wcześniej: Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwickiej 93 - Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	nd.	nd.	Odstąpiono od realizacji zadania.	O
86	Miasto Katowice (MZUiM) Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (BO)	2020-2021	430 191 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
87	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 190 194	2019-2022	3 324 157 zł	784 215 zł	nd.	W 2022 roku zakończono roboty budowlane, które obejmowały m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu, wymianę okien i drzwi wejściowych, rozbiórkę pieców, budowę wymiennikowni, budowę instalacji c.o. wraz z budową przyłącza do wymiennikowni, oświetlenie oraz instalację odgromową i uziemienia. Zadanie zakończone.	Z
88	Miasto Katowice Budowa hali sportowo-kulturalnej na Załężu	-	-	nd.	nd.	Odstąpiono od realizacji zadania.	O
89	Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Prace remontowe ogrodzenia kościoła i cmentarza Parafii św. Józefa w Katowicach - Załężu	-	-	nd.	nd.	Wnioskodawca podjął decyzję o wykreśleniu projektu z LPR.	O
90	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW Uskrzydłamy! Partnerstwo ku przyszłości:	2018	876 905 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym metodą asysty aktywnej integracji						
91 20	Miasto Katowice (KZGM) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Ludwika Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach	2016-2021	5 298 195 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

W granicach podobszaru Załęże przewidziano do realizacji **15 projektów: 13 miejskich i 2 pozamiejskie**. Spośród ww. projektów **zakończono realizację 12 projektów, a od 3 projektów odstąpiono**.

1.3.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Załęże, w roku 2022 i 2023 zrealizowano w ramach:

- **działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu:** funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypożyczania rowerów. W 2022 r. funkcjonowały stacje "Załęże Skwer S. Barei" i "Bracka - Gliwicka", „Gliwicka/Wiśniowa” oraz „Gliwicka – MOPS”.
- **inwestycji i remontów realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych przez jednostki oświatowe (działalność remontowa) m.in. w 2022 r. remont:** Miejskiego Przedszkola nr 30, Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza, w 2023 r. remont: Zespołu Szkół i Placówek nr 2, Szkoły Podstawowej nr 22.
- **przedsięwzięć „oddolnych”:**
w 2022 r.:
 1. *Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (BO, MZUiM).*

²⁰ Projekt realizowany w dwóch podobszarach: ul. Wolnego 8 (podobszar – Załęże), ul. Ludwika Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b (podobszar – Szopienice – Burowiec). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

2. *Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia* (BO, MZUiM).
3. *Wypożyczenie Załęskich Przedszkoli i Szkół MP 26, 30, 39 SP 20 i 22* (BO, Wydział Edukacji i Sportu): doposażenie w kompleksową tablicę interaktywną dla każdej placówki po 1 szt. oraz pomoce dydaktyczne.
4. *#ZałężeCzyta*: zakupiono książki oraz prasę (BO, Wydział Kultury).
5. *Przebudowa ul. 18 Sierpnia i wykonanie chodnika na odcinku od wjazdu na teren osiedla do budynku 18 Sierpnia 2* (BO, MZUiM).
6. *Śpiewamy dla Załęża, śpiewamy dla Katowic- Zespół KATOSIE – stworzenie 2 utworów muzycznych (piosenek) i 1 teledysku* (BO, Wydział Edukacji i Sportu).
7. *Pnącza przy Bocheńskiego* (Zielony Budżet, ZZM): budowa betonowego płotu i ekranów akustycznych naprzeciwko zabudowań mieszkalnych na ulicy Bocheńskiego 40-52.
8. *Pielęgnacja drzew Gliwicka 92* (Zielony Budżet, ZZM): przeprowadzenie pielęgnacji drzew rosnących na terenie placu zabaw.
9. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2022 roku: *III Załęska Olimpiada Sportowa; II Dzielnicowa Seniorada– Zdrowo, Bezpiecznie i Solidarnie; Dzień dziecka na Załęskich Tarasach - Festyn Mieszkańców Dzielnicy Załęże; EKOPIKNIK Katowice – Załęże; II Coraz bliżej święta – kiermasz świąteczny; John Baidon 250 lat - upamiętnienie twórcy nowoczesnego przemysłu na Górnym Śląsku. Założyciela huty Baidon w Katowicach* (wystawa, wycieczka, podświetlenie muralu i koncert); *Dni Załęża –* (organizacja festynu).

W 2023 r. zrealizowano:

1. *Os. Janasa-Ondraszka – Rewitalizacja placu* (BO, MZUiM).
2. *Remont i wyposażenie załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 22 i ZSiP 2)* (BO).
3. *#Przyjdź po nowe* (BO, Wydział Kultury): zakup nowości wydawniczych, czasopism.
4. *Załęska drużyna - mural ku pamięci Jerzego Lisa* (BO, Wydział Kultury).
5. *Dni Załęża 2023 - Załęski Festyn Rodzinny* (BO, Zespół Szkół i Placówek nr 2).
6. *Łąka kwietna dla Załęża* (Zielony Budżet, ZZM).
7. *Uzupełnienie, dosadzenie krzewów i bylin na terenie placu ks. Józefa Londzina w Katowicach* (Zielony Budżet, ZZM).
8. *Karmniki dla ptaków dokarmianych przez mieszkańców Załęża* (Zielony Budżet, Wydział Kształtowania Środowiska).
9. *Zadbajmy o zapylacze - warsztaty teoretyczno-praktyczne dla mieszkańców Załęża* (Zielony Budżet, Wydział Kultury).
10. *Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów* (BO, ZZM).
11. *Park Mościckiego na 100-lecie Kolonii* (Zielony Budżet, ZZM): rewitalizacja parku.
12. *Więcej krzewów i trawy na ulicy Ondraszka - dla ludzi, ptaków i pszczół* (Zielony Budżet, ZZM).
13. W ramach Inicjatywy Lokalnej zrealizowano: *Międzypokoleniowa Szkoła Wolontariatu; Parafialny Dzień Chorego - III Dzielnicowa Senioriada – Zdrowo, Bezpiecznie i Solidarnie; Dzień Dziecka na Załęskich Tarasach - Festyn Mieszkańców Dzielnicy Załęże VI; Klub Seniora Załęże; Załęska Olimpiada Sportowa; Biegiem przez Załęże i Witosa; Rodzinna Rajza na kole kaj się yno do - zwiedzamy Śląskie atrakcje turystyczne 2; AKCJA – INTEGRACJA. Cykl warsztatów integracyjnych dla dzieci i seniorów; Pamiątki z Załęża – warsztaty ceramiczne; III Coraz bliżej Święta – warsztaty świąteczne.*
14. W 2023 r. przeprowadzone dwie edycje konkursu na najem wolnych lokali użytkowych pn. „Lokal na kulturę”. Wynajęto lokal przy ul. Ondraszka 17.

1.4 Podobszar Bogucice

1.4.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
– depopulacja, – niska aktywność gospodarcza, – zły stan techniczny budynków	wymiar społeczno-kulturowy: – tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, – rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, wymiar gospodarczy: – aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej, – wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, – kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, wymiar infrastrukturalno-środowiskowy: – tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych, – podniesienie standardu substancji mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej	Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej Bogucic obejmujące poprawę warunków zamieszkania, lepsze zintegrowanie ze Śródmieściem i Strefą Kultury oraz wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i podniesienie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1.4.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 4. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Bogucice



Tabela 4. Projekty podstawowe w podobszarze Bogucice - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 4 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2023; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (przesunięto na lata następne), O – odstąpiono od realizacji

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
58 ²¹	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2017-2021	2 121 416 zł	nd.	nd.	ul. Katowicka 48a, 50: zadanie zakończone w 2016 r. ul. Markiefki 64, 68: zadanie zakończone w 2019 r. Zadanie zakończone dla lokalizacji.	Z
96	Miasto Katowice (MOPS) Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - I etap	2018-2020	1 594 744 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
97	Miasto Katowice (MOPS) Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - II etap	2021-2023	1 382 816 zł	826 435 zł	nd.	W roku 2022 realizowane były działania animacyjne (koncerty dla dzieci), środowiskowe, kulturalne, wsparcie specjalistyczne, warsztaty (plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne) dla mieszkań-	Z

²¹ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
						ńców, wydarzenia lokalne, działania w ramach Dzielnicowej Akademii Seniora (spotkania relaksacyjne, zajęcia z ćwiczeniami wzmacniającymi pamięć, spotkania o śląskiej tradycji, wycieczki historyczne). Zrealizowano również Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańcó w dzielnicy Bogucice (realizowano m.in. kursy kwalifikacyjne oraz staże zawodowe dla mieszkańców dzielnicy pozostających bez pracy). Zadanie zakończone.	
98	Miasto Katowice (KZGM/ZZM) Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego	2013, 2015-2016, 2018-2019	7 339 757 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
99	Muzeum Śląskie Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budowę niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	2014-2017	30 104 340 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
100 ²²	Miasto Katowice Układ komunikacyjny dla terenu budowy nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	2008-2018	153 916 356 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
101 ²³	Miasto Katowice Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby	2019-2023	43 458 371 zł	342 292 zł	19 204 933 zł	W roku 2022 uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Trwa procedura wyboru wykonawcy. W roku 2023 trwały roboty budowlane z terminem zakończenia 12.12.2024r.	R

²² Projekt realizowany na granicy dwóch jednostek pomocniczych: Bogucic i Koszutki.

²³ Projekt realizowany na granicy dwóch jednostek pomocniczych: Bogucic i Koszutki

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
	Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II (wcześniej: Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II)						
102	Miasto Katowice Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	2020-2027	82 789 676 zł	641 632 zł	1 960 446 zł	W roku 2022 złożono dokumentację dotyczącą inwentaryzacji, ekspertyzy i opinii geotechnicznej. Zawarto umowę na prace projektowe. W roku 2023 zakończono prace projektowe. Przekazano dokumentację protokołem zdawczo-odbiorczym – trwała weryfikacja.	R
103	Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej Uruchomienie Placówki Opiekuńczo-Rozwojowej "Centrum Św. Józefa" Stowarzyszenia PoMOC dla Kobiet i Dzieci	2016-2023	4 655 834 zł	373 488 zł	976 963 zł	W roku 2022 zamontowano instalację sanitarną, c.o., klimatyzację w Centrum, podwieszane sufity, parapety wewnętrzne. Wykonano tynki gipsowe, gładzie, zbrojenie i tynki. W roku 2023 wykonano częściowo: wyposażenie żłobka, roboty elektryczne, gładzie i zabudowę sufitową, łazienki i ich wyposażenie, malowanie i wykonanie prac glazurniczych.	R
104	Miasto Katowice (ZZM) Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	2021-2023	8 284 250 zł	160 636 zł	4 370 116 zł	W roku 2022 zakończono procedurę przetargową zadania. Podpisano umowę na roboty budowlane. W roku 2023 rozpoczęto prace budowlane. Planowane zakończenie nastąpi w 2024 roku.	R

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

W granicach podobszaru Bogucice przewidziano do realizacji **10 projektów: 8 miejskich i 2 zgłoszone** przez podmioty zewnętrzne. Spośród nich **6 projektów zakończono, a 4 projekty znajdują się w trakcie realizacji.**

1.4.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Bogucice, w 2022 r. i w 2023 r. realizowano w ramach:

- **działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu:** funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypożyczania rowerów - funkcjonowały stacje "Bogucice Szpital" oraz „Park Bogucki”.
- **projektów inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych Miasta Katowice**

- **przez jednostki oświatowe (działalność remontowa):** m.in. w 2022 r. remont: Szkoły Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki; Zespołu Szkolno-Przedszkolny nr 4; Miejskiego Przedszkola nr 97.
 - **przez KZGM:** w 2023 r. realizacja zadania *Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM - rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi - ul. Katowicka 31a.*
- **działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego:** w 2022 r. zamontowano 3 kamery w Parku Bogucickim, a w 2023 r. zamontowano kolejne 3 kamery w ramach Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (Wydział Zarządzania Kryzysowego).
- **przedsięwzięć „oddolnych”:**

W 2022 r. zrealizowano:

1. *Festyn przy Bibliotece* (BO, Wydział Kultury): realizacja zadania w postaci festynu przy Bibliotece Filia nr 16 : animacje dla dzieci, spektakl teatralny, przenośna ścianka wspinaczkowa i dmuchaniec.
2. *Zakup nowości wydawniczych dla Filii 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach Bogucicach* (BO, Wydział Kultury).
3. *Zielona akupunktura na osiedlu Na Obrzeżu w Katowicach* (BO, ZZM): stworzenie mini oazy zagospodarowanej zieleni wraz z postawieniem ok. 4 ławek i 2 koszy.
4. *Zielony skwer przy MDK "Bogucice-Zawodzie"* (BO, ZZM): wykonano dokumentację projektową, demontaż kostki brukowej oraz nasadzono trawę, hortensję, bluszcz.
5. *Patriotyczny koncert orkiestry dętej* (Małe Granty, Wydział Kultury).
6. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2022 roku: *Bogucice FIT* (Organizacja pikniku alpinistycznego oraz biegu na orientację); *Hokejowa młodzież przyszłości Katowic - kontynuacja inicjatywy*; *Bogucice aktywnie razem* (cykl treningów biegowych); *Bogucicki Festiwal Rękodziela II*; *VI Wojewódzki Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży Muzyczne Diamenty*; *VII Muzyczne Wieczory w Bazylice* (3 koncerty w parafii św. Szczepana).

W 2023 r. zrealizowano:

1. *Festyn przy Bibliotece* (BO, Wydział Kultury).
2. *Aktywność fizyczna i umysłowa: rozwija, łączy i zdrowiu sprzyja! Dla dużego i małego znajdzie się coś ciekawego* (BO, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4).
3. *Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach* (BO, Wydział Kultury).
4. *Spotkajmy się w bibliotece na Wajdy! Cykl imprez okolicznościowych dla dzieci i rodziców* (BO, Wydział Kultury).
5. *Ogród Koszycki - Niech nasz ogród będzie bardziej społeczny* (BO, ZZM).
6. *Koncertowa Plejada Gwiazd - cykl wydarzeń muzycznych w Bogucicach* (BO, Wydział Kultury).
7. *Zagospodarowanie terenu wokół boiska "Na Wulcu"* (BO, MOSiR).
8. *Zielona akupunktura osiedlowa* (Zielony Budżet, ZZM).
9. *Przywracamy kolory na muzealnej Skarpie* (Zielony Budżet, ZZM).
10. *Park kieszonkowy u zbiegu ulic Piotra i Markiefki* (Zielony Budżet, ZZM).
11. *„Rośliny w Wielkim mieście” cykl edukacyjnych spacerów botaniczno – przyrodniczych* (Zielony Budżet, Wydział Kształtowania Środowiska).
12. *Dla uczniów, mieszkańców - każdego z Nas: tu spędzisz aktywnie czas! "Siatka, kosz, noga i siłka"* (BO, CUW).

13. *Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki* (BO, Wydział Zarządzania Kryzysowego).
14. *Dzielnicowe Łąki Kwietne - Szopienice, Borki, Janów, Nikiszowiec, Bogucice* (Zielony Budżet, ZZM).
15. *Zielone? Nie parkuję!* - rewitalizacja rozjeżdżonych zieleńców (Zielony Budżet, ZZM).
16. *Koncert dla mieszkańców miasta* (Małe Granty, Wydział Kultury).
17. W ramach Inicjatywy Lokalnej zrealizowano: *Turniej Piłki Nożnej z okazji Dni Bogucic; IV bieg dookoła Bogucic; Autorze – spotkajmy się przy książce; VIII Muzyczne Wieczory w Bazylice; Święto Dzielnicy Bogucice; VII Wojewódzki Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży „Muzyczne Diamenty”; II Bogucicki Festiwal Rękodzieła.*

Dodatkowo:

W 2022 r. i 2023 r. procedura sporządzenia mpzp (uchwała nr XVII/295/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r.) dla obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach – część III (ograniczona ulicami Ścigały, Katowicką i Markiefki) była wstrzymana ze względu na oczekiwanie na założenia funkcjonalno-przestrzenne Muzeum im. Jerzego Kukuczki.

1.5 Podobszar Szopienice-Burowiec

1.5.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
– depopulacja, – bezrobocie, – ubóstwo i wykluczenie społeczne, – przestępczość, – niska aktywność gospodarcza, – zły stan środowiska, – zły stan techniczny budynków	wymiar społeczno-kulturowy: – tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, – rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, – poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, wymiar gospodarczo-technologiczny: – aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej, – wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, – kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, wymiar infrastrukturalno-środowiskowy: – tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych, – podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej, – ochrona i zrównoważone wykorzystanie walorów środowiskowych dzielnicy o znaczeniu ponadlokalnym	Ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz podniesienie jakości życia poprzez pobudzenie i wzmocnienie potencjału endogenicznego na rzecz wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej, przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz postaw obywatelskich mieszkańców.

1.5.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 5. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Szopienice-Burowiec

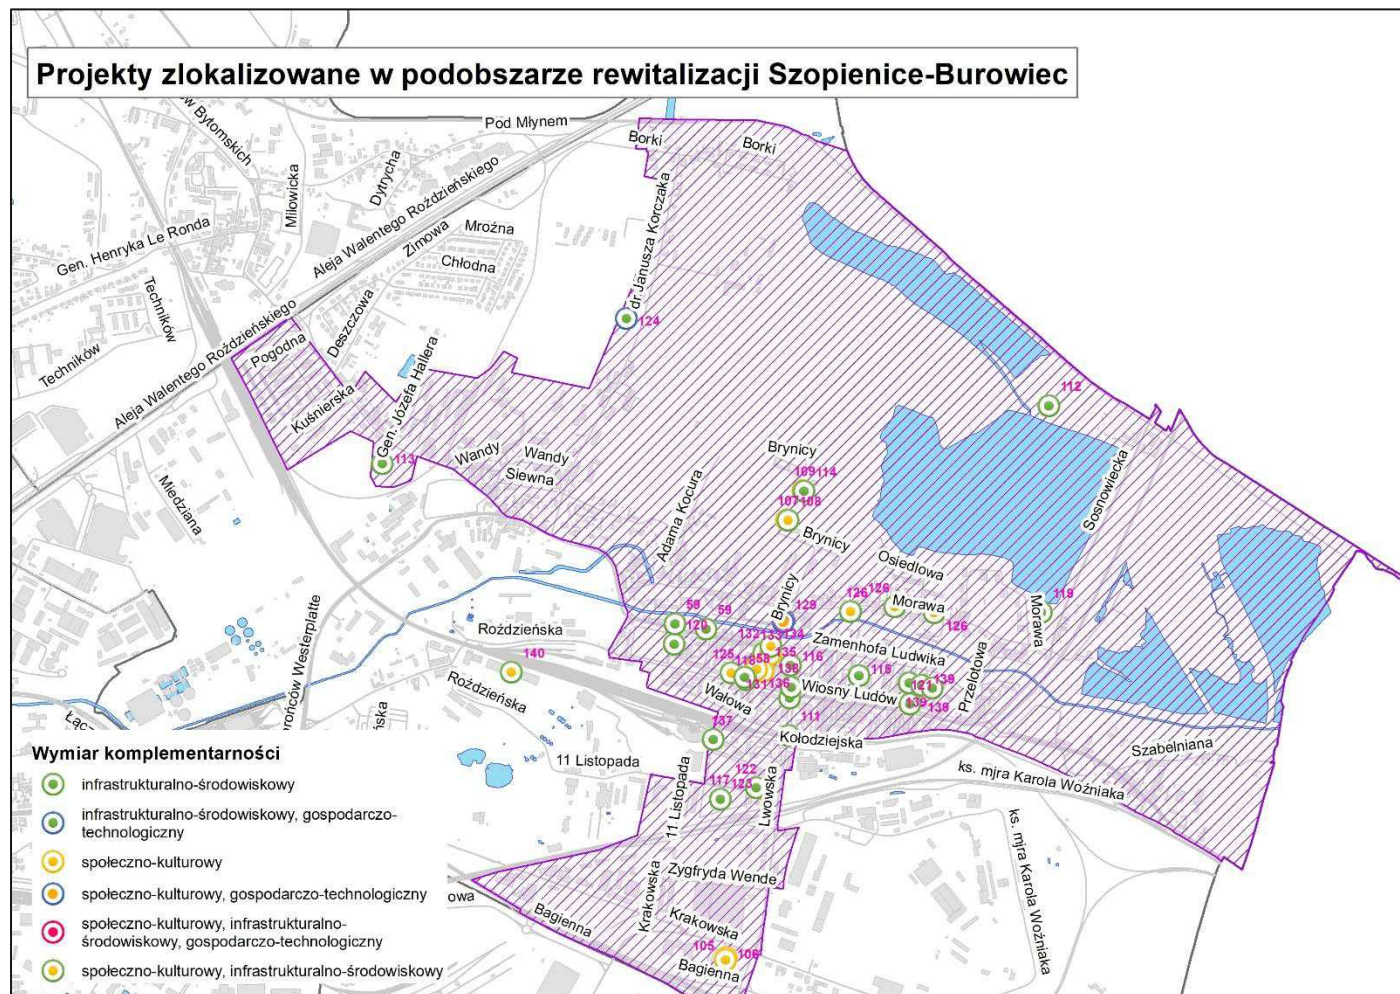


Tabela 5. Projekty podstawowe w podobszarze Szopienice - Burowiec - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 5 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2023; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (przesunięto na lata następne), O – odstąpiono od realizacji

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
56 ²⁴	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13,13a, ul. J. Zarębskiego 5a, 7a i ul. Ks. Bpa H. Bednorza 14	2018-2020	7 210 348 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
58 ²⁵	Miasto Katowice	2017-	3 345 474 zł	1 763 051 zł	0	ul. Morawa 119a: realizacja	Z

²⁴ Projekt realizowany w 3 lokalizacjach w podobszarach: Śródmieście, Załęże, Szopienice-Burowiec. Podana kwota obejmuje wszystkie wskazane lokalizacje.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
	(KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2023				zakończona w 2016 r. ul. Bednorza 22: w roku 2022 nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych Zadanie zakończone dla lokalizacji.	
59 ²⁶	Miasto Katowice (KZGM) Budownictwo mieszkaniowe-komunalne	2009-2017	11 967 662 zł	nd.	nd.	ul. Obr. Westerplatte 42-50: Zadanie zakończone dla lokalizacji.	Z
91 ²⁷	Miasto Katowice (KZGM) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Ludwika Zamenhofs 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach	2016-2021	5 298 195 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
105	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach – I etap	2017-2020	1 654 002 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
106	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach – II etap	2020-2022	1 987 385 zł	1 099 623 zł	nd.	W roku 2022 realizowano działania animacyjne, środowiskowe, kulturalne, wsparcie specjalistyczne, warsztaty dla mieszkańców, wydarzenia lokalne (niedzielne spotkania przy bonkawie i maszkietach, wyjście do Teatru Śląskiego, Dni Babci i Dziadka, Kulturalny Bajtel, Pora dla zdrowia, Bezpieczny Maluch, Dzień Matki, kursy samoobrony dla kobiet, zwiedzanie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie, wyjście do operetki, wyjazd do Nadleśnictwa). Zrealizowano również Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Szopienice – Burowiec (realizowano m.in. kursy kwalifikacyjne oraz staże zawodowe dla mieszkańców dzielnicy pozostających bez pracy). W ramach projektu realizowano także działania kulturalne organizowane przez Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”. Odbłyły się m.in. niedzielne spotkania przy bonkawie i kołoczku, przeprowadzono kurs samoobrony dla kobiet oraz zorganizowano wycieczki krajoznawczo-kulturalne. Zadanie zakończone.	Z

²⁵ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec

²⁶ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście i Szopienice – Burowiec. Koszt podany łącznie dla dwóch lokalizacji

²⁷ Projekt realizowany w dwóch podobszarach: ul. Wolnego 8 (podobszar – Załęże), ul. Ludwika Zamenhofs 36-38, 36a-38a, 36b-38b (podobszar – Szopienice – Burowiec). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
107	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap	2018-2020	969 859 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
108	Miasto Katowice (SP44/ZZM) Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach – Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach oraz rewitalizacja Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice.	2015-2016, 2018-2019	2 670 613 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
109	Miasto Katowice (CUW/MP 66) Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice – Miejskie Przedszkole nr 66 (2 oddziały integracyjne i 2 oddziały ogólnodostępne)	2017-2018	944 252 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
110	Miasto Katowice Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ul. Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte (Pl. Powstańców Śląskich)	2010-2016, 2017-2019	7 894 337 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
111	Miasto Katowice (MZUiM) Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej	2017-2019	6 227 067 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
112	Miasto Katowice Budowa „Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach” (wcześniej Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus, Borki)	2017-2023	15 252 949 zł	162 567 zł	11 184 463 zł	W roku 2022 zawarto i zrealizowano umowę na usługi projektowe w zakresie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy plaży północnej nad stawem Morawa. W roku 2023 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową plaży północnej nad stawem Morawa wraz z obiektem kubaturowym obsługi plaży, budową parkingu przy ul.	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
						Sosnowieckiej, budową ścieżki pieszo – rowerowej od stancy harcerskiej do wschodniej granicy cmentarza położonego przy ul. Brynicy” z terminem wykonania 26.06.2024r. Kwota 10 422 552 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Zadanie zakończone.	
113	Miasto Katowice Budowa trzech basenów w dzielnicach (dot. basenu przy ul. Hallera, Konnej)	2015-2020	40 123 276 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
114	Miasto Katowice Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	2015-2017	3 829 665 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
115	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII (Miejskie Przedszkole nr 65 ul. Ciesielska 1)	2014-2021	1 579 969 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
116	Miasto Katowice Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach	2014, 2016-2017, 2019	1 105 507 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
117	Miasto Katowice (ZZM) „Zagospodarowanie Skweru Janusza Słoty”	2015-2016	223 605 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
118	Miasto Katowice (KZGM) Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społeczno-ściowych	2017-2019	1 145 942 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
119	Miasto Katowice Rozbudowa Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	2018-2022	7 709 629 zł	2 859 353 zł	nd.	Zakończono prace budowlane. Obiekt został oddany do użytkowania. Zadanie zakończone.	Z
120	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach	2018-2021	1 511 875 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
121	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37	2020-2023	11 343 207 zł	2 052 827 zł	9 218 024 zł	W roku 2022 realizowano roboty budowlane (docieplenie ścian piwnic, wymianę okien, modernizację i izolację instalacji c.o., instalacje wody i kanalizacji w mieszkaniach, instalację odgromową, prace w obrębie piwnic i loggii, instalacje elektryczne na klatkach schodowych). W roku 2023 kontynuowano roboty budowlane. Zadanie zakończone.	Z
122	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego położonego przy ul. 11 Listopada 6 i ul. Listopada 8	2020-2023	176 317 zł	99 876 zł	29 177 zł	W roku 2022 opracowany został Etap I dokumentacji. Wykonawca uzyskał pozwolenie na rozbiórkę budynku usługowego wraz z tarasem, budynku gospodarczego i zbiornika bezodpływowego. Została opracowana dokumentacja Etapu II i III. W roku 2023 złożony został wniosek o uzyskanie pozwolenia budowlanego. Projektant został zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym. Pozwolenie budowlane zostało wydane w dniu 20.07.2023r. Rozpoczęcie robót budowlanych zostało zaplanowane na 2024r. po wykwaterowaniu wszystkich użytkowników.	R
123	Fundacja For Animals Przeciwdziałanie bezrobociu oraz przeciwdziałanie procesowi wykluczenia społecznego mieszkańców dzielnicy Szopienice-Burowiec	-	-	b.d.	b.d.	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-
124	Fundacja Śląsk Wczoraj i Dziś Remont, przebudowa, rewitalizacja i zagospodarowanieabytkowej wieży	2019-2023 ²⁸	508 319	159 882 zł	84 950 zł	W roku 2022 została zawarta umowa z UM Katowice na dofinansowanie realizacji zadania na wymianę stolarki okiennej. W drugim półroczu 2022 r. został zrealizowany III etap tego projektu.	R

²⁸ Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
	ciśnięć w Katowicach przy ul. Korczaka 47					W roku 2023 w karcie monitoringowej brak informacji o wykonanym zakresie rzeczowym.	
125	Parafia Ewangelicko – Augsburska Zbawiciela Renowacja części zabudowy Parafii oraz adaptacja na cele społeczne zaplecza wraz z terenem zielonym	-	-	nd.	nd.	Odstąpiono od realizacji działania.	O
126	Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Projekt Morawa - Rewitalizacja i przyszłość	2018-2023	600 000 zł	85 815 zł	4 300 zł	W roku 2022 zakupiono grunt przylegający do budynków przy ul. Morawa 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76 umożliwiającą realizację zamierzeń rewitalizacyjno-inwestycyjnych na większym obszarze i we większym zakresie. W roku 2023 wykonano koncepcję architektonicznej zagospodarowania nieruchomości zabudowanych budynkami Morawa 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80.	R
127	Pro Inwest Sp. z o.o. Adaptacja obiektu dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3 na hotel i centrum spotkań międzypokoleniowych	-	-	nd.	nd.	Wnioskodawca odstąpił od realizacji projektu.	O
128	Pro Inwest Sp. z o.o. Centrum Spotkań Międzypokoleniowych/ Aktywny Senior przy ul. Brynicy 3	-	-	nd.	nd.	Wnioskodawca odstąpił od realizacji projektu.	O
129	Pro Inwest Sp. z o.o. Centrum aktywności społecznej w Centrum Spotkań Międzypokoleniowych przy ul. Brynicy 3	-	-	nd.	nd.	Wnioskodawca odstąpił od realizacji projektu.	O
130	BFC Nieruchomości Johann Bros Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej	2019-2022	14 378 000 zł	b.d.	nd.	W roku 2022 ukończono prace narzucone przez zmienioną ekspertyzę ppoż., w większości zlokalizowane w części zachodniej obiektu. W lipcu 2022 obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Zadanie zakończone.	Z
131	BFC Nieruchomości Johann Bros Adaptacja terenu na potrzeby inicjatyw lokalnych, sportu, kultury i turystyki, a także lokalnych firm oraz zwiększenie jego adaptacyjności do zmian klimatycznych	-	-	nd.	nd.	Realizację zadania przesunięto na lata kolejne	P

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
132	BFC Nieruchomości Johann Bros Optymalizacja gospodarowania energią oraz zwiększenie efektywności energetycznej Browaru Mokrskich w Szopienicach	2019-2023 ²⁹	2 800 000 zł	bd.	445 000 zł	W roku 2022 nie odesłano karty monitoringowej. W roku 2023 wykonano instalacje PV na obiektach B i C. Wprowadzono też inny system rozliczeń za energię z dostawcami. Obecnie instalację PV posiada 5 obiektów (są one w rejestrze zabytków, stąd nie mogą ich mieć wszystkie obiekty).	R
133	BFC Nieruchomości Johann Bros Centrum aktywności społecznej dla społeczności lokalnej w budynku D Browaru Mokrskich	2020-2023	12 840 000 zł	b.d.	240 000 zł	W roku 2022 nie odesłano karty monitoringowej. W roku 2023 zakończono aranżację i doposażenie Centrum. Zadanie zakończone.	Z
134	BFC Nieruchomości Johann Bros Adaptacja zabudowy przy ul. Obrońców Westerplatte 24, 26 i 40 oraz przyległego terenu na cele społeczno - gospodarcze	2019-2023 ³⁰	6 500 000 zł	b.d.	260 000 zł	W roku 2022 nie odesłano karty monitoringowej. W roku 2023 w obiekcie nr 40 zakończono jego adaptację na kamienicę z parterem z lokalami użytkowymi oraz mieszkalnymi na piętrach. W obiekcie 26 dokonano wymiany stropów i adaptacji klatki schodowej pod kątem połączenia go z obiektem pod numerem 24. W obiekcie 24 wykonano nową konstrukcję dachu i obróbki, zaczęto też wylewać nowe stropy.	R
135	BFC Nieruchomości Johann Bros Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wzrost kompetencji społeczno - zawodowych w Szopienicach	-	-	nd.	nd.	Wnioskodawca odstąpił od realizacji projektu.	O
136	BFC Nieruchomości Johann Bros Poprawa kompetencji zawodowych uczniów szkół zawodowych	-	-	nd.	nd.	Wnioskodawca odstąpił od realizacji projektu.	O
137	Miasto Katowice Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutzowi na cele kulturalne	-	-	nd.	nd.	Realizację zadania przesunięto na lata kolejne.	P
138	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych	-	-	nd.	nd.	Realizację zadania przesunięto na lata kolejne.	P

²⁹ Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r.

³⁰ Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
	budynków mieszkalnych położonych przy Placu Powstańców 6, Placu Powstańców 6b, Placu Powstańców 7, Placu Powstańców 8, ul. Obrońców Westerplatte 4 wraz z wyburzeniem budynków użytkowych i zagospodarowaniem terenu						
139	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Zamenhofska 30-30d, 32-32d, 34-34d	-	-	nd.	nd.	Realizację zadania przesunięto na lata kolejne.	p
140	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska Walcownia Cynku	2013-2017	6 300 000 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	z

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

W granicach podobszaru Szopienice – Burowiec przewidziano do realizacji **40 projektów: 25 miejskich i 15 pozamiejskich. Zakończono realizację 24 projektów. W trakcie realizacji znajdowało się 5 projekty**, a do realizacji **zaplanowano 4 pozostałych**. W zakresie **1 projektu** zgłoszonego przez instytucje zewnętrzne, wnioskodawca nie odesłał informacji sprawozdawczej, natomiast w zakresie **6 projektów** wnioskodawcy odstąpili od ich realizacji.

1.5.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Szopienice-Burowiec, w roku 2022 i w roku 2023 zrealizowano w ramach:

- **działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu:** funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypożyczania rowerów. - funkcjonowały stacje "Szopienice - Plac Powstańców Śląskich", "Korczaka - Andersa" oraz „Park Olimpijczyków”.
- **projektów inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych Miasta Katowice:**
 - **przez jednostki oświatowe (działalność remontowa) m.in. w 2023 r.** remont Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej, Szkoły Podstawowej nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego; Miejskiego Przedszkola nr 66; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12, Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka; **w 2023 r.** remont Szkoły Podstawowej nr 55 Specjalnej, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego.
- **przedsięwzięć „oddolnych”:**

W 2022 r. zrealizowano:

1. *Remont i modernizacja istniejących boisk szkolnych oraz budowa nowego boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach* (BO, Wydział Edukacji i Sportu).
2. *Modernizacja boiska sportowego wraz z wymianą osprzętu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12* (BO, Wydział Edukacji i Sportu): wymieniono zniszczoną nawierzchnię poliuretanowej i bramek oraz wyremontowano piłkochwyty i ławki.
3. *Nowości wydawnicze i doposażenie filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28* (BO, Wydział Kultury).
4. *Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, materiałów do pracy z dziećmi, doposażenie biblioteki, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii 19* (BO, Wydział Kultury).
5. *Rodzina Ekologicznych w Szopienickiej Bibliotece* (Zielony Budżet, Wydział Kultury): przeprowadzono cykl warsztatów ekotorba, które polegały na samodzielnym zaprojektowaniu malunku na ekologicznej torbie.
6. *Ogród sensoryczny/deszczowy na skarpie, przy murze starej huty - teren wokół skate pointu* (BO, ZZM): zazielenienie skarpy na terenie skweru H. Krzysztofiaka.
7. *Zazielenimy Przelotową* (Zielony Budżet, ZZM): zazielenienie przestrzeni miejskiej na ulicy Przelotowej.
8. *Ogród sensoryczny z ziół i krzewów - skwer J.Klatt* (Zielony Budżet, ZZM): stworzenie ścieżek sensorycznych/toru przeszkód wśród ciekawych i zróżnicowanych roślin.
9. *Szopienice.PL - nasza dzielnica w internecie* (Małe Granty, Wydział Kultury).
10. *Dom Historii* (Małe Granty, Wydział Kultury).
11. *Kazimierz Kutz - spacer historyczny w 4 rocznicę śmierci* (Małe Granty, Wydział Kultury).
12. Zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2022 roku: *5-10-15-Dzień Sąsiada w 15-rocznicę działalności na Bagnie; Tradycje i obrzędy wigilijne na Bagnie – spotkanie opłatkowe; My się korony nie boimy i na Bagnie w lato się bawimy. Wakacje na Bagnie; Szkoła sercem dzielnicy. Jubileusz „120 lat Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach”; Dzień Dziecka i Święto Rodziny W Szkole Podstawowej Nr 45 Im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach; Szopienicka Spartakiada Dzieci, Młodzieży i Dorosłych; Zazielen Szopienice; 65 lat minęło... - Festyn z okazji Jubileuszu 65-lecia 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej; 70-lecie Miejskiego Domu Kultury Szopienice - Giszowiec przy ul. Gen. J. Hallera 28 w Katowicach.*

W 2023 r. zrealizowano:

1. *Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28* (BO, Wydział Kultury).
2. *"Głos z Długosza" - zakup sprzętu nagłośniającego i audiowizualnego dla VI LO* (BO, VI Liceum Ogólnokształcące).
3. *Doposażenie i wymiana części zaplecza sprzętowego Hutniczego Klubu Sportowego Szopienice* (BO, MOSiR).
4. *Odnowione boisko przy szkole na Deszczowej 14* (BO, CUW).
5. *Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, materiałów do pracy z dziećmi, doposażenie biblioteki, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii 19.*
6. *Szabelniana wśród zieleni* (BO, Wydział Kultury).
7. *Rodzina ekologicznych w szopienickiej bibliotece* (Zielony Budżet, Wydział Kultury): organizacja spotkań i warsztatów dla całych rodzin polegających na tworzeniu nowych, użytkowych przedmiotów ze starych już nie używanych.
8. *Zielony Uthemann* (Zielony Budżet, ZZM): zazielenienie w rejonie ul. Wiosny Ludów.
9. *Szopienicki ekosystem - warsztaty edukacyjne* (Zielony Budżet, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 25) Szkoła Podstawowa nr 45, Szkoła Podstawowa nr 42 w ZSP12).
10. W ramach Inicjatywy Lokalnej zrealizowano: *Klub Seniora – Młodzi Duchem, Piknik na Borkach 2023, Wspólnie znaczą kreatywnie, Porządek zrobiony – namiot wystawiony, Dzień Sąsiada 2023 na Bagnie*

zaczynamy, Choinka ustrójona - Betlyjka zrobiono - Ponboczek się rodzi - Wilijo na Bagnie 2023 nadchodzi, 1-2-3- moje kolorowe i radosne wakacje na Bagnie, Dzień dziecka i święto rodziny w szkole podstawowej nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach, Festyn Rodzinny przy Miejskim Przedszkolu nr 60 w Katowicach, Piknik rodzinno – edukacyjny „uruchom wyobraźnię – włącz bezpieczeństwo”, Warsztaty plastyczne dla dzieci i seniorów, Muzyka nad Morawą – cykl koncertów orkiestr dętych w plenerze”, „ANDRZEJKI” po śląsku – zabawa integracyjna, Prosta droga do kultury, 150 lat historii szopienickiej OSP – wydanie kroniki oraz materiałów promujących wydarzenie, XII SZOPIENICKI TALENT – konkurs dla mieszkańców Szopienic i woj. Śląskiego.

1.6 Podobszar Janów-Nikiszowiec

1.6.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
– depopulacja, – niska aktywność gospodarcza, – zły stan techniczny budynków	wymiar społeczno-kulturowy: – tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, – poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, wymiar gospodarczo-technologiczny: – aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej, – wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, – kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, wymiar infrastrukturalno-środowiskowy: – tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, – podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej	Wzmocnienie istniejących oddolnych aktywności społecznych i gospodarczych determinujących atrakcyjność turystyczną, w oparciu o lokalny potencjał kulturalny, w tym dziedzictwo przemysłowe oraz unikatowe walory urbanistyczne na rzecz większej popularyzacji miejsca i wzrostu przedsiębiorczości lokalnej

1.6.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 6. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Janów - Nikiszowiec

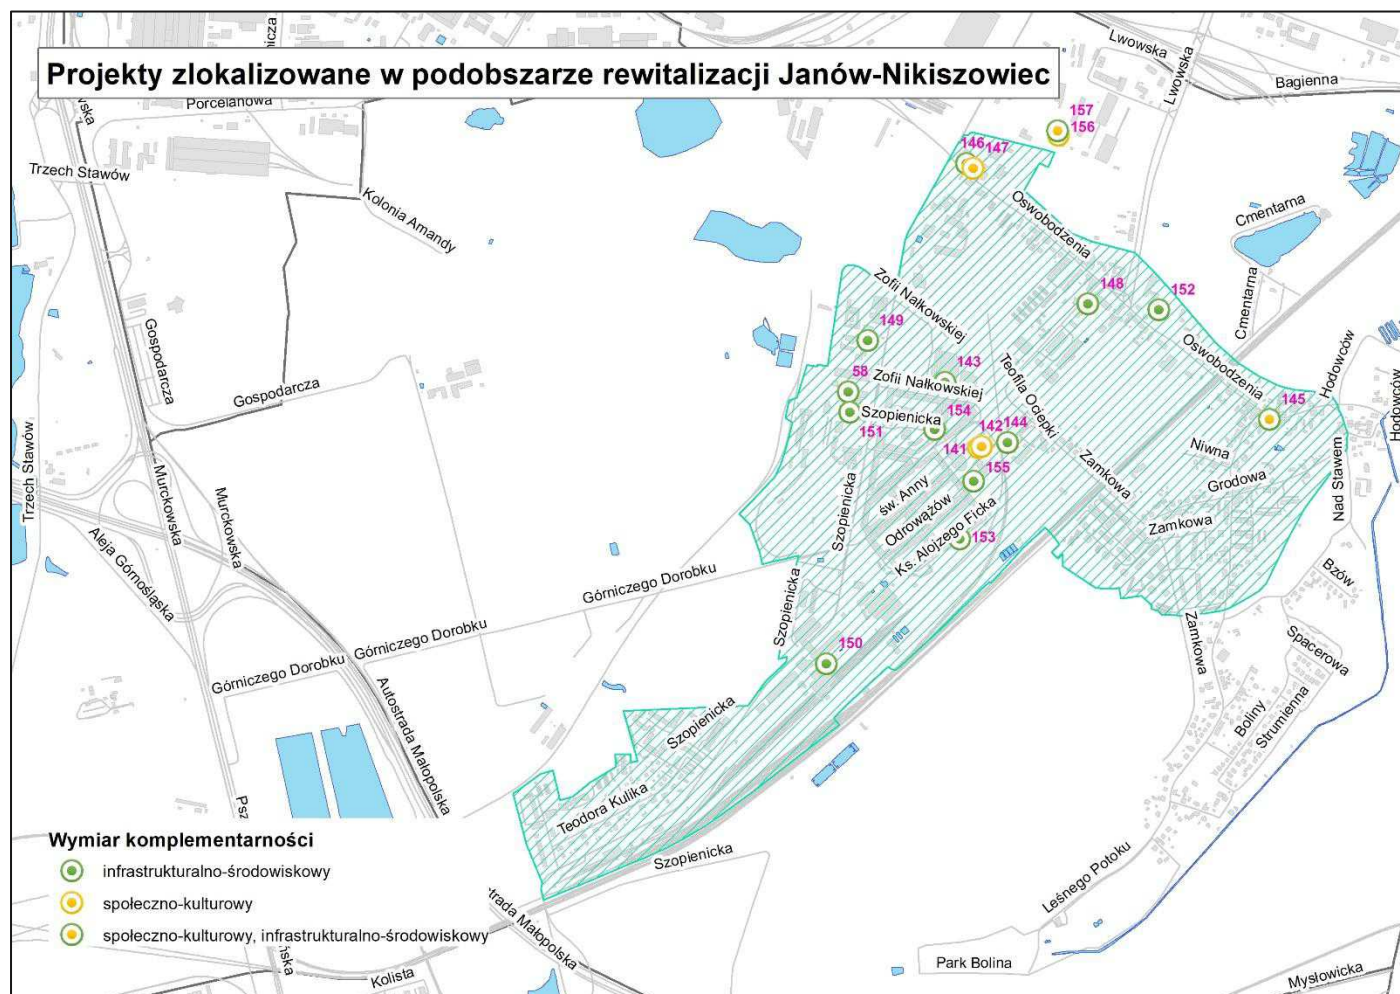


Tabela 6. Projekty podstawowe w podobszarze Janów - Nikiszowiec - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 6 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2023; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (przesunięto na lata następne), O – odstąpiono od realizacji

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
58 ³¹	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	-	-	nd.	nd.	Zespół zabytkowych budynków Szybu Poniatowski: Realizację zadania przesunięto na lata kolejne.	P
141	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap	2017-2020	1 391 748 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z

³¹ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów - Nikiszowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
142	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap	2020-2022	1 179 616 zł	615 543 zł	nd.	W 2022 roku realizowano warsztaty edukacyjne, artystyczne, warsztaty rękodzieła, zajęcia sportowe, wyjazdy jednodniowe, wyjścia kulturalno-integracyjne, spotkania poradnictwa specjalistycznego – zdrowy kręgosłup oraz poradnictwa psychologicznego. Ponadto w ramach zadania zleconego, w 2022 roku zrealizowano również Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Janów – Nikiszowiec (realizowano m.in. kursy kwalifikacyjne oraz staże zawodowe dla mieszkańców dzielnicy pozostających bez pracy). Zadanie zakończone.	Z
143	Miasto Katowice (MOSiR), Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mroźniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II	2018-2019	8 649 199 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
144	Miasto Katowice (MZUiM) Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (BO)	2020-2021	592 425 zł	512 475 zł	nd.	Wykonano nową nawierzchnię jezdni. Zadanie zakończone.	Z
145	Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam Ku życiu godziwemu - jestem obywatelem i pracownikiem ³²	2018-2019	356 000 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
146	Pro Inwest Sp. z o.o. Przebudowa zabudowań Szybu Wilson wraz z otoczeniem z adaptacją na potrzeby społeczno - edukacyjne, kulturalne i gospodarcze	-	-	nd.	nd.	Wnioskodawca odstąpił od realizacji projektu.	O

³² Pierwotnie projekt: Utworzenie ogrodu terapeutycznego

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
147	Pro Inwest Sp. z o.o. Szyb Wilson – centrum życia społecznego Janowa - Nikiszowca	-	-	nd.	nd.	Wnioskodawca odstąpił od realizacji projektu.	O
148	Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis Budowa Centrum Wsparcia Cordis w Katowicach (wcześniej: Rozbudowa Hospicjum Cordis w Katowicach - Centrum Usług Społecznych)	-	-	nd.	nd.	Wnioskodawca odstąpił od realizacji projektu.	O
149	Epione sp. z o.o. Rewitalizacja zabudowań dawnego Urzędu Gminy Janów przy ul. Szopienickiej 5	-	-	nd.	nd.	Realizacja projektu została przesunięta na lata kolejne.	P
150	Miasto Katowice Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny	2022-2027	630 001 958 zł	3 803 541 zł	9 272 631 zł	W roku 2022 zinventaryzowano stan techniczny obiektów przeznaczonych pod budowę HUBa, wyłoniono wykonawcę I etapu inwestycji. W roku 2023 zakończono prace projektowe dot. I etapu inwestycji. W wyniku ogłoszonego konkursu wybrano projekt koncepcyjny – architektoniczno-urbanistyczny dla II etapu inwestycji. Trwają negocjacje zmierzające do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	P
151	Miasto Katowice Dzielnica nowych technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	2023-2025	2 705 280 zł	0	125 087 zł	W roku 2022 przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego obiektów. Środki zaplanowano na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. W roku 2023 opracowano inwentaryzację i ekspertyzę obiektów w rejonie szybu Poniatowski.	P
152	Miasto Katowice (KZGM) Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Oswobodzenia 53a	2021-2022	284 702 zł	24 600 zł	260 102 zł	W roku 2022 opracowano dokumentację. Uzyskana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew niezbędnej dla rozpoczęcia robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych została przesunięta na 2023 r. W roku 2023 została zawarta umowa na wykonanie robót	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
						budowlanych. Roboty budowlane zostały zakończone i rozpoczęto procedurę odbioru technicznego. Odbioru końcowego dokonano w dniu 06.12.2023r. Zadanie zakończone.	
153	Miasto Katowice (MZUiM) Przebudowa drogi w ul. Ficka	2021 i 2024	1 584 615	0	0	W roku 2022 i 2023 trwały uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz pozyskanie stosownych zgód od właścicieli terenu, na którym zlokalizowana jest część chodnika przy ul. Ficka. W 2024 zakończono realizację zadania.	Z
154	Miasto Katowice/MHK Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 – Działu Etnologii Miasta	-	-	nd.	nd.	Odstąpiono od realizacji zadania.	O
155	CUW Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach	-	-	nd.	nd.	Odstąpiono od realizacji zadania.	O
156	Miasto Katowice (ZSZ nr 3/ CUW) Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych.	2016-2018	169 350 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
157	Miasto Katowice (ZSZ nr 3) Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach	2015-2017	1 106 142 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

W granicach podobszaru Janów - Nikiszowiec przewidziano do realizacji **18 projektów, w tym 13 projektów miejskich i 5 pozamiejskich** Zakończono realizację **9 projektów, 5** zostało przesuniętych na lata następne, odstąpiono od realizacji **4 projektów.**

1.6.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Janów - Nikiszowiec, w roku 2022 i 2023 zrealizowano w ramach:

- **działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu:** funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypożyczania rowerów. W 2022 r. funkcjonowały stacje "Nikiszowiec Skwer Zillmannów", "Nikiszowiec – Szyb Wilson" oraz „Nikiszowiec – św. Anny”.
- **projektów inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych Miasta Katowice:**
 - **przez jednostki oświatowe (działalność remontowa)** m.in. w 2022 r. remont: Szkoły Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego, Miejskiego Przedszkola nr 32, Miejskiego Przedszkola nr 63; w 2023 remont Szkoły Podstawowej nr 53.
 - **przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:** w 2022 r. realizacja zadania Modernizacja oświetlenia hali lodowiska Jantor oraz Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w części sportowej - Jantor II, w 2023 r. realizacja zadań Wykonanie systemu asekuracji na dachu lodowiska Jantor II oraz Remont elementów konstrukcji nośnej zadaszenia lodowiska Jantor II.
 - **przez Muzeum Historii Katowic:** w 2022 r. i w 2023 r. realizacja zadania: Adaptacja pomieszczeń piwnicznych oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 na działalność edukacyjną.
- **przedsięwzięć „oddolnych”:**

W 2022 r. zrealizowano:

1. *Remont szatni szkolnej w budynku przy Placu Wyzwolenia 18* (BO, Wydział Edukacji i Sportu): zakupiono 580 sztuk szafek dla uczniów oraz 5 sztuk dwumetrowych ławek do szatni szkolnej.
2. *Ścieżka edukacyjna polskich drzew na Bolinie* (BO, ZZM): nasadzono drzewa w Parku Bolina.
3. *Street workout - park do ćwiczeń dla młodzieży* (BO, ZZM): na ulicy Zamkowej wybudowano plac do ćwiczeń street workout, czyli ćwiczeń w obrębie ciężaru własnego ciała od podciągania i pompek po trudne elementy.
4. *Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zamkowej 45* (BO, Wydział Kultury).
5. *Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o elementy rekreacyjno-sprawnościowe przy Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18* (BO, Wydział Edukacji i Sportu).
6. *Witamy na Janowie! - oświetlony herb naszej dzielnicy* (BO, Wydział Promocji).
7. *Dzielnicowy Bank Drzew* (Zielony Budżet, ZZM): zakupiono sadzonki drzew.
8. *Koncert kolędowy Happy Big Bandu* (Małe Granty, Wydział Kultury).
9. Zadanie w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2022 roku: *Wielki Rodzinny Dzień Dziecka w MP nr 62. Sport i zabawa to zgrany duet.*

W 2023 r. zrealizowano:

1. *Nowoczesna strefa rekreacyjno-dydaktyczna przyjazna dzieciom i mieszkańcom dzielnicy Janów-Nikiszowiec* (BO, Szkoła Podstawowa nr 53).
2. *Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ulicy Zamkowej 45* (BO, Wydział Kultury).
3. *Zielony zakątek na rynku* (Zielony Budżet, ZZM): nasadzenia na placu Wyzwolenia.
4. *Donice na rynku nikiszowieckim* (Zielony Budżet, ZZM).
5. *Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o elementy rekreacyjno-sprawnościowe przy Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18* (BO, Szkoła Podstawowa nr 53).
6. *Łąka kwietna oraz domek dla dzikich pszczoł* (Zielony Budżet, ZZM).
7. W ramach Inicjatywy Lokalnej zrealizowano: *Rodzinny Dzień Dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 62 w Katowicach. Magia, iluzja i wyobrażenia jako klucz do rozwoju i dobrej zabawy, Rodzinna biesiada na Bolinie.*

Dodatkowo:

- Prowadzono prace związane z przystąpieniem do sporządzenia mpzp w rejonie ul. Szopienickiej (uchwała nr XXXVII/721/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r.). W 2022 r. opracowywano koncepcję planu.

2. Informacja sprawozdawcza z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice w podobszarach występowania problemów przestrzennych

2.1 Podobszar Zawodzie – Porcelanowa

Rysunek 7. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Zawodzie-Porcelanowa



Tabela 7. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - Porcelanowa - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 7 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2023; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (przesunięto na lata następne)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
77	Fundacja Giesche Projekt główny: Adaptacja terenu historycznej fabryki porcelany wraz z post-	2018-2023 ³³	15 000 000 zł	492 000 zł	98 400 zł	W roku 2022 w Proj. Cz. 2: Adaptacja budynku B1 strona lewa/wykonano biura pod wynajem dla potencjalnych przedsiębiorców zakres wykonanych prac obejmował -wykonanie robót budowlanych -instalacje elektryczne i niskoprądowej	R

³³ Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023
	industrialnym terenem. Projekt częściowy 1: Adaptacja budynków Fabryki Porcelany w Katowicach na budynki biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem otoczenia jako kolejny etap i rozbudowa Parku Przemysłowo-Technologicznego "Porcelana Śląska Park" w Katowicach wraz z rozbudową Kłastera Innowacyjności i Dizajnu - etap I Projekt częściowy 2: Adaptacja budynku B1 strona lewa Projekt częściowy 3: Adaptacja budynku A1 Projekt częściowy 4: Adaptacja budynku D					-instalacje sanitarne, grzewcze, wentylacji, -remont sieci wod-kan, c.o. i elektrycznej W Proj. Cz. 3: Adaptacja budynku A: - prace adaptacyjne lokali w tym planowanie sufitów, wylewki, murywanie otworów drzwiowych. Proj. Cz. 4: Adaptacja budynku D- wymieniono drzwi naprzeciwpożarowe, odmalowano pomieszczenie. Zakończono wymianę oświetlenia zewnętrznego. W roku 2023 w Proj. Cz B1 - wykonano i zakończono wszystkie instalacje: elektryczne, wentylacyjne i wod-kan, oraz c.o.. Przeprowadzono prace w zakresie podłóg i ścian. Założono ogrzewanie podłogowe.

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

W podobszarze inwestor Fundacja Giesche na lata 2018-2023 zaplanował realizację kompleksowego projektu rewitalizacji historycznych zabudowań Fabryki Porcelany. Inwestor uzyskał dofinansowanie unijne dla realizacji I etapu zaplanowanych prac w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych tj. dla zadania: Adaptacja budynków Fabryki Porcelany w Katowicach na budynki biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem otoczenia jako kolejny etap i rozbudowa Parku Przemysłowo-Technologicznego "Porcelana Śląska Park" w Katowicach wraz z rozbudową Kłastera Innowacyjności i Dizajnu.

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Zawodzie-Porcelanowa, w roku 2022 i 2023 zrealizowano w ramach:

- **działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu:** funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypożyczania rowerów - funkcjonowała stacja "Fabryka Porcelany".

Dodatkowo:

- Prowadzone były prace związane z sporządzeniem **mpzp** obszaru położonego w rejonie ulic Murckowskiej i Porcelanowej w Katowicach (uchwała nr XXXVII/722/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r.). W 2022 r.:

- sporządzono projektu planu wraz z opracowaniami dodatkowymi (prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych)
- przeprowadzono opiniowanie przez Wydziały Urzędu Miasta
- złożono wniosek o przeznaczenie gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

W 2023 r. po otrzymaniu negatywnej opinii z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z opracowania wyłączono część obejmującą cmentarz. Dla pozostałej części przeprowadzono procedurę opiniowania i uzgodnień przez organy.

2.2 Podobszar Dąb – Baildona

Rysunek 8. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Dąb-Baildona



Tabela 8. Projekty podstawowe w podobszarze Dąb - Baildona - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 8 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2023; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (przesunięto na lata następne)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
92	Miasto Katowice Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowogliwickiej	2015-2016	2 513 218 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
93	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Rewitalizacja terenów po byłej Hucie Baildon ³⁴	-	-	nd.	nd.	Realizację projektu przesunięto na lata kolejne.	P
94	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Program inkubowania i akceleracji aktywności społecznej i zawodowej lokalnej społeczności na terenie Nowego Baidonu	2019-2021	1 000 000 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z

³⁴ Pierwotna nazwa projektu: „Rozwój Parku Przemysłowo-Technologicznego „Revita-Park” w dzielnicy Załęże w Katowicach na terenach po byłej Hucie Baildon”.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
95	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Rewitalizacja terenów po byłej Hucie Baildon - ulica Bracka	-	-	nd.	nd.	Realizację projektu przesunięto na lata kolejne.	p
163 ³⁵	Miasto Katowice (MOPS) Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2015-2017	321 806 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
164 ³⁶	Miasto Katowice (MOPS) NGO Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2018-2020	590 972 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
170	Miasto Katowice (MOPS) Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb	2021-2022	906 768 zł	630 639 zł	nd.	W okresie sprawozdawczym realizowane były działania animacyjne, środowiskowe, wsparcie specjalistyczne, warsztaty dla mieszkańców, wyjścia integracyjne, wydarzenia lokalne, inicjatywy oddolne; realizowano działania w ramach trzech stref: Rodzina, Młodzież i Seniorzy. Zadanie zakończone.	Z

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

łącznie w obrębie podobszaru w LPR **ujęto 7 projektów**. Głównym podmiotem realizującym działania rewitalizacyjne w tym obszarze miasta jest firma Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A., która kontynuuje zapoczątkowany wiele lat temu proces ożywienia tego terenu.

Na terenie jednostki pomocniczej Dąb Miasto zrealizowało Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie, w ramach **3 projektów** Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, obejmujących szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej, zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców.

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Dąb-Baildona, w roku 2022 i w roku 2023 zrealizowano w ramach:

- **działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu:** funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypożyczania rowerów - funkcjonowała stacja "Silesia Business Park".

^{35,20} Projekt wyszczególniono w tabeli i wskazano na mapie, gdyż administracyjnie dotyczy jednostek pomocniczych: Wełnowiec – Józefowiec i Dąb, i jest dedykowany ich mieszkańcom. Projektu nie wlicza się jednak do liczby projektów realizowanych w podobszarze - zaklasyfikowanym, jako podobszar występowania problemów przestrzennych.

2.3 Podobszar Kolonia Alfred

Rysunek 9. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Kolonia Alfred



Tabela 9. Projekty podstawowe w podobszarze Kolonia Alfred - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 9 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2023; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (przesunięto na lata następne)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
161	Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami (wcześniej: Centrum Społecznościowe "Wioska serca im. Jana Pawła II" w Katowicach - program działań na rzecz włączenia społecznego)	2018-2022	1 860 003 zł	1 860 003 zł	nd.	W ramach realizacji zadania objęto wsparciem dzieci oraz dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie znaczne oraz umiarkowane. Zadanie umożliwiło osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia poprzez zapewnienie wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb oraz poprzez uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych. Zadanie zakończone.	Z
162	Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” Adaptacja i remont budynków	2016-2021	1 737 732 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z

	poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, na potrzeby powstania Centrum Usług Społecznych dla Rodziny "Wioska Serca im. Jana Pawła II" (wcześniej: Centrum Społecznościowe "Wioska serca im. Jana Pawła II" w Katowicach – działania inwestycyjne)						
163 ³⁷	Miasto Katowice (MOPS) Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2015-2017	344 563 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
164 ³⁸	Miasto Katowice (MOPS) NGO Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2018-2020	584 639 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

W podobszarze występowania problemów przestrzennych: Kolonia Alfred zrealizowano **2** komplementarne względem siebie **projekty** zgłoszone przez Fundację Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” (**działania inwestycyjne oraz projekt miękkie**).

Ponadto, na terenie jednostki pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec Miasto zakończono **2 projekty** Programu Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie obejmującego szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej, zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców.

^{37, 22} Projekt wyszczególniono w tabeli i wskazano na mapie, gdyż administracyjnie dotyczy jednostek pomocniczych: Wełnowiec – Józefowiec i Dąb, i jest dedykowany ich mieszkańcom. Projektu nie wlicza się jednak do liczby projektów realizowanych w podobszarze - zaklasyfikowanym jako podobszar występowania problemów przestrzennych.

2.4 Podobszar Wełnowiec – Konduktorska

Rysunek 10. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Wełnowiec-Konduktorska

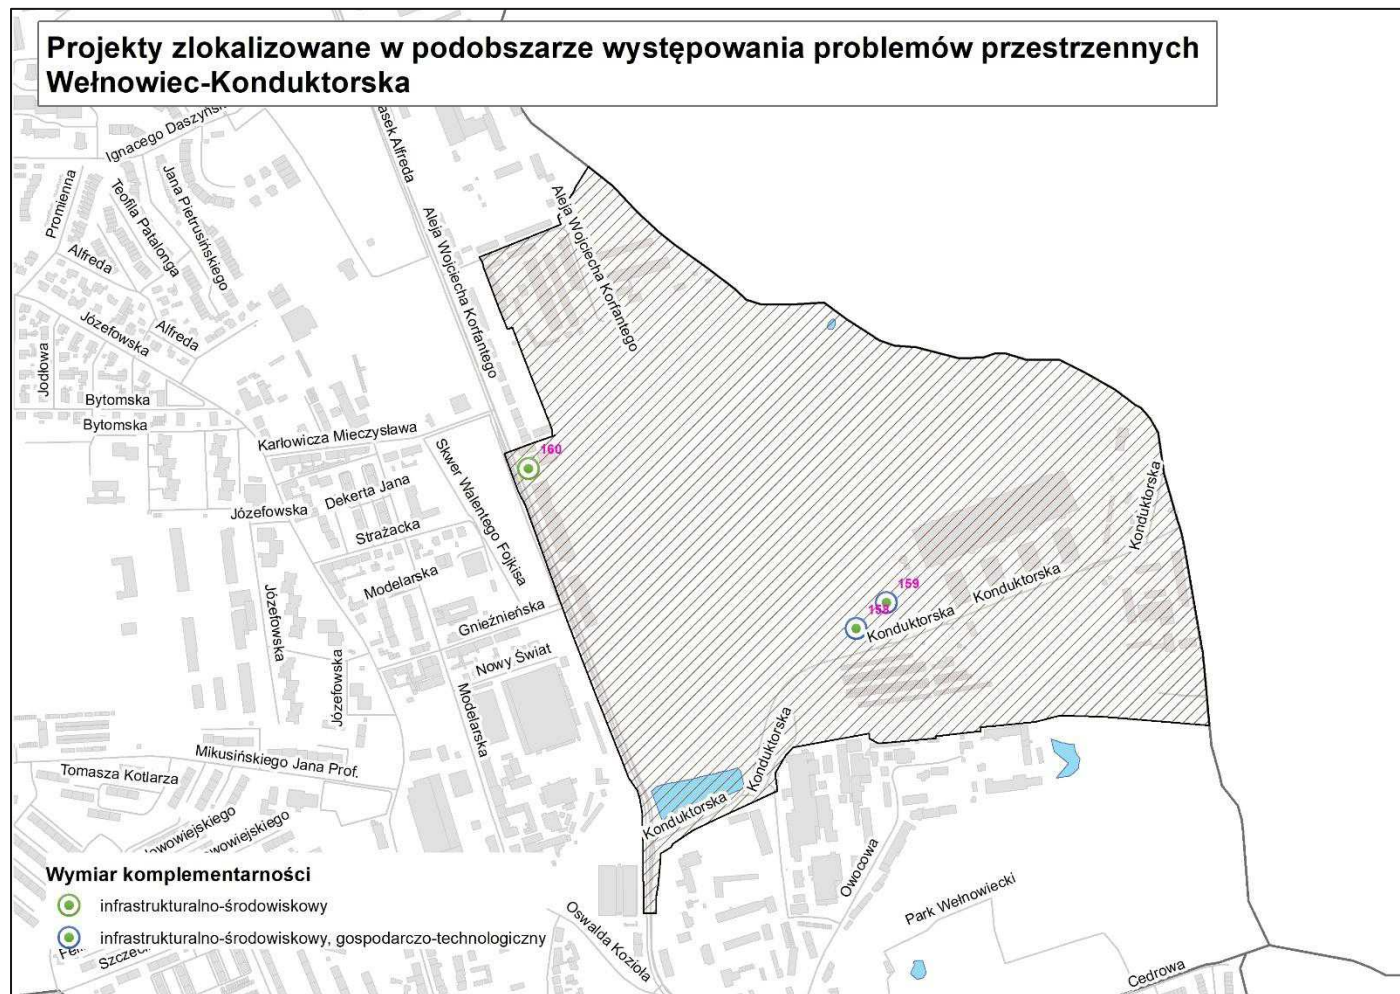


Tabela 10. Projekty podstawowe w podobszarze Wełnowiec – Konduktorska - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 10 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2023; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (przesunięto na lata następne)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
158	GPP Business Park S.A. Budynek administracyjno-biurowy - moduł 4, należący do kompleksu budynków GPP przy ul. Konduktorskiej w Katowicach, wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami zewnętrznymi, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, przebudową zjazdu	2017-2019	44 000 000 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
159	ECO CITY KATOWICE Sp. z o.o. Budowa 4 budynków biurowych (ECO1, ECO2, ECO3, ECO4) wraz z garażami o dwóch kondygnacjach podziemnych oraz z naziemnymi miejscami postojowymi (wcześniej: Budowa zespołu budynków HSBM w Katowicach przy ul. Konduktorskiej)	2020-2023 ³⁹	200 000 000 zł	28 051 338 zł	5 731 223 zł	W roku 2022 wykonano zamknięcie stanu surowego obiektów Eco1 i Eco2 (dach i szklana elewacja). Zrealizowano zabezpieczenie przeciwwodne płyty stropowej poziomu 0 wraz z ułożeniem warstw odsączających na płycie stropu. Wykonano instalację podciśnieniowego odwodnienia dachów Eco1 i Eco2 oraz instalację odgromową. Rozpoczęto prace związane z budową dwupoziomowego garażu podziemnego pod obiektem Eco3 (roboty ziemne i rozpoczęcie prac żelbetowych). W roku 2023 zakończono montaż drzwi obrotowych oraz prac związanych z izolacją ścian kondygnacji technicznej budynków Eco1 i Eco2. Wykonano konstrukcję żelbetowej garażu podziemnego w obrębie budynku Eco3. Ułożono papę na płycie stropowej garażu Eco3 w poziomie „0”. Wykonano oświetlenie krawędziowego budynków Eco1 i Eco2 oraz zasypanie stropu garażu Eco1 i Eco2. Zakończono prace związanych z uszczelnieniem dachów budynków Eco1 i Eco2.	R
160	Przedsiębiorstwo Handlowe "HERMES" Sp. z o.o. Budowa dwóch budynków usługowo-biurowych z garażem podziemnym z budową infrastruktury technicznej i elementami małej architektury	-	-	nd.	nd.	Realizację zadania przesunięto na lata kolejne.	P
163 ⁴⁰	Miasto Katowice (MOPS) Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2015-2017	321 806 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
164 ⁴¹	Miasto Katowice (MOPS) NGO Program Aktywności Lokalnej	2018-2020	590 972 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z

³⁹ Zakończenie realizacji projektu nastąpi po 2023r.

^{40, 24} Projekt wyszczególniono w tabeli i wskazano na mapie, gdyż administracyjnie dotyczy jednostek pomocniczych: Wełnowiec – Józefowiec i Dąb, i jest dedykowany ich mieszkańcom. Projektu nie wlicza się jednak do liczby projektów realizowanych w podobszarze - zaklasyfikowanym, jako podobszar występowania problemów przestrzennych.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
	w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)						

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

W granicach podobszaru przewidziano do realizacji łącznie **5 projektów**, w tym **2 miejskie i 3 pozamiejskie**. Spośród nich **3 zakończono, 1 znajduje się w trakcie realizacji, 1 jest planowany**.

Na terenie jednostki pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec Miasto zrealizowało Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie, obejmującego szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej, zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców.


W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Wełnowiec-Konduktorska, w roku 2022 i w roku 2023 zrealizowano w ramach:

- **działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu:** funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypożyczania rowerów - stacja "GPP Business Park".

Dodatkowo:

- Przyjęto **mpzp** w rejonie Alei W. Korfantego 179a (uchwała nr XLVII/1046/22 Rady Miasta Katowice z dnia 28 kwietnia 2022 r.). W 2022 i 2023 r. prace nad planem obszaru „Katowice Północ Eko-Miasto” położonego w rejonie Alei W. Korfantego i ul. Konduktorskiej w Katowicach zostały wstrzymane w związku ze zmianą Studium oraz brakiem ostatecznego przebiegu układu drogowego – zadanie inwestycyjne pn. „Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego) (uchwała nr XXX/694/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 r.). Ponadto przystąpiono do sporządzenia mpzp w rejonie Alei W. Korfantego, ulicy Konduktorskiej i Telewizyjnej w Katowicach. W 2022 r. zebrano wnioski, przeprowadzono prace wstępne i analizy opracowywania projektu planu. W 2023 r. zakończono prace nad projektem planu oraz przesłano go do opiniowania i uzgodnień przez organy.

Rysunek 11. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Szopienice-Woźniaka

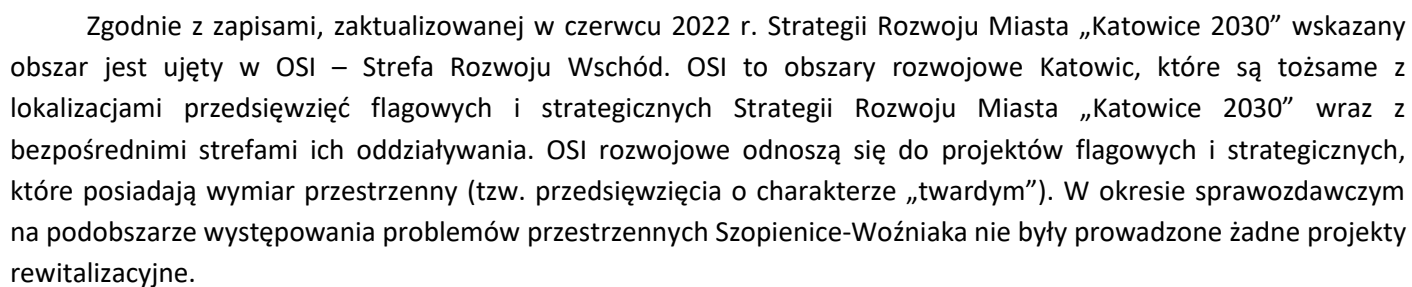

2.6 Podobszar Śródmieście – Raciborska

Rysunek 12. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Śródmieście-Raciborska



Teren zabudowany obiektami byłej lokomotywni, położony na międzytorzu, w *Studium* zaliczany jest do specyficznych terenów wymagających kompleksowych przekształceń struktury funkcjonalnej i przestrzennej, w ramach przeobrażeń, których niezbędne jest ukształtowanie przestrzeni publicznych oraz powiązań pieszych i rowerowych z otoczeniem. W okresie sprawozdawczym nie realizowano w podobszarze przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji. W dniu 16 grudnia 2021 r. dokonano wpisu do rejestru zabytków województwa śląskiego – jego zakres obejmuje dwuwachlarzową halę lokomotywni wraz z dwiema obrotnicami, wieżą ciśnieniową i przyległym budynkiem dawnej ślusarni.

3. Informacja sprawozdawcza z realizacji projektów i polityk horyzontalnych, obejmujących cały obszar Katowic

Projekty tej kategorii obejmują swym zasięgiem obszar całego Miasta, bądź adresowane są do wszystkich jego mieszkańców, choć przy realizacji niektórych z nich, szczególny nacisk kładzie się na poprawę sytuacji w dzielnicach zlokalizowanych w obrębie obszaru zdegradowanego lub poszczególnych podobszarów rewitalizacji.

W ramach projektów podstawowych ujętych w LPR, do realizacji przewidziano następujące projekty o charakterze horyzontalnym:

Tabela 11. Projekty podstawowe horyzontalne - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2023; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji (przesunięto na lata następne)

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
165	Miasto Katowice (MOPS) + NGO + podmiot prywatny) Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap	2018-2019	3 365 254 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
166	Miasto Katowice (MOPS) + NGO Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap	2020-2022	707 069 zł	22 120 zł	nd.	W okresie sprawozdawczym realizowana była usługa asystenta osoby z niepełnośprawnymi. Zadanie zakończone.	Z
167	Miasto Katowice (MOPS) + NGO Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap	2017-2020	2 526 783 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
168	Miasto Katowice (MOPS) + NGO Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap	2018-2019	1 008 568 zł	nd.	nd.	Zadanie zakończone.	Z
169	Miasto Katowice (MOPS) Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	2020-2022	2 508 779 zł	1 382 324 zł	nd.	W 2022 roku realizowano działania w ramach mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oprócz treningów indywidualnych, odbyły się pobyty jedynogodniowe oraz zajęcia integracyjne. W ramach działania wsparcie rodziny usługi świadczyli asystenci rodziny, pedagog oraz terapeuta. W ramach zadania realizowano również usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Zadanie zakończone.	Z

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Wartość wykonania w 2022 roku	Wartość wykonania w 2023 roku	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2022-2023	
171	Miasto Katowice Centrum Aktywności Młodzieżowej	2021-2022	1 092 208 zł	73 256 zł	nd.	W 2022 roku zrealizowano 6 inicjatyw młodzieżowych tj.: "Strefa Zwierzoraju v.2", "Zielono mi - zacznijmy jeszcze raz razem", "Charytatywny Festyn Rodzinny na zakończenie wakacji", "Załęskie kino plenerowe", "Piknik integracyjny", "Aktywizacja kulturalna dzielnicy Szopienice poprzez murale na Hucie Uthemanna". Zadanie zakończone.	Z

*numeracja projektów odpowiada numeracji w Zał. 1 do LPR (uchwała z dnia 28.04.2022 r. nr XLVII/1042/22)

W ramach horyzontalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zakończono realizację wszystkich **6 projektów**.

1. Działania horyzontalne w zakresie edukacji:

W roku 2022 i 2023 realizowano szereg projektów programu Erasmus+, w ramach akcji Mobilność edukacyjna w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Organizacje z obszaru niezawodowej edukacji dorosłych wysłały na mobilności zagraniczne swoją kadrę oraz swoich słuchaczy, czyli dorosłe osoby uczące się. Mogły one m.in. zwiększać działalność na arenie międzynarodowej, doskonalić proces zarządzania, uzyskać dostęp do nowych możliwości finansowania oraz projektów, zwiększyć swoje umiejętności w zakresie opracowywania projektów, zarządzania nimi i prowadzenia działań następczych.

Realizowano również projekty w ramach akcji Współpraca organizacji i instytucji, która polega na międzynarodowej współpracy szkół, placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Cele projektów dotyczą wypracowania i/lub transferu innowacji w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a także wymiany dobrych praktyk. Celem działań powinno być również zdobywanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej oraz dążenie do zmiany charakteru pracy instytucji na bardziej międzynarodowy.

2. Działania adaptacyjne zmierzające do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu:

a. "Miejski Plan Adaptacji" (MPA)

Przy wsparciu środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej, wraz z 44 innymi miastami pod kierownictwem Ministerstwa Środowiska, Katowice brały udział w opracowaniu „Miejskich planów adaptacji do zmian klimatu” (MPA). Dzięki udziałowi w projekcie, miasto w sierpniu 2019 r. otrzymało kompleksowe dokumenty identyfikujące zagrożenia wynikające ze zmian klimatu oraz przedstawiające kompleksowe rozwiązania, a we wrześniu Rada Miasta Katowice przyjęła „Plan adaptacji miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030”.

W roku 2022 i w roku 2023 w ramach realizacji Planu Adaptacji:

- zorganizowano kampanię informacyjno-edukacyjną „Aktywuj tryb ZERO WASTE!” i Leśny Piknik Rodzinny EKOODPOWIEDZIALNIE. Przeprowadzono akcje ekologiczne "Książka za drzewo", "Kwiaty zamiast śmieci" i "Rzeczy dla zwierząt" oraz akcję edukacyjną z okazji 20-lecia Święta Drzewa. Zgodnie z zasadą ZERO WASTE zorganizowano "Spotkania kuchni z klimatem - dla ludzi, dla zwierząt, dla planety" i projekt "Tworzenie z naturą - cykl warsztatów twórczych w duchu zero- waste". Wydrukowano materiały edukacyjne oraz promocyjne.
- kontynuowano działania związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz prace remontowo-budowlane w zakresie modernizacji

- i termomodernizacji budynków oświatowych oraz wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta;
- kontynuowano funkcjonowanie miejskiego centrum energii oraz podstrony internetowej zawierającej informacje o dobrych praktykach adaptacji do zmian klimatu.

Miasto podjęło współpracę w zakresie wymiany doświadczeń dot. mitygacji zmian klimatu i adaptacji do tych zmian w ramach:

- a) organizacji międzynarodowych
 - sieci ICLEI oraz projektu UTA
 - Global Parliament of Mayors
 - Eurocities
 - projektu „Regenerative Urban Lighthouse”, H2020 - celem projektu jest stworzenie tzw. sieci referencyjnej podmiotów/miast/instytucji, które będą zaangażowane w testowanie innowacyjnych rozwiązań w celu odpowiedzi na problemy współczesnych miast i ich adaptacji do zmian klimatu.
- b) krajowych stowarzyszeń
 - Śląski Związek Gmin i Powiatów (Komisja Ekologii, Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej)
 - Związek Miast Polskich
 - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
 - Unia Metropolii Polskich (Zespołu ds. EKOstrategii).

b. Automatyczne wypożyczalnie rowerów

Liczba	2022 ROK	2023 ROK
Automatyczne wypożyczalnie rowerów	125	125
- miejskie	113	114
- sponsorowane	12	11
Suma użytkowników	ponad 117 tys. użytkowników	brak danych
Wypożyczenia	202 378	170 955
Rejestracje nowych użytkowników	15 560	9 791
Wydatki z budżetu Miasta	6 725 000 zł	5 469 763 zł

Zadanie dotyczące uruchomienia sieci automatycznych wypożyczalni rowerów w Katowicach na podstawie zawartego porozumienia realizowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. Operatorem systemu wypożyczalni rowerów miejskich był Nextbike Polska Sp. z o.o. Najpopularniejszymi stacjami City By Bike w 2022 roku były: Katowice Rynek; Dworzec PKP – Młyńska, Os. Paderewskiego - Sikorskiego. Najpopularniejszymi stacjami City By Bike w 2023 roku były Os. Paderewskiego – Sikorskiego; Plac Wolności; Dąb – Kościół; Centrum Przesiadkowe Brynów.

Najpopularniejsze trasą w roku 2022 były: KTBS - Krasińskiego 14 do Katowice – Rynek; Katowice - Rynek do KTBS - Krasińskiego 14; Camping 215 do Dolina 3-ch Stawów. Najpopularniejsze trasą w roku 2023 były: Ligota - Wczasowa - Śląska - Medyków; Śląska - Medyków - Ligota - Wczasowa; Camping 215 - Dolina 3-ch Stawów.

3. Działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Miasta Katowice, we współpracy z Policją i Strażą Miejską, w ramach corocznie przyjmowanego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego - na rok 2022 (uchwała nr XLIII/956/22 z dnia 27.01.2022 r.) oraz na rok 2023 (uchwała nr LIX/1244/23 z dnia 02.02.2023 r.). Głównym celem Programu było odczuwalne podniesienie poziomu bezpieczeństwa, ze szczególnym naciskiem na zwalczanie przestępczości pospolitej i najbardziej dokuczliwej społecznie, zmniejszenie zagrożeń w ruchu drogowym, usprawnienie systemu monitoringu wizyjnego miasta, kształtowanie postaw i zachowań oraz poprawę wyposażenia i warunków pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Katowic.

Zrealizowane działania:

- a. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie lokali gastronomicznych i rozrywkowych, placówek handlowych oraz ich najbliższego otoczenia (dot. głównie nieprawidłowości związanych z naruszeniem przepisów regulujących obrót napojami alkoholowymi w sklepach i lokalach gastronomicznych).

LICZBA	2022 ROK	2023 ROK
Kontrole	1290	1533
Mandaty karne	0	0

- b. Ograniczenie zjawiska handlu ulicznego prowadzonego bezprawnie (priorytet: Śródmieście). Realizacja zadań w zakresie kontroli handlu ulicznego ukierunkowana była na zminimalizowanie tego zjawiska zarówno w Śródmieściu Katowic, jak i w obrębie targowisk miejskich na terenie całego miasta.

LICZBA	2022 ROK	2023 ROK
Kontrole	217	120
Mandaty karne	53	50

- c. Ograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W roku 2022 i 2023 funkcjonariusze Straży Miejskiej najwięcej wykroczeń z tej kategorii ujawnili na obszarze Śródmieścia Katowic. W pozostałych dzielnicach interwencje z zakresu przestrzegania prawa o ruchu drogowym, dotyczyły głównie obszarów, na których skupiona jest znaczna ilość instytucji oraz obiektów użyteczności publicznej. Strażnicy miejscy podjęli w 2022 r. 24795 interwencji komunikacyjnych, a w 2023 r. 23991 interwencji komunikacyjnych.

- d. Ograniczenie zdarzeń zakłócających spokój i porządek w miejscach publicznych, m.in. kontrole miejsc spożywania alkoholu, miejsc gromadzenia się osób nietrzeźwych oraz osób pod wpływem środków odurzających, kontrole gospodarowania odpadami, palenisk, nielegalnych wysypisk itd. Straż Miejska przeprowadziła w 2022 r. **696**, a w 2023 r. **824** kontroli dot. zakłócania ładu i porządku publicznego. W zakresie osób nietrzeźwych SM przeprowadziła w 2022 r. **1256**, a w 2023 r. **6904** interwencji.

- e. Ograniczenie kradzieży i dewastacji infrastruktury komunalnej i elementów metalowych – przeprowadzono w 2022 r. **5** kontroli, a w 2023 r. **1** kontrolę punktów skupu metali kolorowych.

- f. Poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych – system monitoringu wizyjnego miasta obejmujący w 2022 r. 374 kamer, a w 2023 r. 362 kamer), dzięki którym służby mundurowe mogą szybciej reagować na zachowania sprzeczne z prawem, co wpływa na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców (z głównym naciskiem na Śródmieście). W 2022 r. operatorzy na

podstawie zarejestrowanego obrazu z kamer zainicjowali aż **5351 interwencji** wobec zidentyfikowanych zdarzeń zabronionych, w wyniku których nałożono **1401 mandatów karnych**. W 2023 r. operatorzy zainicjowali 5160 interwencji, w wyniku których nałożono **4444 mandatów karnych**.

g. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

LICZBA	2022 ROK	2023 ROK
Kolizje, wypadki	5260	5 582
Ofiary śmiertelne	9	5

h. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i ich okolicy – działania prowadzone poprzez:

- realizację programów profilaktycznych koordynowanych przez WZK *Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Szynki, Bezpieczny Gimnazjalista, Bezpieczna Młodzież* – programami objęte są wszystkie katowickie szkoły
- realizację programów / akcji prewencyjnych prowadzonych przez Straż Miejską (w 2022 r. liczba spotkań: 512, liczba uczestników: 10971; w 2023 r. liczba spotkań 233, liczba uczestników 11084)
- współpracę i współfinansowanie programów i akcji prewencyjno-profilaktycznych realizowanych przez Komendę Miejską Policji, skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych (w 2022 r. liczba spotkań – 458, ilość osób ogółem uczestniczących – 22043, w 2023 r. liczba spotkań – 476, ilość osób ogółem uczestniczących – ponad 20 000).

i. Poprawa funkcjonowania i standardów pracy służb oraz warunków obsługi mieszkańców w placówkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny tj. m.in. poprzez zakup radiowozów nieoznakowanych dla KMP w Katowicach, zakup ciężkiego zestawu sprzętu hydraulicznego ratownictwa technicznego holmatro dla KM PSP oraz remont dachu budynku KM PSP w Katowicach.

j. Edukacja i informowanie społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa i porządku prawnego realizowane poprzez wykorzystanie własnych stron internetowych, komunikatorów społecznościowych tzw. social media, dystrybucję ulotek, plakatów, informatorów, gadżetów służących informacji, edukacji i popularyzacji właściwych postaw i zachowań.

4. Działania z zakresu wspierania inwestorów w procesie przygotowania i realizacji inwestycji (opiekun inwestora, tzw. project manager, Wydział Obsługi Inwestorów)

5. Działania w zakresie gospodarki prowadzone przez Miasto Katowice na rzecz pobudzenia gospodarczego (Wydział Obsługi Inwestorów, w tym we współpracy m.in. z uczelniami wyższymi, PUP i sektorem biznesu):

W 2022 roku m.in.:

- Kontynuacja funkcjonowania **Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink** przy ul. Teatralnej 17a.
- Prowadzenie serwisu internetowego: **www.rawaink.katowice.eu** wraz z bazą wiedzy dedykowaną najemcom Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink i **fanpage'a na Facebooku Strefa Innowacji Miasta Katowice**.
- Promocja inwestycyjna poprzez wykorzystanie strony **www.invest.katowice.eu**.
- **Promocja inwestycyjna poprzez wykorzystanie profilu LinkedIn** w kilku obszarach: biznesowym, kulturowym czy rekreacyjnym.
- **Raport ABSL** – publikacja i promocja cyfrowej polskiej i angielskiej wersji raportu ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach”.

- Kontynuacja pilotażowego **programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH** (Pathways to technology). W pilotażu biorą udział dwie szkoły techniczne z Katowic. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach objęła patronatem firma Kyndryl Global Services Delivery Centre Polska, która łącznie z IBM Polska realizowała zobowiązania programowe) oraz Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe współpracujące z Fujitsu Technology Solutions.
- Realizacja programu **Katowice Miastem Fachowców**. W ramach edycji 2021/2022 do programu zgłosiło się 5 przedsiębiorstw u których odbyły się wizyty studyjne. Jesienią wystartowała edycja 2022/2023-semester zimowy programu, w której wzięło udział 7 przedsiębiorstw.
- **Szkolenia pn. „ABC podejmowania działalności gospodarczej”** zorganizowane zostały we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział Chorzów, Krajową Administracją Skarbową, Krajową Izbą Doradców Podatkowych Oddział Śląski.
- **Druga edycja konkursu „Kopalnia Start-upów”**.
- **IV edycja spotkania pn. „Dzień Kobiet Przedsiębiorczych”**, które zorganizowane zostało we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział Chorzów.
- **„Business Lab”** - cykl 6 spotkań szkoleniowo-networkingowych Spotkania „Business Lab” mają na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców Katowic.
- Działanie **„Showroomu Innowacji IoT”** w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink we współpracy z Polskim Klastrem Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji SINOTAIC działa Showroom Innowacji IoT.
- **Udział w spotkaniach z cyklu Silesia Connect** . W 2022 roku odbył się 5 spotkań z cyklu Silesia Connect. Podczas spotkań Miasto Katowice prezentowało m.in. ofertę Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink przy tzw. demo table.
- **Spotkania Śląskiego Klastra Nano** organizowane przez koordynatora klastra – Fundację NANONET.
- **Katowice Energy Innovation Challenge** przygotowany z okazji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach międzynarodowy konkurs dla start-upów, które mogły zaoferować rozwiązania związane z transformacją energetyczną i smart city dla Katowic.
- **Międzynarodowy Program Akceleracyjny** – program akceleracyjny dla laureatów Katowice Energy Innovation Challenge, start-upa wyłonionego w ścieżce miast partnerskich oraz miast zrzeszonych w Międzynarodowym Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz laureatów dwóch edycji konkursu „Kopalnia Start-upów”.
- Organizacja **Strefy Innowacji WUF** w ramach Światowego Forum Miejskiego – Strefa Innowacji była jedną z 11 stref tematycznych podczas Światowego Forum Miejskiego. Strefa została zorganizowana w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink.
- Inauguracja współpracy z **Center for Digital Innovation – C4DI** z Wielkiej Brytanii. W ramach pilotażu do końca 2022 roku w Wielkiej Brytanii rozmowy z partnerami podjęły 3 spółki z Katowic.
- Emisja pilotażowego odcinka **„Podcast by Rawa.Ink”** - autorski program przygotowywany z gośćmi i partnerami Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink. .
- **Miasto Katowice wzięło udział w EXPO Real w Monachium - Targi Inwestycji i Nieruchomości**. Katowice prezentowały się na wspólnym stoisku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i GZM. Podczas wydarzenia przedstawiciele WOI odbyli szereg spotkań z inwestorami realizującymi bądź planującymi rozpoczęcie inwestycji w Katowicach.
- **Organizacja wydarzeń w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w siedzibie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink**.
- Organizacja **Katowickiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorcy** we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą.
- **Konferencja Rynek Mieszkaniowy** - w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w odbyła się konferencja pt. „Warto zamieszkać w Katowicach”, poświęcona katowickiemu rynkowi nieruchomości mieszkaniowych.
- Firma Orange Polska zorganizowała konferencję **Re-aktywacja Nieruchomości**. Wydarzenie powstało we współpracy z Miastem Katowice.

- Organizacja pierwszej edycji konferencji **Gamingowe Katowice** stworzonej w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink. W trakcie konferencji zorganizowana została również prezentacja pokazująca plany na utworzenie Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego.
- III edycja Konkursu pn. „**Katowizje – firma społecznie odpowiedzialna**”. W 2022 r. wyróżnione zostały dwa projekty, które otrzymały Nagrodę Prezydenta Miasta oraz tytuł firmy społecznie odpowiedzialnej i nagrodę finansową.

W 2023 roku m.in.:

- **Kontynuacja funkcjonowania Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink przy ul. Teatralnej 17a w Katowicach.**
- Prowadzenie serwisu internetowego: **www.rawaink.katowice.eu**.
- Promocja inwestycyjna poprzez wykorzystanie strony **www.invest.katowice.eu**.
- Promocja inwestycyjna poprzez wykorzystanie **profilu LinkedIn**.
- **Współpraca z instytucjami okołobiznesowymi** tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera), Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. i Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. **przy promocji miejskiej oferty inwestycyjnej.**
- **Emisja „Podcast by Rawa.Ink”.**
- **Udział w projekcie Standardy Obsługi Inwestora w samorządzie** - projekt organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w partnerstwie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.
- **Działanie „Showroomu Innowacji IoT”.**
- **Organizacja wydarzeń we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział Katowice.**
- **Szkolenia pn. „ABC podejmowania działalności gospodarczej”** (21.02, 12.10) zorganizowane zostały we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział Chorzów, Kancelarią KTW.Legal oraz Krajową Izbą Doradców Podatkowych Oddział Śląski.
- Kontynuacja dotychczasowych działań we współpracy z **Fundacją Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet**.
- Realizacja programu **Katowice Miastem Fachowców**.
- **Trzecia edycja konkursu „Kopalnia Start-upów”.**
- **V edycja spotkania pn. „Dzień Kobiet Przedsiębiorczych”,** które zorganizowane zostało we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział Chorzów.
- **Business Lab”** - cykl 5 spotkań szkoleniowo-networkingowych.
- **Organizacja wydarzeń we współpracy z Business Centre Club Łoża Katowicka.**
- **Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Miastem Katowice.**
- **Bootcamp dla finalistów III edycji konkursu "Kopalnia Start-upów".**
- **Wydarzenie pn. „Wspieramy Mamy: Praca-Biznes-Rodzina”** - zorganizowany we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie oraz Fundacją Sama Mama.
- **Finał konkursu „Kopalnia Start-upów”.**
- IV edycja Konkursu pn. „**Katowizje – firma społecznie odpowiedzialna**”.
- **Organizacja wydarzeń w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w siedzibie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink:**
- „**Innowacje w bitach. Graj, Koduj, Łącz!**” - pilotaż nowego projektu.
- Organizacja II edycji konferencji pn. „**Gamingowe Katowice**”.
- **Organizacja oraz obsługa stoiska Miasta Katowice podczas Śląskiego Festiwalu Nauki.**

6. Działania w zakresie pomocy społecznej oraz programów adresowanych do osób, grup zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmujące programy z zakresu polityki społecznej, realizowane przez MOPS

6.1. Program „Aktywni Seniorzy” - w związku z uruchomieniem Programu Katowicka Karta Mieszkańca w 2021 r. zakończono wydawanie kart programu.

6.2. Program „Katowicki Senior w Mieście” – skierowany jest do seniorów miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia. Jego celem jest podniesienie oraz poprawa jakości życia mieszkańców miasta Katowice, poprzez zapewnienie tym osobom odpowiednich form wsparcia.

W ramach ww. programu w 2022 roku realizowano następujące działania oraz inicjatywy we współpracy z m.in. MOPS, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, organizacjami pozarządowymi, a także podmiotami wykonującymi działalność leczniczą:

- 811 osób skorzystało z usług ośrodków wsparcia, tj. z Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, mieszkań chronionych;
- ok. 1000 seniorów uczestniczyło poszczególnych propozycjach kulturalnych w ramach biesiad senioralnych pn. „Katowicka Senioriada”;
- 196 osób uczęszczało do 5 klubów seniora prowadzonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki
- 2953 seniorów skorzystało z oferty zajęć sportowych, tj. m.in. z bezpłatnych zajęć – gimnastyki, fit-ballu, pilatesu, zajęć ogólnorozwojowych, nordic walking, tańców latynoamerykańskich, jogi, treningu zdrowych pleców, aqua aerobiku oraz wielu innych zajęć;
- szczepieniami przeciwko grypie w roku 2022 objęto łącznie 2 856 seniorów, z tego: 272 w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie Katowic oraz 15 w domu (osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym);
- 240 seniorów objęto programem profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku;
- 653 seniorów wzięło udział w zajęciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W okresie świątecznym 360 seniorów otrzymało paczki świąteczne, a ok. 1800 seniorów wzięło udział w spotkaniu wigilijnym.

W 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zrealizował szereg zadań i programów mających na celu wsparcie na rzecz osób w wieku senioralnym. W ramach działań na rzecz aktywizacji osób w wieku senioralnym w Katowicach w 2023 roku zrealizowano:

- 76 spotkań w ramach klubu społecznościowego „Senior w działaniu”,
- 8 spotkań w ramach cyklu „Senior w podróży,
- 42 spotkania w ramach klubu społecznościowego „Senior w ruchu”,
- 48 godzin zegarowych zajęć i warsztatów ukierunkowanych na aktywizację społeczną osób w wieku senioralnym zamieszkujących dzielnicę Nikiszowiec-Janów.

6.3. Program „Nas Troje i więcej” – w związku z uruchomieniem Programu Katowicka Karta Mieszkańca w 2021 r. zakończono wydawanie kart programu.

6.4. Program „Babcia, dziadek i ja w Katowicach” - w związku z uruchomieniem Programu Katowicka Karta Mieszkańca w 2021 r. zakończono wydawanie kart programu.

6.5. Program „Katowicka Karta Mieszkańca” – wprowadzony na podstawie uchwały nr XXIII/556/20 Rady Miasta Katowice z dnia 7.09.2020 r. (zmieniona uchwałą nr XL/870/21 z dnia 28.10.2021 r.), stanowi ważny element polityki promocyjnej i społecznej. Karta umożliwia mieszkańcom m.in. korzystanie ze zniżek na usługi instytucji kultury, sportu i rekreacji. W 2022 r. w programie brało udział 13 jednostek miejskich i 103

partnerów prywatnych. Na koniec 2022 r. zarejestrowanych było w sumie **33 070** kart, a na koniec roku 2022 skumulowana liczba wydanych kart wyniosła **96 658**. W 2023 r. w programie brało udział 12 jednostek miejskich i 120 partnerów prywatnych. Na koniec 2022 r. zarejestrowanych było w sumie **26 290** kart, a na koniec roku 2023 skumulowana liczba wydanych kart wyniosła **122 948**.

- 7. Działania w zakresie rynku pracy i aktywizacji zawodowej prowadzone przez PUP⁴², realizowane w ramach:** Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2027, Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030”, Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2026 - Katowice bez barier, projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zadań ustawowych urzędu i przedsięwzięć pozaustawowych.

W 2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach zarejestrowanych było ogółem 3071 osób bezrobotnych, w tym 1572 kobiet, a w 2023 r. było ogółem 2162 osób bezrobotnych, w tym 1111 kobiet.

- 7.1. Miejska Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2022-2027; cel strategiczny „Rynek pracy otwarty dla każdego”:**

- a. w zakresie realizacji wspólnych działań instytucji sektora publicznego, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych Powiatowy Urząd Pracy współpracował z różnymi podmiotami rynku pracy, w szczególności z pracodawcami lokalnego rynku pracy, agencjami zatrudnienia, instytucjami szkoleniowymi, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Wydziałem Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice oraz Miejskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Rawa.Ink, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, Izłą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Regionalną Izłą Gospodarczą, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Komendą Miejską Policji w Katowicach, Fundacją Adra Polska.

W ramach kontynuacji realizowanych przedsięwzięć PUP w Katowicach organizował w 2022 i 2023 r. spotkania z pracodawcami w ramach giełd pracy, spotkań informacyjnych nt. sytuacji na rynku pracy, oferowanych form wsparcia oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców. W dyspozycji urzędu w roku 2022 pozostawało 11506 ofert pracy, w tym subsydiowanych 729, dla cudzoziemców 5111 oraz dla osób z niepełnosprawnością – 362. W 2023 r. w dyspozycji urzędu pozostawało 11773 ofert pracy, w tym subsydiowanych 556, dla cudzoziemców 4901 oraz dla osób z niepełnosprawnością – 323.

Liczba kontaktów nawiązanych i utrzymanych z pracodawcami z terenu działania urzędu pracy w 2022 r. wyniosła 2341, a w 2023 r. 2148. W 2022 r. i 2023 r. nadal działał „Inkubator zawodowej aktywizacji seniorów”, którego głównym celem jest pomoc seniorom – kobietom 60+ oraz mężczyznom 65+ - w powrocie na rynek pracy, podniesienie poziomu życia mieszkańców Katowic w wieku senioralnym oraz zaspokojenie potrzeb kadrowych lokalnych przedsiębiorców.

- b. w zakresie doskonalenia systemu współpracy instytucji i organizacji wspierających adaptację zawodową urząd pracy w roku 2022 i 2023 finansował koszty kształcenia ustawicznego osób pracujących w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ściśle współpracując z pracodawcami lokalnego rynku pracy w celu wzmocnienia kompetencji zawodowych pracowników

⁴² Powiatowy Urząd Pracy w realizacji swoich działań kierował się zasadą równości w dostępie do świadczonych usług, o której mowa jest w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Wobec powyższego były one skierowane do wszystkich zarejestrowanych osób bez względu na ich miejsce zamieszkania lub pobytu.

- c. w 2022 r. w zakresie wspierania działań sprzyjających rozwojowi usług i instrumentów rynku pracy w mieście, w tym przy wykorzystaniu środków unijnych, w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) urząd realizował Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu urząd w 2022 r. objął wsparciem 140 osób bezrobotnych.
- W 2023 r. w zakresie wspierania działań sprzyjających rozwojowi usług i instrumentów rynku pracy w mieście, w tym przy wykorzystaniu środków unijnych, w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych urząd realizował Projekt niekonkurencyjny pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet FESL.05.00 – Fundusze Europejskie dla rynku pracy, Działanie FESL.05.01 – Aktywizacja zawodowa poprzez PUP. W ramach projektu urząd w 2023 r. objął wsparciem 131 osób bezrobotnych.
- d. w zakresie wspierania osób planujących założyć własną działalność gospodarczą urząd podejmował w 2022 r. działania związane z promocją przedsiębiorczości i samozatrudnienia na lokalnym rynku pracy poprzez: przyznanie jednorazowo środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej dla 192 osób, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 20 skierowanych bezrobotnych, w tym dla 18 osób w ramach środków Funduszu Pracy oraz 2 osób w ramach środków PFRON. W 2023 r. przyznano jednorazowo środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej dla 175 osób, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 15 skierowanych bezrobotnych, w tym dla 12 osób w ramach środków Funduszu Pracy oraz 3 osób w ramach środków PFRON.
- e. w zakresie diagnozowania zasobów, potrzeb i problemów związanych z bezrobociem na terenie miasta PUP Katowice zlecił opracowanie w 2022 roku raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych; monitoring to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego
- f. w zakresie tworzenia nowych i rozwijania istniejących przedsięwzięć, projektów i programów nakierowanych na zwiększenie szans na rynku pracy, w szczególności osób w trudnej sytuacji życiowej urząd pracy w 2022 r. i 2023 r. podejmował działania ukierunkowane na zapobieganie długotrwałemu bezrobociu, aktywizację zawodową grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Działania realizowane były w szczególności w ramach następujących programów: staży u pracodawców, prac interwencyjnych, robót publicznych, szkoleń, refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, przyznania zarejestrowanym osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, realizacji bonów zatrudnieniowych dla osób do 30 roku życia.

Urząd realizował w 2022 r. **Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)” Działanie 7.2 RPO WSL.** Grupę docelową projektu stanowiły osoby powyżej 30 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane jako bezrobotne, należące do co najmniej jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne (tj. nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy), osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie na poziomie podstawowym, średnim I stopnia oraz

ponadgimnazjalnym). Osoby zarejestrowane otrzymały również wsparcie w ramach usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych przez urząd pracy. W ramach w/wym. projektu urząd pracy wsparciem objął 108 osób bezrobotnych.

W wyniku zrealizowanych przez urząd działań w zakresie aktywizacji zawodowej zarejestrowanych osób z wykorzystaniem wymienionych programów, projektu i opisanych powyżej przedsięwzięć pozaustawowych oraz w wyniku samodzielnych działań podjętych przez osoby bezrobotne, liczba podjęć pracy w 2022 r. wyniosła 3129.

Na potrzeby opracowania prognozy zapotrzebowania na zawody i specjalności Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Wydziałem Obsługi Inwestorów UM Katowice, przedstawicielami Głównego Urzędu Statystycznego oraz przedstawicielem Business Center Club uczestniczył w przygotowaniu Barometru zawodów na rok 2023 na terenie Miasta Katowice.

Celem zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki urząd pracy sfinansował koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na koniec grudnia 2022 r. kwota poniesionych wydatków w ramach środków z KFS wyniosła 1 675 000,00 zł. Kształceniem ustawicznym sfinansowanym ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostało w 2022 roku objętych ogółem 506 osób pracujących (pracowników oraz pracodawców).

Urząd realizował w 2023 r. Projekt niekonkurencyjny pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)” Działanie FESL.05.01. Grupę docelową projektu stanowiły osoby bezrobotne, w szczególności znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej), osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby młode w wieku 18 – 29 lat, zwłaszcza z grupy NEET, samotnie wychowujący dzieci, opuszczające pieczę zastępczą, pochodzenia migranckiego. Osoby zarejestrowane otrzymały również wsparcie w ramach usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych przez urząd pracy. W ramach ww. projektu urząd pracy wsparciem objął 131 osób bezrobotnych.

W wyniku zrealizowanych przez urząd działań w zakresie aktywizacji zawodowej zarejestrowanych osób z wykorzystaniem wymienionych programów, projektu i opisanych powyżej przedsięwzięć pozaustawowych oraz w wyniku samodzielnych działań podjętych przez osoby bezrobotne, liczba podjęć pracy w 2023 r. wyniosła 2682.

Na potrzeby opracowania prognozy zapotrzebowania na zawody i specjalności Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Wydziałem Obsługi Inwestorów UM Katowice oraz przedstawicielami Głównego Urzędu Statystycznego uczestniczył w przygotowaniu Barometru zawodów na rok 2024 na terenie Miasta Katowice.

Celem zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki urząd pracy sfinansował koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na koniec grudnia 2023 r. kwota poniesionych wydatków w ramach środków z KFS wyniosła 2 500 000 zł. Kształceniem ustawicznym

sfinansowanym ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostało w 2023 roku objętych ogółem 464 osób pracujących (pracowników oraz pracodawców).

- g. w zakresie wzmacniania aktywności osób z niepełnosprawnością w poruszaniu się po rynku pracy urząd realizował w 2022 r. i 2023 r. Program działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w ramach „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2022-2026 – Katowice bez barier” oraz wspierał pracodawców z obszaru lokalnego rynku pracy poprzez finansowanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy utworzonych dla osób z niepełnosprawnością. Źródłem finansowania wskazanych działań urzędu były środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- h. w zakresie zwiększenia dostępności instrumentów rynku pracy dla osób poszukujących zatrudnienia oraz wzrostu ich potencjału adaptacyjnego w sferze społeczno-zawodowej liczba bezrobotnych objętych instrumentami rynku pracy w ramach subsydiowanego zatrudnienia, finansowanych ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosła ogółem 1044 osób w 2022 r. oraz 1047 osób w 2023 r.

7.2. W obszarze przedsięwzięcia strategicznego „Rewitalizacja obszarów przemysłowych oraz miejskich, na których zidentyfikowano występowanie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych” ujętego w Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030” Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zrealizował następujące działania:

- a. w zakresie powstania nowych podmiotów w ramach udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2022 r. udzielono 123 dotacji osobom do 34 roku życia, utworzone zostały 192 nowe podmioty oraz 18 miejsc pracy w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowisk pracy. W 2023 r. udzielono 94 dotacji osobom do 34 roku życia, utworzone zostały 175 nowe podmioty oraz 12 miejsc pracy w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowisk pracy.

Środki w 2022 r. pochodziły z następujących źródeł: Fundusz Pracy, PO WER, Poddziałanie 1.1.1 (projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III i IV)”), RPO WSL Działanie 7.2 (projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)”). W 2023 r. środki pochodziły z: Funduszu Pracy, Działanie FESL.05.01 (projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)”).

Łącznie wydatki poniesione na wypłatę jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej wyniosły w 2022 r. 5 880 681 zł, a w 2023 r. 5 942 293 zł.

- b. w zakresie utworzenia miejsc pracy w ramach udzielonych kosztów doposażenia stanowisk pracy na podstawie umów zawartych z pracodawcami urząd w 2022 r. dokonał refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 18 stanowisk pracy na łączną kwotę 565 412,24 zł w 2022 roku finansowanych ze środków Funduszu Pracy. W 2023 r. urząd w ramach umów z pracodawcami dokonał refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 12 stanowisk pracy na łączną kwotę 399 075,40 zł, finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

7.3. „Miejski Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2022-2026– Katowice bez barier”- działania w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych:

- a. w zakresie Projektu „Pośrednictwo pracy” skorzystało w 2022 r. ogółem 1198 zarejestrowanych osób, a w 2023 r. skorzystało ogółem 2724 osób, łącznie w wyniku realizacji zadań zaplanowanych w ramach Projektu

pracę podjęto w 2022 r. 188 osoby z niepełnosprawnościami, a w 2023 r. 174 osób z niepełnosprawnościami. Źródłem finansowania zadań był Fundusz Pracy, Europejski Fundusz Społeczny oraz PFRON.

- b. w zakresie Projektu „Poradnictwo zawodowe” usługami poradnictwa zawodowego objęto w 2022 r. 18 osób, a w 2023 r. 23 osoby niepełnosprawne.
- c. w zakresie Projektu „Instrumenty rynku pracy” w okresie sprawozdawczym przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz dokonano w 2022 r. refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla 1 osoby niepełnosprawnej, a w 2023 r. dofinansowano 3 stanowiska pracy.

8. Działania w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego

8.1. Projekt KATOobywatel – realizowany od wiosny 2018 roku, to projekt dający mieszkańcom szansę bezpośredniego wpływu na ich najbliższe otoczenie i dbania o wspólną przestrzeń. Jego celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wiarygodnego dialogu między samorządem a otoczeniem, pobudzanie aktywności lokalnej, która prowadzi do realnej zmiany. Projekt obejmuje m.in. aplikacje, akcje społeczne i kampanie; towarzyszą mu witryna internetowa <http://katoobywatel.katowice.eu/>, oraz profil na portalu społecznościowym. Podstawą jego działania są szerokie partnerstwa oraz wykorzystanie innowacji technologicznych i społecznych, takich jak:

- a. aplikacja **Naprawmyto.pl** – piąty rok działania aplikacji NaprawmyTo.pl zakończyliśmy z wynikiem ponad 25 tysięcy rozwiązanych problemów, które zostały zgłoszone przez mieszkańców w trzech kategoriach: infrastruktura, zieleń i bezpieczeństwo. Od skuteczności nie mniej ważna jest tu możliwość śledzenia czy komentowania zgłoszonych spraw i proponowania rozwiązań, a także bezpośredni kontakt między mieszkańcami a urzędnikami.
- b. aplikacja **wCOP drzewo**, dająca możliwość wskazywania miejsca nasadzeń nowych drzew w mieście. W 2022 r. nasadzono 28 drzew, a w 2023 r. 75 drzew.
- c. akcja **SprzątaMy Dzielnice**, w ramach której mieszkańcy nie tylko wskazują tereny, ale też głosują na te najbardziej zaśmiecone, a następnie sprzątają je wspólnie z wolontariuszami organizacji pozarządowej i przy wsparciu miejskich służb. W 2022 roku odbyły się dwie edycje specjalne. W maju zorganizowano Subotnik ukraińsko – polski, czyli akcję sprzątania Ligoty wspólnie z obywatelami Ukrainy, mieszkającymi w Katowicach. We wrześniu, w ramach Tygodnia Mobilności Miejskiej, zorganizowano Plogging na Kole, czyli rowerowe sprzątanie Borek z udziałem katowickich firm. Partnerem akcji było Stowarzyszenie Wolnej Herbaty, zaangażowali się też lokalni mieszkańcy i aktywiści. Jak zawsze podczas akcji promowane były ekologiczne postawy, związane z segregowaniem śmieci czy piciem wody z kranu w ramach kampanii **„Kranówka katowicka. Szluknij się z kokotka”**.
- d. Przedszkolaki z Katowic uczą się wymieniać rzeczami dzięki projektowi **„Nie używasz? Wymień się!”**. Akcja wpisuje się w ideę gospodarki cyrkularnej, polegającej na minimalizowaniu produkcji odpadów. Początek akcji zbiegł się z trwającym w Katowicach Światowym Forum Miejskim (WUF 11), poświęconym politykom miejskim i 17 celom zrównoważonego rozwoju. W ramach akcji powstało dziesięć prototypowych wymienników, które zaprojektowała i wykonała Fundacja Bobrowe Żeremia, a złożyć je pomogły dzieci z dziesięciu przedszkoli biorących udział w projekcie. Akcji towarzyszyły warsztaty, a doświadczenie posłużyło do stworzenia poradnika wymieniać się dla innych przedszkoli.
- e. W Katowicach powstało już kilkanaście ogrodów społecznych m.in. 9 w ramach akcji **„ZróbMy sobie grządki”**, a zainteresowanie miejskim ogrodnictwem wciąż rośnie. Dlatego, żeby wspierać istniejące ogrody ale również rozwijać ten trend w mieście, ruszyliśmy ze Szkołą Ogrodników. To m.in. cykl comiesięcznych spotkań warsztatowo – edukacyjnych, porad on – line w grupie KATOogrodnicy na Facebooku i spotkań w

terenie tzw. „Lotna Szkoła Ogrodników”, które mają rozwijać wiedzę ogrodniczą, ale przede wszystkim zachęcają do zaangażowania i integracji.

- f. Na Facebooku działa moderowana przez miasto grupa **„KATOogrodników”**, która służy kontaktowi, wymianie doświadczeń i promocji miejskiego ogrodnictwa. Aktywna partycypacja mieszkańców w tworzenie ogrodów ma nie tylko wymiar ekologiczny, ale też społeczny: wpływa na integrację i zdrowie lokalnej społeczności.
- g. Miasto, szeregiem rowerowych inicjatyw, zachęca żeby **„Przeciepnąć sie na koło”**. Kampania wystartowała przy okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności w dniach od 16 do 22 września 2022 roku w Katowicach. Projekt zachęca do wzięcia udziału poprzez ideę, że w jeździe po mieście mniej ważna jest kondycja, sprzęt czy strój, a bardziej nastawienie. W ramach wydarzenia odbyły się m.in. warsztaty z naprawy rowerów, rowerowe zwiedzanie szlaku murali (Jazda szlakiem murali), rowerowe sprzątanie Borek z firmami (Plogging na rowerach) i przejazd „Gwiazdy na kole” w Dniu bez samochodu. Katowiccy urzędnicy zaangażowali się w kampanię i stali się ambasadorami rowerowymi miasta.
- h. W 2022 r. dwa grudniowe weekendy był organizowany z partnerami **Świąteczny Warsztat Cyrkularny**, prototyp warsztatu miejskiego i miejsce edukacji o świętach w duchu zero waste. Zaadoptowano do tego celu przestrzeń Kato Urban Corner, stworzoną z okazji Światowego Forum Miejskiego na rogu ulic Pocztowej i Młyńskiej. W godzinach trwania wydarzenia mieszkańcy mogli skorzystać z porad dotyczących odnawiania mebli i zapoznać się z działaniem prostych narzędzi stolarskich.
- i. W 2022 r. Katowice po raz pierwszy przystąpiły do rywalizacji o tytuł **Rowerowej Stolicy Polski**, zainaugurowanej przez Bydgoszcz. Oficjalny trening, który trwał od 21 marca do 21 maja, zakończyliśmy na 8 miejscu na 61 miast prezydenckich. W sumie wykręcono blisko 117 tys. km. w dwa miesiące! W rywalizacji głównej w czerwcu ponad 600 mieszkańców wykręciło 137,299 km. We wspólną zabawę zaangażowali się m.in. urzędnicy, pracownicy firm i instytucji, uczniowie, studenci, dziennikarze, radni i aktywne grupy dzielnicowe.

9. Działania promocyjne w zakresie promocji turystyki biznesowej⁴³

Turystyka biznesowa w Katowicach stanowi istotny produkt miasta, który oddziałuje na różne sfery życia gospodarczego i społecznego oraz jest kluczowym elementem promocji Katowic zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych.

Okres pandemii SARS CoV-2 zatrzymał całkowicie funkcjonowanie i rozwój przemysłu spotkań. Od początku roku 2019 wprowadzane były przepisy umożliwiające realizację usług na rynku wydarzeń jednak z dużymi rygorami bezpieczeństwa uczestników spotkań. Dopiero 1-go marca 2022 r. zostały zniesione wszystkie restrykcje dotyczące działalności turystyce, w tym także hoteli. Do tego zawirowania gospodarczego powodowanego różnymi zmieniającymi się regulacjami krajowymi w zakresie przeciwdziałania pandemii Covid-19 należy dołączyć także zmienne, niespójne przepisy międzynarodowe. Te czynniki zdecydowanie utrudniały organizację wydarzeń biznesowych i spotkań konferencyjnych.

W 2022 r., gdy wiele podmiotów funkcjonujących na rynku wydarzeń liczyło na zdecydowane przełamanie negatywnych trendów, Rosja najechała zbrojnie Ukrainę, a zachodzące następnie zmiany w gospodarce Polski i na świecie są do dzisiaj w wielu przypadkach trudne do przewidzenia.

⁴³ Opracowano na podstawie dokumentów „Raport. Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w latach 2020-2022”, dr Krzysztof Cieślowski, luty 2023 oraz „Raport. Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w roku 2023”, dr Krzysztof Cieślowski, luty 2024.

Pomimo takiej kumulacji różnych negatywnych czynników wpływających na rynek wydarzeń liczba odnotowanych spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych w Katowicach w 2022 r. osiągnęła poziom 6 426 spotkań (w roku 2020 było to 2 033, a w 2021 r. - 2 465). Oznacza to stopniowy powrót do roku 2019, gdy odnotowano w mieście 6 453 wydarzenia biznesowe. Jednak liczba uczestników wydarzeń biznesowych odnotowanych w 2022 wyniosła 552 849 osób i jest w Katowicach zdecydowanie mniejsza niż przed pandemią, gdy przekroczyła 1 mln uczestników spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych w Katowicach.

W 2023 r. to okres rozwoju popytu na rynku wydarzeń w Polsce, przy zachodzących zmianach politycznych i gospodarczych, presji inflacyjnej, zmianach powodowanych także dalszą agresją Rosji na Ukrainę. Pomimo kumulacji różnych negatywnych czynników wpływających na stabilność rozwoju gospodarki na świecie i w Polsce, rynek wydarzeń - liczba odnotowanych spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych w Katowicach osiągnęła poziom 6 451. Wynik ten jest zbliżony do roku 2022. Natomiast całkowita kwota wydatków uczestników wydarzeń biznesowych i spotkań konferencyjnych w Katowicach wyniosła w 2023 r. ponad 236 mln zł.

4. Podsumowanie

Na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w Programie Rewitalizacji przewidziano realizację łącznie **171 projektów**. W liczbie tej zawierają się projekty miejskie, w zakres których wchodzi zadania przeznaczone do realizacji w kilku podobszarach jednocześnie tj.:

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13,13a (Śródmieście), ul. J. Zarębskiego 5a, 7a (Załęże) i ul. Ks. Bpa H. Bednorza 14 (Szopienice-Burowiec) – poz. 56,
2. Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent twardy i miękki) realizowany w 2 lokalizacjach: ul. Uniwersytecka 15 (podobszar Śródmieście) i ul. Marcinkowskiego 13 (podobszar Zawodzie) – poz. 57,
3. Modernizacja budynków komunalnych - realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów – Nikiszowiec – poz. 58,
4. Budownictwo mieszkaniowe-komunalne (ul. Kordeckiego 3, 4, ul. Obr. Westerplatte 42-50) - realizowany w dwóch lokalizacjach: podobszar Śródmieście i Szopienice – Burowiec – poz. 59,
5. Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji – realizowany w 4 lokalizacjach: podobszar Śródmieście, Zawodzie, Załęże i Szopienice – Burowiec – poz. 60,
6. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Ludwika Zamenhofs 36-38, 36a-38a, 36b-38b - realizowany w podobszarach: Załęże (ul. Wolnego 8) i Szopienice – Burowiec (ul. Zamenhofs 36-38, 36a-38a, 36b-38b) – poz. 91,

- oznaczone w Zał. 1 do LPR: uchwała nr XLVII/1043/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. - jako pojedyncze pozycje; oraz projekty realizowane w ramach obszaru zdegradowanego, na terenie jednostek pomocniczych, dla których w LPR wyznaczono jedynie podobszary występowania problemów przestrzennych:

7. Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach) – poz. 163,
8. Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach) – poz. 164,
9. Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb – poz. 170.

Ponadto projekt w pozycji 57 realizowany był w ramach odrębnych etapów. Stąd, zliczając projekty **ich łączna suma w sprawozdaniu wyniosła 172 pozycje.**

Pod względem finansowym wartość szacunkowa według sprawozdania z realizacji LPR za lata 2022-2023 wyniosła łącznie 1,426 mld zł. Wartość wykonania w 2022 r. miejskich i zewnętrznych projektów podstawowych wyniosła 98 mln zł, a w 2023 r. 134 mln zł. W ramach podsumowania wartości szacunkowej zadań w Sprawozdaniu, nie włączono szacowanej wartości przedsięwzięć, co do których wydatków nie poniesiono i równocześnie podjęto decyzję o przeniesieniu rozpoczęcia realizacji poza okres obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Pozyskanie pełnej informacji sprawozdawczej w zakresie ujętych w LPR projektów pozamiejskich, jest utrudnione z uwagi na fakt nie odsyłania kart monitoringowych przez niektóre podmioty zewnętrzne.

Analizując liczbę wszystkich projektów ujętych na liście podstawowej (zakończone, planowane, realizowane) w relacji do liczby mieszkańców (na 1000 mieszkańców) największą liczbą projektów charakteryzują się kolejno: **Szopienice – Burowiec, Śródmieście, a następnie Zawodzie.** Najmniejszą ogólną liczbą projektów na 1000 mieszkańców cechuje się obszar Bogucice.

Analizując wyłącznie grupę projektów **zakończonych oraz w trakcie realizacji** w relacji do liczby mieszkańców, największą wartością charakteryzują się: **Załęże i Szopienice-Burowiec.** W **Śródmieściu**, odnotowano jednocześnie relatywnie dużą liczbę projektów o statusie: planowany do realizacji. Poziom aktywności w wymienionych obszarach świadczy o dużych potrzebach rewitalizacyjnych tych obszarów oraz znaczącej dynamice pozytywnych zmian w nich zachodzących.

Dominującym typem działań w całym obszarze rewitalizacji (podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym) są **działania o charakterze infrastrukturalno – środowiskowym.** Spośród podobszarów miejskich, najbardziej znaczący ich stosunek do ogólnej liczby projektów widoczny jest w Śródmieściu oraz Szopienicach-Burowcu. Stosunkowa równowaga w udziale przedsięwzięć o charakterze miękkim i twardym zachowana jest w: Bogucicach oraz w podobszarze Kolonia Alfred.

Wartym podkreślenia jest fakt systemowego działania na rzecz integracji społecznej oraz podniesienia poziomu aktywności mieszkańców poprzez realizowane przez MOPS działania **w każdym z miejskich podobszarów** w ramach tworzonych Centrów Aktywności Lokalnej i Centrów Społecznościowych. Działania o charakterze gospodarczo – technologicznym zaplanowano w Śródmieściu i podobszarze występowania problemów przestrzennych: Dąb – Baidona. Niemniej jednak, wymiar gospodarczo-technologiczny wymaga dalszego zaangażowania miasta i aktywności podmiotów zewnętrznych.

Bardzo istotny wpływ na zmianę, w podobszarach rewitalizacji, wywierają także projekty „oddolne”, najczęściej formułowane i zgłaszane w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego, Budżetu Zielonego czy Inicjatywy Lokalnej. Dotyczą one zarówno zmian widocznych w przestrzeni, jak i skutkujących większym poziomem integracji społecznej.

Podsumowując stan realizacji projektów 115 projektów (62%) zostało zakończonych, 27 projektów (14%) znajduje się w trakcie realizacji, 22 projektów (12%) jest planowanych do realizacji, w zakresie 16 projektów (9%) podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji, w przypadku 5 projektów (3%) nie odesłano informacji sprawozdawczej.

Tabela 12 Podsumowanie

Podobszar	Liczba projektów			Stan realizacji projektów				
	Suma	miejskich	pozamiejskich	Zakończone	W trakcie realizacji	Planowane	Odstąpiono	b.d.
Śródmieście	68	46	22	36	16	9	3	4
Zawodzie	11	9	2	10	0	1	0	0
Załęże	15	13	2	12	0	0	3	0
Bogucice	10	8	2	6	4	0	0	0
Szopienice - Burowiec	40	25	15	24	5	4	6	1
Janów - Nikiszowiec	18	13	5	9	0	5	4	0
Zawodzie - Porcelanowa	1	0	1	0	1	0	0	0
Dąb –Baildona	7	4	3	5	0	2	0	0
Kolonia Alfred	4	2	2	4	0	0	0	0
Wełnowiec - Konduktorska	5	2	3	3	1	1	0	0
Szopienice – Woźniaka	0	0	0	0	0	0	0	0
Śródmieście - Raciborska	0	0	0	0	0	0	0	0
Horyzontalne	6	6	0	6	0	0	0	0
SUMA	185*	128	57	115	27	22	16	5
%	100%	69%	31%	62%	14%	12%	9%	3%

*suma uwzględnia jednostkowe lokalizacje projektów realizowanych wieloetapowo oraz w wielu dzielnicach (dot. poz. 56; 57; 58; 59; 60; 91; 100; 101; 163; 164; 170, dane wg stanu na 31.12.2023 i zgodnie z Zał. Nr 1 do LPR – uchwała nr XLVII/1043/22 z dnia 28.04.2022 r.)

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, **lokalny program rewitalizacji obowiązywał do końca 2023 r.** W celu kontynuacji procesu rewitalizacji oraz mając na względzie rozwój dotychczasowych działań, a także dostosowanie się do zmieniających się potrzeb i wyzwań planuje się opracowanie **gminnego programu rewitalizacji** na podstawie ustawy o rewitalizacji.

Spis tabel:

Tabela 1. Projekty podstawowe w podobszarze Śródmieście - wykonany zakres rzeczowy.....	5
Tabela 2. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - wykonany zakres rzeczowy.....	25
Tabela 3. Projekty podstawowe w podobszarze Załęże - wykonany zakres rzeczowy.....	31
Tabela 4. Projekty podstawowe w podobszarze Bogucice - wykonany zakres rzeczowy.....	37
Tabela 5. Projekty podstawowe w podobszarze Szopienice - Burowiec - wykonany zakres rzeczowy.....	43
Tabela 6. Projekty podstawowe w podobszarze Janów - Nikiszowiec - wykonany zakres rzeczowy	54
Tabela 7. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - Porcelanowa - wykonany zakres rzeczowy.....	60
Tabela 8. Projekty podstawowe w podobszarze Dąb - Baildona - wykonany zakres rzeczowy.....	63
Tabela 9. Projekty podstawowe w podobszarze Kolonia Alfred - wykonany zakres rzeczowy	65
Tabela 10. Projekty podstawowe w podobszarze Wełnowiec – Konduktorska - wykonany zakres rzeczowy.....	67
Tabela 11. Projekty podstawowe horyzontalne - wykonany zakres rzeczowy.....	72
Tabela 12 Podsumowanie	88

Załącznik nr 1. Szczegółowa informacja sprawozdawcza dot. zakończonych miejskich projektów podstawowych

W celu uzyskania bardziej czytelnej i szczegółowej prezentacji postępów realizacji miejskich projektów podstawowych, informację w tym zakresie przedstawiono w formie fiszek projektowych. W rozdziale ujęto wyłącznie fiszki projektów, których zakończenie nastąpiło do roku 2023. Kolejność oraz numeracja projektów jest zgodna z obowiązującym w roku 2023 załącznikiem do uchwały nr XLVII/1043/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023”.

KATOWICE, MIASTO OTWARTE – ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MOPS	2018 - 2020	UL. FRANCUSKA 43	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU Projekt adresowany do osób z niepełnosprawnością z terenu objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji. Zadania projektu obejmowały: animację lokalną, działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i integracyjnym, rozwój potencjału podmiotów działających w obszarze niepełnosprawności, wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społeczno – kulturalnym.			PODOBSZAR REWITALIZACJI ✓ ŚRÓDMIEŚCIE ZAWODZIE ZAŁĘŻE BOGUCICE SZOPIENICE-BUROWIEC JANÓW-NIKISZOWIEC
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY 2018 W ramach zadania pn. „Organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych” odbyły się: 3 spotkania z animatorami lokalnymi dla osób niepełnosprawnych, 2 spotkania grupy wsparcia dla osób samotnych z problemami komunikacyjnymi, 3 warsztaty oraz zajęcia rękodzieła. Zorganizowano również 6 spotkań „Klubu Podróżnika”, 6 spotkań „Dyskusyjnego klubu filmowego”, 2 spotkania „Klubu literackiego” oraz 14 zajęć sportowo – rekreacyjne. Odbył się również 5 dniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny do Wrocławia oraz dwa 5 - dniowe turnusy terapeutyczno-rehabilitacyjne do Murzasichla. Zatrudniono także specjalistę ds. zaradności życiowej, który udzielał indywidualnego wsparcia dorosłym osobom z autyzmem (w łącznej liczbie 235 godzin). W ramach zadania: Punkt Poradnictwa i Informacji od kwietnia 2018 roku funkcjonował punkt, w którym pracownik był w ciągłej dyspozycji dla osób odwiedzających i potrzebujących porad specjalistycznej. W ramach wsparcia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym zorganizowano 5 wyjść do kina, 2 wyjścia do muzeum, wyjście do kręgielni, wybrano się również na spektakl oraz do Filharmonii Śląskiej. Uczestnicy mieli również okazję wziąć udział w grze rozwijającej ich zdolności twórcze i komunikacyjne w Escape-Room. W ramach wsparcia realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych sfinansowano 12 inicjatyw oddolnych m.in.: inicjatywa oddolna Szkoły Podstawowej nr 6 na organizację Festynu Rodzinnego, inicjatywa oddolna uczestników projektu dotycząca utworzenia punktu bibliotecznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym zatrudniono brokera edukacyjnego, który przeprowadził spotkania z uczestnikami projektu, każda z tych osób uzyskała 6 godzin wsparcia indywidualnego. Zorganizowano 76 spotkań Integracyjnego Klubu Osób Niepełnosprawnych (IKON). W ramach działania Klubu IKON zorganizowano również 17 spotkań z dogoterapii. W ramach działań grup treningowo – wspierających uzupełniających ofertę wsparcia osób niepełnosprawnych przeprowadzono trening zaradności codziennej – każda osoba biorąca udział w treningu uzyskała 144 godzin wsparcia. Prowadzono również treningi umiejętności społecznych – TUS mające na celu nabycie umiejętności życia codziennego. Zorganizowano ponadto 20 spotkań grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. W okresie marzec – grudzień 2018 roku trener pracy wspierał osoby niepełnosprawne w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia. W ramach wsparcia otoczenia osób niepełnosprawnych przeprowadzono 16 spotkań. Ponadto zorganizowano warsztaty: „Zdrowy kręgosłup”, „Radzenie sobie ze stresem – terapia dźwiękiem”, „Biofeedback” oraz 4 warsztaty EKO – art w nurcie „zero waste”. Zorganizowano również 9 spotkań z fizjoterapeutą. 2019 W ramach zadania pn. „Organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych” odbyło się: 9 spotkań w ramach warsztatów komunikacji, 6 warsztatów upcyklingowych, 3 spotkania „Klubu wolontariusza”, 35 spotkań „Klubu gracza”, 22 spotkania „Dyskusyjnego klubu filmowego”, 3 spotkania „Music Discussion Club”, 15 spotkań „Klubu literackiego”, 3 spotkania „Klubu ekonomicznego”, 4 spotkania „Klubu podróżnika”, 4 spotkania „Klubu teatralnego”, 4 spotkania „Klubu Aktywności Ekonomicznej”, 15 spotkań relaksacyjnych, 5 warsztatów prowadzonych przez wolontariuszy, 38 zajęć sportowo – rekreacyjne. Zorganizowano również maskowy bal karnawałowy oraz 6 – dniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny do Kłodzka i dwa 5 – dniowe wyjazdy terapeutyczno-rehabilitacyjne do Zakopanego. W ramach projektu zaangażowano specjalistę ds. zaradności życiowej, który udzielał indywidualnego wsparcia 4 dorosłym osobom z autyzmem w celu poprawy ich funkcjonowania (w łącznej liczbie 309h).			

W ramach zadania Punkt Poradnictwa i Informacji świadczone usługi poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego (132 godzin), pedagogicznego (44 godzin) oraz seksuologicznego (26 godzin).

W ramach wsparcia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym zorganizowano udział w: 7 spektaklach, Kabaretowym Dniu Kobiet, w pokazach Air Show „Fajera 2019”, 8 wyjść integracyjnych do kina, 3 wyjścia na koncert oraz 7 wycieczkach m.in. do Muzeum Chleba, Szkoły ciekawostek w Radzionkowie. W ramach wsparcia realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych sfinansowano 22 inicjatywy oddolne m.in.: inicjatywa oddolna Katowickiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu dot. udziału w V Międzynarodowych Paramistrzostwach Pierwszej Pomocy. We wszystkich inicjatywach łącznie wzięło udział 425 osób. Usługę aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym świadczył broker edukacyjny, którego zadaniem jest wypracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz kierunku rozwoju kwalifikacji i kompetencji danego uczestnika. Broker udzielił wsparcia w łącznej liczbie 96 godzin.

Zorganizowano 150 spotkań Integracyjnego Klubu Osób Niepełnosprawnych (IKON). W ramach działania Klubu IKON zorganizowano 32 spotkania z dogoterapii oraz 1 spotkanie z muzykoterapii. W ramach zajęć z dogoterapii zorganizowano również wyjścia do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Katowicach. W ramach działań grup treningowo – wspierających uzupełniających ofertę wsparcia osób niepełnosprawnych przeprowadzono 66 Treningów Umiejętności Społecznych – TUS mających na celu nabycie umiejętności życia codziennego. Zorganizowano ponadto 42 spotkania grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono także Treningi Zaradności Codziennej. Trener pracy wspierał osoby niepełnosprawne w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia.

W ramach wsparcia otoczenia Osób Niepełnosprawnych przeprowadzono 37 spotkań grupy wsparcia dla otoczenia osób niepełnosprawnych. Ponadto zorganizowano warsztaty: „Radzenie sobie ze stresem – terapia dźwiękiem” – 10 spotkań, „Mindfulness” – 2 spotkania „Biofeedback” – 57 spotkań oraz 18 warsztatów EKO – art w nurcie „zero waste”, i 2 warsztaty florystyczne. Zorganizowano również szkolenie dla rodziców pt. „Jak chronić ON przed zagrożeniami w sieci” - odbyły się 2 spotkania oraz szkolenie dot. procedury ubezwłasnowolnienia. Zorganizowano także wsparcie fizjoterapeuty dla otoczenia osób niepełnosprawnych w ilości 154 godzin. Wszystkie działania dla otoczenia były skorelowane z działaniami dla osób niepełnosprawnych, co dało rodzicom i opiekunom możliwość skorzystania z bogatej oferty prowadzonej w ramach opieki wychnieniowej.

2020

W ramach zadania pn. „Organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych” odbyło się: 8 spotkań dyskusyjnego klubu filmowego, 6 spotkań klubu literackiego, 1 warsztat komunikacji, 1 spotkanie klubu zaradności finansowej, 8 spotkań klubu dziennikarskiego, 5 spotkań klubu technologicznego, 17 spotkań z animatorami z cyklu „Spotkanie przy herbatce”, 1 spotkanie klubu rozrywki, 3 spotkania z cyklu „Zrób to sam”, 2 spotkania warsztatu kulinarnego, 9 spotkań indywidualnych, zajęcia sportowo – rekreacyjne: 44 zajęcia tenisa stołowego i 40 zajęć klubu fitness.

Z uwagi na epidemię koronawirusa i zalecenia dotyczące pozostania w domach przeprowadzono również zajęcia online za pomocą portalu społecznościowego – zorganizowano: 3 spotkania Klubu Teatralnego, 16 videospotkań przy herbatce, 3 spotkania Klubu Literackiego, 3 spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego, 6 spotkania Klubu Technologicznego, 4 spotkania Music Discussion Club, 3 spotkania Strefy Gracza, 5 spotkań Klubu Dziennikarskiego, 2 spotkania Klubu Rozrywki, 3 spotkania Klubu Kulturowego, 1 spotkanie uczestników Warsztatu Komunikacyjnego.

Zorganizowano również trzy 6 - dniowe wyjazdy edukacyjno-integracyjne do Krakowa, Zakopanego i Trójmiasta oraz 5 - dniowy wyjazd rehabilitacyjno-terapeutyczny do Zakopanego. Ponadto w ramach projektu zaangażowano specjalistę ds. zaradności życiowej.

W ramach zadania Punkt Poradnictwa i Informacji funkcjonował punkt, w którym pracownik był w ciągłej dyspozycji dla osób odwiedzających i potrzebujących porady specjalistycznej. W związku z zaistniałą sytuacją pracownik Punktu Poradnictwa w okresie 19 marca – 25 maja 2020 r. świadczył również wsparcie uczestnikom w formie telefonicznej i online. Ponadto świadczone usługi poradnictwa specjalistycznego (w formie stacjonarnej i w formie online w okresie pandemii) – psychologicznego, pedagogicznego, seksuologicznego, logopedycznego oraz specjalisty kreowania wizerunku.

W ramach wsparcia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym zorganizowano: 8 wyjść do kina, 5 wyjść na spektakle, 3 wyjścia na koncert, wyjście integracyjne do herbaciarni „Fanaberia”, wyjście na kręgle do Klubu „Gravitacja”, wycieczkę w „Korony Drzew” na Słowacji, wyjście do Śląskiego Wesołego Miasteczka, wyjście na wrotki, wyjście na spacer do Chorzowskiego ZOO.

W ramach wsparcia realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych sfinansowano 24 inicjatywy oddolne m.in.: inicjatywa uczestników projektu mająca na celu zakup gier planszowych do strefy gracza (gry logiczne, strategiczne, integracyjne), inicjatywa oddolna dotycząca organizacji warsztatów kosmetycznych. Łącznie uczestnikami inicjatyw oddolnych było 100 osób.

Usługę aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym świadczył broker edukacyjny, którego zadaniem jest wypracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz kierunku rozwoju kwalifikacji i kompetencji danego uczestnika. Broker udzielił wsparcia łącznej liczbie 60 godzin. W ramach zadania odbył się kurs I pomocy przedmedycznej, kurs fotograficzny oraz kurs Microsoft Excel.

Partner – Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki zorganizował: 79 spotkań Integracyjnego Klubu Osób Niepełnosprawnych IKON, 22 spotkania z dogoterapii, 13 spotkań z muzykoterapii, 79 godzin Treningów Umiejętności Społecznych osób niepełnosprawnych – TUS, 84 godziny spotkań grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, 375 godzin Treningów Zaradności Codziennej. Dodatkowo trener pracy wspierał osoby niepełnosprawne w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia.


W ramach wsparcia otoczenia Osób Niepełnosprawnych przeprowadzono 16 spotkań grupy wsparcia dla otoczenia osób niepełnosprawnych, psycholog świadczył wsparcie telefonicznie i online w ilości 41 godzin. Ponadto zorganizowano warsztaty: „Mięśnie dna miednicy – centrum zdrowia kobiety”, „Mindfulness” (z czego 3 spotkania w formie online), „Biofeedback” – 21 spotkań, „Eko-art” – 3 spotkania, 1 warsztat kosmetyczny w gabinecie kosmetycznym, warsztat „Kroju i szycia” - 1 spotkanie, „Warsztaty relaksacyjne” - 1 spotkanie, „Warsztaty dietetyczne” - 6 spotkań, „Warsztaty wprowadzające do metody TRE” – 5 spotkań, 3 spotkania warsztatów rękodzieła, 1 warsztat makramy, 1 warsztat z psychodietetykiem. Zorganizowano także wsparcie fizjoterapeuty dla otoczenia osób niepełnosprawnych w ilości 136 godzin. Wszystkie działania dla otoczenia były skorelowane z działaniami dla osób niepełnosprawnych, co dało rodzicom i opiekunom możliwość skorzystania z bogatej oferty prowadzonej w ramach opieki wychnieniowej.



Wycieczka do Teatru Starego w Krakowie – styczeń 2020



Wycieczka integracyjna do Gdańska – październik 2020




Wycieczka integracyjna do Sopotu – październik 2020



Warsztaty graffiti – sierpień 2020



Turniej gier planszowych – lipiec 2020

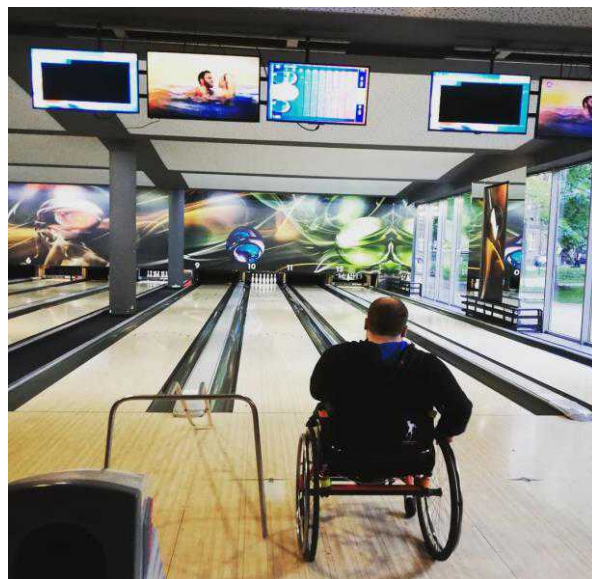

Wyjście do kręgielni – październik 2020

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	1 780 073	395 874	661 484	685 229	nd.
Fundusze strukturalne	1 506 617	354 203	591 848	560 566	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	177 249	41 671	69 636	65 942	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	96 207 ¹	0	0	58 721	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.mops.katowice.pl/node/2349>
<https://www.facebook.com/centrumintegracja>

¹ W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera – 37 486 zł

KATOWICE, MIASTO OTWARTE – ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – II ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY

MOPS

LATA REALIZACJI

2021 - 2022

LOKALIZACJA

UL. FRANCUSKA 43

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt adresowany do osób z niepełnosprawnością z terenu całego miasta Katowice. Zadania projektu obejmowały: animację lokalną, działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i integracyjnym, rozwój potencjału podmiotów działających w obszarze niepełnosprawności, wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społeczno – kulturalnym, organizację wolontariatu.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCIE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

W ramach projektu w 2022 roku prowadzono szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej osób z niepełnosprawnością oraz osób z ich otoczenia. Działania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:

- 113 spotkań w ramach zadania pn. „Organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych”
- 216 spotkań w ramach zadania Punkt Poradnictwa i Informacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach zaangażowania zewnętrznych specjalistów oraz stałego wsparcia pracownika MOPS, który pozostawał do dyspozycji osób odwiedzających i potrzebujących porady specjalistycznej:
 - w ramach konsultacji z dietetykiem odbyły się 74 spotkania,
 - w ramach spotkań z seksuologiem odbyło się 138 spotkań,
 - w ramach spotkań ze stylistą odbyły się 4 spotkania
- 41 wyjść w ramach wsparcia udziału osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i kulturalnym dla średnio 15 osób (m.in. wyjścia do teatru, kina, opery, NOSPR, na spektakl „Jezioro Łabędzie”, do Ogrodów Kapias w Goczałkowicach-Zdroju, wyjazd na kajaki do Krupskiego Młyna, do Planetarium, na mecze siatkówki),
- 22 inicjatywy oddolne na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami,
- wsparcie w ramach uzupełniających działań treningowo-wspierających dla osób z niepełnosprawnością,
- usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym.

Działania zrealizowane przez partnera projektu – Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. Stanisława Kostki. W 2022 roku zorganizowano:

- 94 zajęcia w ramach Integracyjnego Klub Osób Niepełnosprawnych (IKON), tj. zajęcia rozwijające zainteresowania, doskonalenia myślenia i koncentracji, jak również współdziałania w grupie, mające na celu organizację czasu wolnego poprzez korzystanie z zajęć o charakterze artystycznym,
- 16 zajęć z zakresu dogoterapii,
- 20 zajęć z zakresu muzykoterapii,
- stałe wsparcie w ramach aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością poprzez działanie trenera pracy, doradcy zawodowego. W okresie sprawozdawczym odbyło się łącznie 321 spotkań z uczestnikami w tym spotkań indywidualnych, spotkań monitorujących zatrudnienie, spotkań z potencjalnymi pracodawcami oraz uczestnikami, wsparcie otoczenia osób z niepełnosprawnością.



Szkolenie z pierwszej pomocy – czerwiec 2022



Wyjazd integracyjno - edukacyjny – wrzesień 2022



Konsultacje dietetyczne – wrzesień 2022



Piknik – sierpień 2022

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2023r.
Razem wydatki	1 490 539	497 688	992 851	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	1 251 283	466 527	784 756	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	0	0	0	nd.	nd.
Środki własne ²	239 256	31 161	208 095	nd.	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.facebook.com/centrumintegracja>

² W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera – 96 402 zł

KATOWICE, MIASTO OTWARTE - DZIAŁANIA INWESTYCYJNE – ADAPTACJA NA POTRZEBY ORGANIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNKU PRZY UL. FRANCUSKIEJ 43

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE - MOPS

LATA REALIZACJI

2015 - 2018

LOKALIZACJA

UL. FRANCUSKA 43

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował przebudowę budynku przy ul. Francuskiej 43 na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia końcowego zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy kamienicy ul. Francuskiej 43 w Katowicach; dokonano zakupu wyposażenia niezbędnego do realizacji działań centrum usług społecznych (wyposażono aneksy kuchenne w sprzęt AGD, zakupiono meble tj. biurka, szafy biurowe, fotele biurowe, komputery, drukarki oraz sprzęt rehabilitacyjny).

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Budynek przy ul. Francuskiej 43



Wyposażenie siedziby projektu nr 2

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	5 838 981	4 033 330	1 805 651	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	4 774 395	3 368 467	1 405 928	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	0	0	0	nd.	nd.
Środki własne	1 064 586	664 863	399 723	nd.	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx>

KATOWICKI SYSTEM ZINTEGROWANYCH WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH – WĘZŁ „SĄDOWA”

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2013, 2015 - 2020

LOKALIZACJA

UL. SĄDOWA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt zakładał budowę węzła przesiadkowego, z zachowaniem regulacji prawnych dot. poziomów hałasu. Realizacja projektu przyczynił się do osiągnięcia integracji środków transportu – międzynarodowego, krajowego, regionalnego, lokalnego oraz indywidualnego. Zakłada się, że projekt wywrze pozytywny efekt na środowisko poprzez ograniczenie wpływu komunikacji indywidualnej na korzyść komunikacji publicznej, powodując poprawę jakości powietrza w mieście.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2013, 2015-2016

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium Wykonalności.

2017

Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

2018

Realizowano roboty budowlane.

2019


Zakończono roboty budowlane, przygotowano i ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia budynku obsługi podróżnych.

2020

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania.



Centrum Przesiadkowe Sądowa, fot. M. Malina

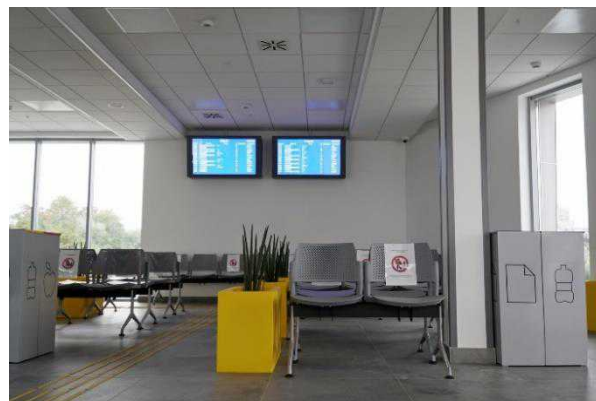

II piętro, poczekalnia, fot. M. Malina

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	66 435 365	9 424 753	44 118 915	12 891 697	nd.
Fundusze strukturalne	43 046 072	6 146 397	29 576 986	7 322 689	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	16 183 249	2 025 000	11 000 000	3 158 249	nd.
Środki własne	7 206 043	1 253 356	3 541 929	2 410 758	nd.

PRZEBUDOWA STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ MIASTA KATOWICE

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2005-2019

LOKALIZACJA

UL. MICKIEWICZA, ŚW. JANA,
KORFANTEGO, RYNEK

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Realizowany od 2005 r. projekt przebudowy strefy śródmiejskiej był jednym z największych projektów infrastrukturalnych ujętych w Programie. Kluczowym elementem była prowadzona od 2012 roku przebudowa strefy Rondo-Rynek, w tym przebudowa układu drogowego, torowiska tramwajowego oraz zagospodarowanie Placu Centralnego. Projekt realizowany był etapami. Lata 2018-2019 obejmowały realizację etapu IV, tj. Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo – Rynek.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W zakresie zadania Budynek C4 – Projekt zagospodarowania dwóch wiat. Postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na brak ofert na wykonanie robót budowlanych.

2019

Zapłacono odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości w trakcie realizacji zadania Spółce „Millenium” Rondo w Warszawie. W zakresie Etapu IV- Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek – przygotowano i ogłoszono kolejny przetarg na roboty budowlane - budowa zadaszenia – przetarg unieważniono.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE


ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Strefa Rondo-Rynek (widok z góry)



Rynek – Plac Kwiatowy

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	272 896 544	271 679 157	310	1 217 077	nd.
Fundusze strukturalne	0	0	0	0	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	nd.
Pozyczki i kredyty	100 463 632	100 463 632	0	0	nd.
Środki własne	172 432 912	171 215 525	310	1 217 077	nd.

REWITALIZACJA I PRZYWRÓCENIE MIESZKAŃCOM PODWÓRKA MIĘDZY ULICAMI ADAMSKIEGO I KOSZAROWĄ

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2015-2016

LOKALIZACJA

UL. ADAMSKIEGO,
KOSZAROWA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował realizację zagospodarowania otoczenia budynków przy ul. Koszarowej 8, 8a, 8b, 8c, 10, 10a, 10b, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f i ul. Adamskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 11a, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e. Projekt realizowany był w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego, poprzedził go szczegółowy proces konsultacyjny prowadzony w 2014 r.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2015/2016

W roku 2015 opracowana została dokumentacja techniczna, a w 2016 r. zostały wykonane roboty budowlane w planowanym zakresie. Odbiór robót został dokonany w dniu 08.12.2016 r. Wykonana została kanalizacja deszczowa, instalacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja teletechniczna. Wymieniona została nawierzchnia drogi dojazdowej wraz z chodnikami. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.



Obszar pomiędzy ul. Koszarową i Adamskiego – stan przed



Stan po zrealizowaniu projektu (1)



Stan po zrealizowaniu projektu (2)

DODATKOWE INFORMACJE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie w 2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2016 r.
Razem wydatki	750 000	0,00	48 000	702 000	nd.
Fundusze strukturalne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

<https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/Konsultacje-Adamskiego.aspx>

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE – ETAP VI

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015-2019

LOKALIZACJA

UL. UNIWERSYTECKA 15

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował termomodernizację oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Realizowano i odebrano roboty budowlane.

2019

Rzeczowa realizacja zadania dla wskazanej lokalizacji została zakończona. Zrezygnowano z powierzenia wykonania audytu energetycznego powykonawczego podmiotowi zewnętrznemu (audyt przeprowadził Wydział Kształtowania Środowiska).

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE


ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

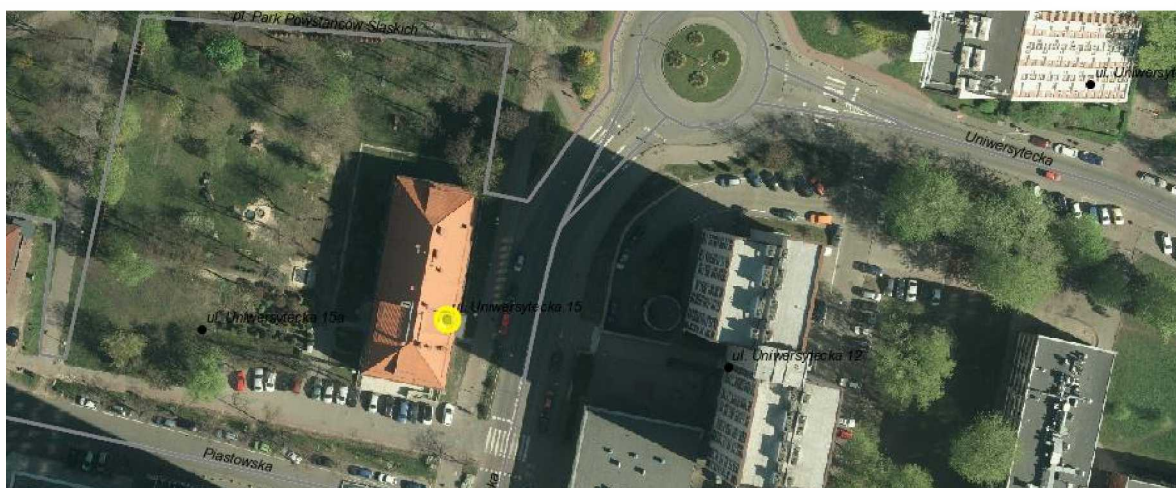

Lokalizacja projektu nr 9

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 436 697	333 365	1 103 332	0	nd.
Fundusze strukturalne	915 539	227 622	687 917	0	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	nd.
Pozyczki i kredyty	0	0	0	0	nd.
Środki własne	521 158	105 743	415 415	0	nd.

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE – ETAP III

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015-2019

LOKALIZACJA

UL. LIGONIA 43

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował termomodernizację oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC


WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Trwały roboty budowlane.

2019

Rzeczowa realizacja zadania dla wskazanej lokalizacji została zakończona.

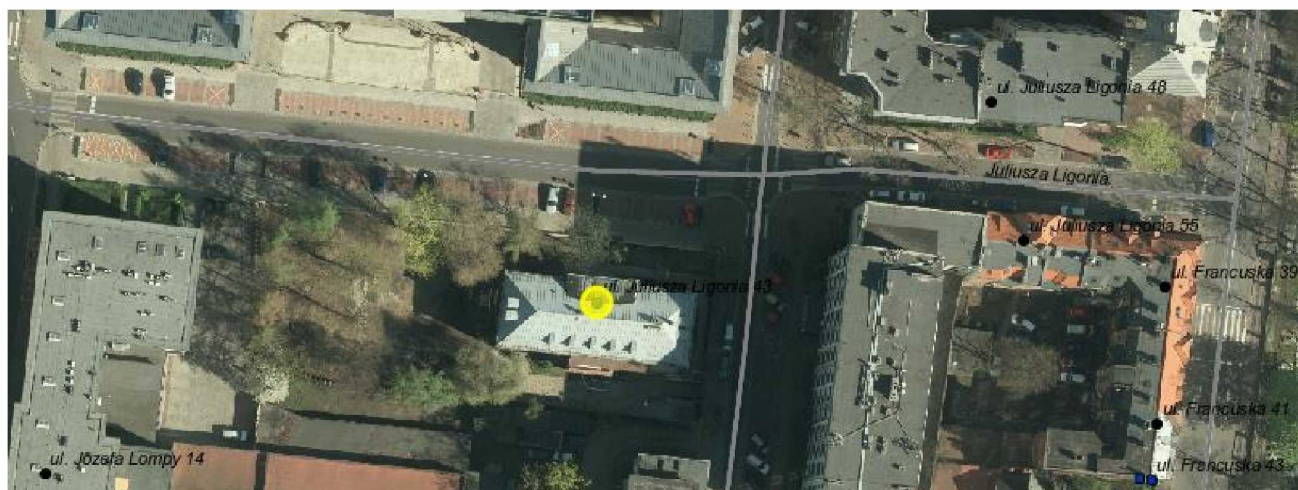

Lokalizacja projektu nr 10

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	2 399 557	17 591	1 042 057	1 339 909	nd.
Fundusze strukturalne	1 005 982	0	663 757	342 225	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	617 608	0	0	617 608	nd.
Pozyczki i kredyty	63 000	0	63 000	0	nd.
Środki własne	712 967	17 591	315 300	380 076	nd.

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE - ETAP VIII A

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016,2018
2020-2022

LOKALIZACJA

UL. 3 Maja 42

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował termomodernizację budynku LO VIII przy ul. 3 Maja 42

PODOBSZAR REWITALIZACJI

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2022

W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42.

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCIE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2022 r.
Razem wydatki	10 900 736	6 145 030	0	4 755 706	nd.
Fundusze strukturalne	4 246 416	3 229 338	0	1 017 078	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	499 5780	379 922	0	119 656	nd.
Pozyczki i kredyty	0	0	0	0	nd.
Środki własne	6 154 742	2 535 770	0	3 618 972	nd.

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE - ETAP VIII A

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015-2018
2020-2022

LOKALIZACJA

UL. PLEBISCYTOWA 46

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

Projekt obejmował termomodernizację budynku Domu Dziecka „Stanica”

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2020


Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane - wpłynęło 6 ofert – trwały prace komisji przetargowej; zawarto umowę na pełnienie usług Inżyniera Kontraktu.

2021

Zakończono roboty budowlane.

2022

W okresie sprawozdawczym uregulowano należności za pełnienie usług Inżyniera Kontraktu i Inwestora zastępczego dot. termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Plebiscytowej 46 - 46a w Katowicach (siedziby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych DOM 1 - 3 w Katowicach).

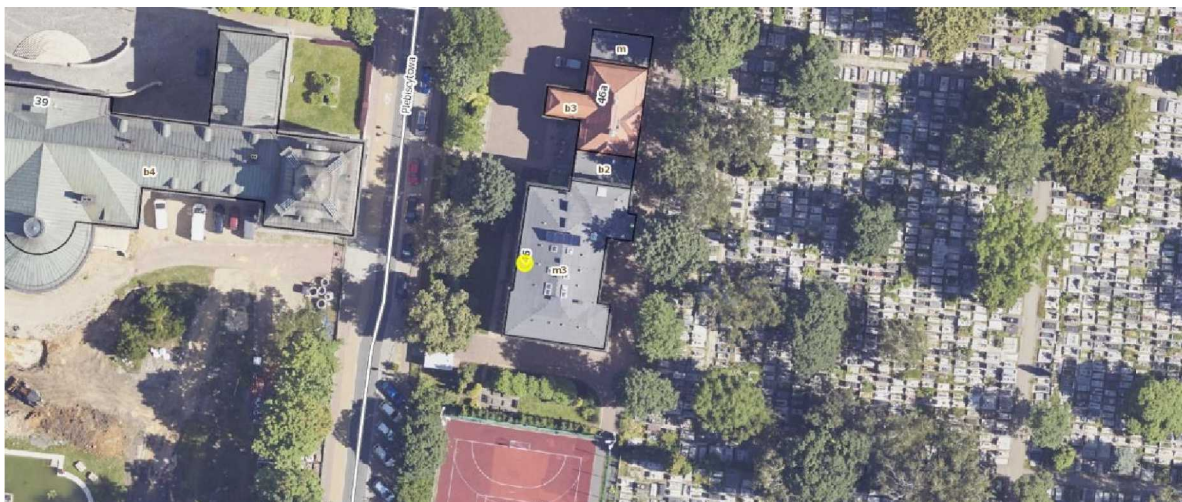

Lokalizacja projektu nr 12

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2022 r.
Razem wydatki	2 125 451	2 103 813	21 638	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	768 646	768 646	nd.	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	1 356 805	1 335 167	21 638	nd.	nd.

BUDOWA PLACU ZABAW ZE STREFĄ FITNESS

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2015-2016

LOKALIZACJA

UL. KOSZAROWA
UL. ADAMSKIEGO

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował budowę placu zabaw ze strefą fitness, budowę elementów małej architektury, nawierzchni i schodów terenowych - ul. Koszarowa 8, 8a, 8b, 8c, 10, 10a, 10b, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; ul. Adamskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 11a, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2015/2016

Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 02.12.2015 r. z terminem zakończenia do 25.10.2016 r. Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu 08.12.2016 r.



Lokalizacja projektu nr 12



Plac zabaw ze strefą fitness

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Wykonanie w 2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2016 r.
Razem wydatki	744 098	nd.	50 000	694 098	nd.
Fundusze strukturalne	0	nd.	0	0	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	nd.	0	0	nd.
Pożyczki i kredyty	0	nd.	0	0	nd.
Środki własne	744 098	nd.	50 000	694 098	nd.

ROZBUDOWA, MODERNIZACJA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEJ AWF IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2011-2018

LOKALIZACJA

UL. SZMAUSA, MIKOŁOWSKA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował dofinansowanie rozbudowy, modernizacji oraz termomodernizacji bazy dydaktyczno-administracyjnej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z przeznaczeniem na prace projektowe wraz z przygotowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej; roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne oraz roboty wodno-kanalizacyjne.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Nadzór inspektora robót ogólnobudowlanych nad realizacją inwestycji; modernizacja dwóch sal sportowych (roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne); dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego do zmodernizowanego budynku; prace budowlano-remontowe polegające na demontażu istniejących trzech garaży oraz budowa nowego parkingu za budynkiem głównym AWF; prace remontowe nawierzchni asfaltowej wzdłuż wielofunkcyjnej hali sportowej.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Sala wykładowa



Sala do zajęć praktycznych

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	15 450 000	12 200 000	3 250 000	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	0	0	0	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	0	0	0	nd.	nd.
Środki własne	15 450 000	12 200 000	3 250 000	nd.	nd.

PRZEBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ W RAMACH PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016-2017

LOKALIZACJA

UL. KRASIŃSKIEGO 8

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował dofinansowanie realizacji nowej sieci komputerowej w budynku przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach wraz z siecią bezprzewodową umożliwiającą korzystanie z Internetu w obiekcie, dziedzińcach i częściach ulic przylegających do budynku.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Trwała przebudowa sieci komputerowej.

2017

Zakończono przebudowę sieci komputerowej Politechniki Śląskiej w budynku przy ul. Krasińskiego 8.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	996 370	nd.	741 193	255 177	nd.
Fundusze strukturalne	0	nd.	0	0	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	nd.	0	0	nd.
Pozyczki i kredyty	0	nd.	0	0	nd.
Środki własne	996 370	nd.	741 193	255 177	nd.

STREFA INNOWACJI MIASTA KATOWICE - MIEJSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2018 - 2019

LOKALIZACJA

UL. KRASIŃSKIEGO 13

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Dofinansowanie przez Miasto Katowice II etapu remontu pomieszczenia przeznaczonego na salę seminaryjną oraz adaptacji pomieszczeń na utworzenie laboratorium nowych technologii i pracowni badania prototypów w budowie pojazdów Politechniki Śląskiej

PODOB SZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznych na stanowiskach badania prototypów w laboratorium, które będzie częścią tworzonej Strefy Innowacji oraz rozpoczęto modernizację sali seminaryjnej.

2019

Zakończono realizację zadania.



Pracownia badania prototypów, fot. PŚ (1)



Pracownia badania prototypów, fot. PŚ (2)

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	999 204	nd.	249 204	750 000	nd.
Fundusze strukturalne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

https://www.polsl.pl/rjo4-citt/ps_aktualnosci/otwarcie-strefy-innowacji-miasta-katowice-miejski-inkubator-przedsiębiorczości-i-transferu-technologii/

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. UNIWERSYTECKIEJ 4 NA POTRZEBY NOWEJ SIEDZIBY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2018-2019

LOKALIZACJA

UL. UNIWERSYTECKA 4

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt ze strony Miasta zakładał dofinansowanie przebudowy i termomodernizacji budynku (do realizacji przez Uczelnię).

PODOBSZAR REWITALIZACJI

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wykonaj” przebudowę i termomodernizację budynku (roboty ogólnobudowlane, instalacje wodno-kanalizacyjne, klimatyzacji, elektryczne silnoprądowe i niskoprądowe, oprawy oświetleniowe wraz z okablowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej, CO, docieplenie dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej technologii i aranżacji wnętrz pomieszczeń, zakup wyposażenia i urządzeń.

2019

Wykonano roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wykonaj” przebudowę oraz termomodernizację budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego.

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Lokalizacja projektu nr 18

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 000 000	nd.	500 000	500 000	nd.
Fundusze strukturalne	0	nd.	0	0	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	nd.	0	0	nd.
Pożyczki i kredyty	0	nd.	0	0	nd.
Środki własne	1 000 000	nd.	500 000	500 000	nd.

ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. TEATRALNEJ 17, 17A, 17B W KATOWICACH – MIEJSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016 - 2019

LOKALIZACJA

UL. TEATRALNA 17, 17A, 17B

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski oraz promocję projektu. Celem projektu było wsparcie działań na rzecz wzrostu aktywizacji zawodowej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz na rzecz rozwoju przedsiębiorczości opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018


Zakończono roboty budowlane. Trwało przygotowanie postępowania na wyposażenie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

2019

Zakup wyposażenia obiektu.



Siedziba MIP - jedna z sal MIP



Siedziba MIP - widok z zewnątrz

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	5 473 128	112 317	4 491 688	869 123	nd.
Fundusze strukturalne	0	0	0	0	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	nd.
Pozyczki i kredyty	0	0	0	0	nd.
Środki własne	5 473 128	112 317	4 491 688	869 123	nd.

CENTRUM SPOŁECZNOŚCIOWE W ŚRÓDMIEŚCIU - I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY

MOPS

LATA REALIZACJI

2019-2021

LOKALIZACJA

UL. TEATRALNA 17a

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu było wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym wypadku zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Śródmieście. W ramach projektu będą realizowane m.in. następujące działania: Animacja lokalna Akademia liderów lokalnych, Punkt Informacji Obywatelskiej, Działania środowiskowe, Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Śródmieście.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2019

We wrześniu rozpoczęto realizację projektu. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie rekrutacyjne w celu zatrudnienia animatorów lokalnych do projektu. Pracownicy Centrum Społecznościowego w Śródmieściu w okresie sprawozdawczym:

- nawiązali współpracę z organizacjami działającymi na terenie dzielnicy m.in. Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, Stowarzyszeniem "Szansa dla każdego" oraz Domem Dziecka „Stanica”,
- podjęli działania związane z promowaniem Projektu Centrum Społecznościowe Śródmieście, takie jak: stworzenie fanpage na Facebooku, przygotowanie plakatów i ulotek, informowanie instytucji o rozpoczęciu realizacji projektu,
- sporządzona została analiza zasobów i potencjału dzielnicy Śródmieście.

2020

W ramach działań realizowanych w Centrum Społecznościowym Śródmieście zrealizowano:

- 19 spotkań animacyjnych, w trakcie których prowadzone były spotkania z mieszkańcami: odbyły się spotkania informacyjne dotyczące projektu oraz warsztaty. Odbył się także spacer historyczny po ulicy Kościuszki w Katowicach,
- 3 spotkania z mieszkańcami z cyklu „Ławeczka”. Spotkania odbyły się w parku przy Placu Andrzeja, na skwerze w okolicach katowickiej Katedry Chrystusa Króla oraz na placu Hlonda. W trakcie spotkań prowadzono rozmowy z mieszkańcami, zapewniono poczęstunek oraz gry planszowe. Ponadto animator informował społeczność lokalną o działaniach podejmowanych w ramach projektu oraz zachęcał do aktywnego udziału w spotkaniach i warsztatach,
- 1 spotkanie w ramach Klubu Społecznościowego dla młodzieży. W trakcie warsztatu 9 uczestników uszyło ekologiczne worko-plecaki,
- 16 spotkań bezpośrednich oraz 6 warsztatów w formie zdalnej w ramach Klubu Społecznościowego „Kobiety Kącik”,
- 8 spotkań w ramach „Akcji Zima w Śródmieściu”. Odbyło się 6 warsztatów m.in. pn.: „Social media dla młodzieży” oraz 2 wyjścia z dziećmi i młodzieżą do Jump World oraz do Sali zabaw Koko Planeta Łobuziaków,
- wyjścia: wyjście na walentynkowy koncert do Filharmonii Śląskiej, wyjście do Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego na spektakl „Skazany na bluesa”, spektakl „Mayday” oraz spektakl „Mayday 2”, wyjście do Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego na spotkanie „Korfanty silna bestia” oraz wyjazd do Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie”,
- w ramach organizacji wyjść i wyjazdów integracyjnych zorganizowano wyjście do kina z młodzieżą, wyjście integracyjno-edukacyjne do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, wycieczkę plenerową na Szyndzielnię i Klimczok, wyjazd do Aquadromu w Rudzie Śląskiej oraz wycieczkę krajoznawczą do Kopalni Soli w Wieliczce,
- w ramach „Akcji Lato w Śródmieściu” zostały zorganizowane warsztaty wraz ze Stowarzyszeniem Szansa dla Każdego. W czasie zajęć dzieci tworzyły maskotki minionki. W trakcie wakacji zostały zorganizowane 4 mini pikniki na terenie Śródmieścia.

Ze względu na sytuację epidemiczną animatorzy lokalni realizowali również zdalne formy kontaktu z uczestnikami projektu, m.in. realizowane były tutoriale w tematyce decoupage dla uczestników udostępniane na profilu w mediach społecznościowych, organizowane były konkursy, promowane poprzez udostępnianie różnych form i możliwości spędzania czasu wolnego. Utrzymywany był kontakt telefoniczny z uczestnikami, prowadzona była działalność informacyjna dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście. Animator lokalny uczestniczył również w akcji zycia maseczek dla mieszkańców dzielnicy.

W ramach działań realizowanych w Centrum Społecznościowym Śródmieście, w 2021 roku zrealizowano:

- 35 cyklicznych spotkań animacyjnych w ramach zadania „Animacja lokalna”. Odbłyło się m.in.: warsztaty kulinarne, warsztaty rękodzieła, warsztaty modelarskie, szydełkowe oraz antystresowe kolorowanki na świeżym powietrzu. Odbłyło się również spotkanie Mikołajkowe dla wszystkich uczestników projektu. Łącznie w powyższych wydarzeniach wzięło udział 115 osób. Oprócz spotkań w formie warsztatów odbyło się 30 spotkań informacyjno-organizacyjnych. Udział wzięli w nich zarówno mieszkańcy, jak i przedstawiciele firm i organizacji, z którymi została nawiązana współpraca,
- 43 spotkania w ramach „Kobiecego Kącika”. W odpowiedzi na oczekiwania uczestniczek zorganizowano warsztaty tworzenia makramy, decoupage oraz malowania na jedwabiu. Okazją do budowania relacji wśród mieszkanki Śródmieścia były również zajęcia haftu, warsztaty szydełkowe, odlewanie woskowych świec czy tworzenie artystycznych mydeł z okazji Dnia Kobiet i biżuterii na Dzień Matki,
- 22 spotkania w ramach Klubu Społecznościowego dla Młodzieży. Odbłyło się m.in.: warsztaty legorobotyki, kaligrafii, japońskiej sztuki Kumihimo, spotkanie z coachem, warsztaty malarskie, warsztaty charakterystyki oraz warsztaty kulinarne. W okresie ograniczeń ilości osób na zajęciach realizowano także warsztaty zdalne. W ramach Klubu Społecznościowego dla Młodzieży odbyły się w tej formie między innymi warsztaty malowania na szkle,
- w ramach zadania „Punkt Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej” odbyło się 95 godzin poradnictwa kosmetycznego i 8,5 godziny poradnictwa dietetycznego,
- w ramach zadania „Akademia Lidera Społeczności Lokalnej” wyłoniono 8 kandydatów na Liderów Społeczności Lokalnej, którzy wzięli udział w następujących szkoleniach: 2 szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, 2 szkolenia z zakresu „Rola i zadania lidera oraz środowisko działania, w tym współpraca instytucjonalna”, 1 warsztat „Wystąpienia publiczne i autoprezentacja”, 2 warsztaty „Skuteczna realizacja inicjatyw lokalnych”. Odbłyło się również pięć wizyt studyjnych, mających na celu zapoznanie uczestników Akademii Lidera z dobrymi praktykami w zakresie organizowania inicjatyw lokalnych,
- 6 inicjatywy oddolnych uczestników w ramach Akademii Liderów Społeczności m.in. Gra terenowa „Zaczytane Śródmieście”,
- w ramach „Programu wspierającego reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Śródmieście” zadanie było realizowane przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach. Poniesiono koszty związane z udzieleniem poradnictwa psychologicznego, indywidualnego doradztwa zawodowego, treningu pracy dla stażysty. Odbłyło się warsztaty psychologiczne, warsztaty aktywizujące i trening umiejętności społecznych. Zakończono realizację 12 staży zawodowych. Udział w projekcie zakończyło 21 osób, w tym 20 uzyskało kwalifikacje oraz 13 zostało zatrudnionych na umowę o pracę,
- w ramach zadania „Działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej” zrealizowano: wyjścia do teatru, wyjścia na koncert, dyskusje filmowe, wyjście do Filharmonii Śląskiej oraz do opery. Ponadto zorganizowano 5 wycieczek m.in. do Ogrodów Kapias w Goczałkowicach. W ramach zadania zrealizowano 27 warsztatów m.in. warsztat ze specjalistą naprawiania rowerów. W ramach zadania zrealizowano także spacer historyczny ul. Kościuszki, zwiedzanie dzielnicy Giszowiec i Nikiszowiec, zwiedzanie pasieki pszczelarskiej, z przewodnikiem oraz 9 zajęć Nordic Walking dla mieszkańców dzielnicy. W ramach zadania „Akcja Lato w Śródmieściu” zorganizowano 2 pikniki oraz 14 warsztatów. W ramach zadania „Akcja zima w Śródmieściu” zorganizowano 16 warsztatów. W ramach „Organizacji cyklicznych wydarzeń lokalnych” zorganizowano: „Szafing” czyli wymianę odzieży i różnych drobnych przedmiotów, 2 edycje „Andrzejbrania” na Placu Andrzeja, 2 pokazy kina plenerowego, 2 gry terenowe, warsztaty podczas obchodów Dnia Dzielnicy organizowanego przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 1. Centrum Społecznościowe w Śródmieściu było również współorganizatorem Pikniku Rodzinnego w Parku Powstańców Śląskich, podczas którego we współpracy z Fundacją „Wolne miejsce” powstał poczęstunek dla ok. 500 uczestników pikniku. Centrum Społecznościowe w Śródmieściu brało również udział w Festiwalu NGO oraz obchodach Dnia Seniora - na obu wydarzeniach zorganizowano plenerową kuchnię sezonową.



Wejście na Szyndzielnię – lipiec 2020



Wyjście do Filharmonii Śląskiej – luty 2020



Warsztaty makramy – sierpień 2020



Zajęcia animacyjne dla dzieci – lipiec 2020

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w 2021 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2021 r.
Razem wydatki	826 833	26 449	158 689	641 695	nd.
Fundusze strukturalne	702 348	23 664	141 984	536 700	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	82 629	2 785	nd.	16 705	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	41 856	0	nd.	0	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://katowice.eu/Strony/Centrum-Spolecznosciowe-w-Srodmiesciu---I-etap.aspx>

<https://www.facebook.com/Centra-Spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe-w-%C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bciu-i-Zawodziu-101439838012313>

Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MOPS	2020-2022	UL. TEATRALNA 17A	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU W ramach projektu odbyły się działania integrujące społeczność lokalną oraz aktywizację społeczno-zawodową, w tym działania o charakterze kulturalnym, społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Szczególnym wsparciem zostaną objęci seniorzy zamieszkujący dzielnice Śródmieście i Zawdzie.			PODOBSZAR REWITALIZACJI ✓ ŚRÓDMIEŚCIE ✓ ZAWODZIE ZAŁĘŻE BOGUCICE SZOPIENICE-BUROWIEC JANÓW-NIKISZOWIEC
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” oraz Katowickim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA”. Realizatorami działań kulturalnych w projekcie są Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawdzie” – filia Zawdzie oraz Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.			

W ramach **Centrum Społecznościowego w Śródmieściu** zrealizowano następujące działania:

- w ramach organizacji warsztatów i spotkań animacyjnych odbyło się 20 spotkań warsztatowych m.in.: tworzenie kartek wielkanocnych,
- w ramach klubu społecznościowego „Kobiety Kącik” odbyło się m.in.: warsztaty szycia na maszynie, warsztat z tworzenia palmy wielkanocnej, warsztat kulinarny
- w ramach klubu społecznościowego dla młodzieży zrealizowano m.in.: cykl spotkań pn. „Good idea! Made in ...” z przedstawicielami innych kultur,
- w ramach organizacji spotkań edukacyjno-integracyjnych zrealizowano m.in.: spacerzy nordic walking po Śródmieściu, cykl spotkań z kosmetyczką oraz dietetykiem, spotkania rękodzielnicze tworzenia dekoracji,
- w ramach organizacji cyklicznych wydarzeń lokalnych zrealizowano m.in.: pikniki integracyjne, grę terenową, szafingi: „Andrzejobranie” – wymiana odzieży na pl. Andrzeja w Katowicach oraz wymiana książek,
- w ramach spacerów z przewodnikami odbyło się m.in.: wycieczka krajobrazowa do Osikowej Doliny,
- w ramach inicjatyw oddolnych uczestników „Akademii Lidera Społeczności Lokalnej” odbyło się: szkolenie z „Pierwszej pomocy przedmedycznej”, wyjazdy edukacyjne, warsztaty tworzenia mebli z palet, warsztaty roślinne oraz warsztaty pn.: Las w słoiku.

Tutejszy Ośrodek w ramach zadania zleconego w 2022 roku kontynuował również realizację **Programu wspierającego reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Zawdzie**. W ramach Programu objęto wsparciem 16 osób biernych zawodowo, z których 14 podjęło pracę. Tym samym osiągnięto zakładane rezultaty realizacji projektu. Prowadzono także **działania kulturalne**, które realizowała filia „Zawdzie” Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawdzie” oraz Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.

W ramach **Centrum Społecznościowego w Zawodziu** Stowarzyszenie „Mocni Razem” zrealizowało następujące działania:

- 45 spotkań „Klubu Mieszkańca”,
- 62 spotkania „Klubu Wolontariusza”,
- 24 spotkania edukacyjno-integracyjnych,
- 11 wyjść integracyjnych,
- 8 stacjonarnych treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
- 2 wydarzenia lokalne: „Sportowy Deptak Dla Dzieci”, „Mikołajki dla najmłodszych” podczas rozświetlenia zawodziańskiej choinki.

W ramach **Dzielnicowej Akademii Seniora w Zawodziu** Stowarzyszenie „Mocni Razem” zrealizowało następujące działania: 149 spotkań ze specjalistami ds. organizowania społeczności lokalnej, 37 spotkań integracyjno-edukacyjnych, 12 wyjść integracyjno-aktywizujących, 3 wydarzenia dla społeczności lokalnej: „Walentynkowa Wymiana Dobrej Energii”, uroczyste rozświetlenie zawodziankiej choinki, uroczyste spotkanie podsumowujące projekt, 8 spotkań edukacyjno-integracyjnych prowadzonych przez wolontariuszy.

W ramach **Klubu Senior + w Śródmieściu**, Stowarzyszenie „OPOKA” zrealizował wiele działań integracyjnych m.in.: codzienne zajęcia dla seniorów, wyjazdy, wycieczki, imprezę karnawałową, imprezy integracyjne, wyjścia do filharmonii, zabawę „Andrzejkową”.



Zajęcia sportowe – lipiec 2022



Andrzejobranie – czerwiec 2022



Inicjatywa oddolna – październik 2022



Warsztaty szycia – listopad 2021

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2023 r.
Razem wydatki	2 070 133 zł	712 201 zł	1 357 932 zł	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	1 752 926 zł	712 201 zł	1 040 725 zł	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne ³	317 207 zł	0 zł	317 207 zł	nd.	nd.

³ W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera – 139 960 zł

ZAZIELENIENIE BULWARÓW RAWY (BO)

PODMIOT REALIZUJĄCY

ZZM

LATA REALIZACJI

2019 - 2020

LOKALIZACJA

OKOLICE UL. PAWŁA I
UL. WODNEJ

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował poprawę jakości przestrzeni w okolicach rzeki Rawy poprzez nowe nasadzenia roślinności oraz posianie traw.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2019

Wykonano projekt zagospodarowania terenu przy rzece Rawie wraz z dokonaniem uzgodnień oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

2020

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę na wykonanie. Roboty zakończono i odebrano.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Efekt projektu, fot. ZZM

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	118 741	nd.	7 195 zł	111 546	nd.
Fundusze strukturalne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://bo.katowice.eu//Projekty/Strony/Zazielenianie-bulwar%C3%B3w-Rawydsdsdf.aspx>

NOWY PLAC ROSTKA - STREFA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM. PRZEBUDOWA PLACU, ODNOWIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI, ODNOWIENIE CHODNIKÓW, NOWE DRZEWA, ROŚLINY, ŁAWKI, STACJA WYPOŻYCZANIA ROWERÓW (BO)

PODMIOT REALIZUJĄCY

MZUiM

LATA REALIZACJI

2020-2021

LOKALIZACJA

PLAC ROSTKA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, nasadzeń, postawienia małej architektury oraz uruchomienie stacji wypożyczania rowerów.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2020

Wyłoniono wykonawcę robót i opracowano dokumentację projektową.

2021

Zadanie zakończono i odebrano.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2021 r.
Razem wydatki	537 275	0	29 520	507 755	nd.
Fundusze strukturalne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://bo.katowice.eu//Projekty/Strony/Nowy-Plac-Rostka---strefa-przyjazna-mieszka%C5%84com--Przebudowa-placu,-odnowienie-nawierzchni-jezdni,-odnowienie-chodnik%C3%B3w,-no.aspx>

ZAZIELENIE ULICY WARSZAWSKIEJ W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

ZZM

LATA REALIZACJI

2021-2023

LOKALIZACJA

UL. WARSZAWSKA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Zadanie dotyczyło przebudowy i zazielenienia ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Dyrekcyjnej do ul. Francuskiej.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2021


Opracowano projekt budowlany. Zawarto umowę na wykonanie projektu zmiany oświetlenia dla całej inwestycji.

2022

Podpisano umowę na roboty budowlane. W ramach prac nad dokumentacją projektową konieczne było uwzględnienie dodatkowego zakresu, co opóźniło rozpoczęcie robót budowlanych, dodatkowo konieczne były uzgodnienia przyłączy z gestorami sieci.

2023

Wyłączono z ruchu kołowego ul. Warszawską na odcinku od ul. Dyrekcyjnej do ul. Szkolnej oraz znacznie uspokojono go od ul. Szkolnej do ul. Francuskiej - za sprawą wprowadzenia strefy Tempo 30 oraz zmian w organizacji ruchu na tym fragmencie ul. Warszawskiej. Zasadzono 70 drzew oraz kilka tysięcy sztuk krzewów i bylin, ustawiono elementy małej architektury. Zadanie odebrano i zakończono.

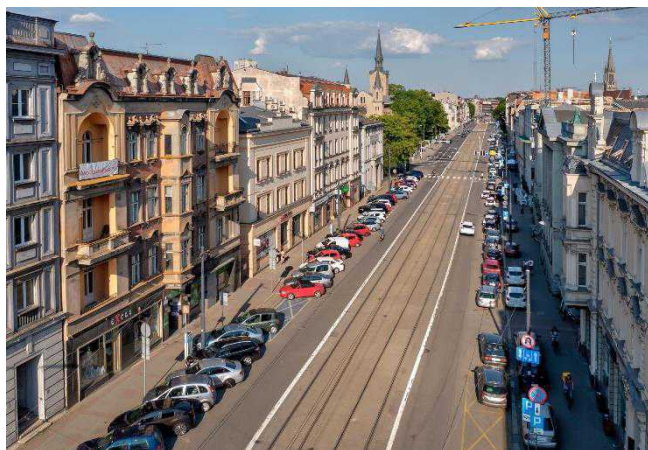

Ulica Warszawska – stan przed



Ulica Warszawska – stan po

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2023 r.
Razem wydatki	17 117 373	309 979	1 296 736	15 510 658	nd.
Fundusze strukturalne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	13 885 338	150 000	1 296 736	12 438 602	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	3 232 035	159 979	0	3 072 056	nd.

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 4, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2019-2023

LOKALIZACJA

UL. GLIWICKA 4
UL. ŚW. JANA 14
UL. SŁOWACKIEGO 11

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z likwidacją niskiej emisji.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2020

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia budowlane dla wszystkich trzech budynków. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Dla wszystkich trzech budynków, zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

2021

Zakończono roboty budowlane w budynku przy ul. Słowackiego 11 i św. Jana 14; kontynuowano roboty budowlane w budynku przy ul. Gliwickiej 4, opracowano dodatkową dokumentację na wymianę stropów w budynku przy ul. Gliwickiej 4.

2022

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty rozbiórkowe, wywieziono gruz oraz poddano procesowi odgrzybiania drewniane elementy konstrukcji w budynku przy ul. Gliwickiej 4.

2023

W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane. Projekt zakończono.



Budynek przy ul. Słowackiego 11 – stan po



Budynek przy ul. Św. Jana 14 – stan po



Budynek przy ul. Gliwickiej 4 – stan po

DANE FINANSOWE					
Wydatki	łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2023 r.
Razem wydatki	9 731 519	3 734 631	329 212	5 667 676	nd.
Fundusze strukturalne	1 953 378	725 288	22 988	1 256 045	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	3 238 280	2 630 339	107 941	500 000	nd.
Środki własne	4 539 861	379 004	198 283	3 911 631	nd.

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2019; 2021-2023

LOKALIZACJA

UL. SOKOLSKA 10A

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Zadanie dotyczyło kompleksowej modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2022

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto i realizowano prace obejmujące: docieplenie i izolację ścian piwnic, docieplenie ścian, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, remont pomieszczenia węzła ciepłego, likwidację pieców kaflowych, remont dachu, renowację elewacji frontowej, instalację c.o., instalację c.w.u. instalacje elektryczne, wymianę okien, przyłącze kanalizacyjne dot. modernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a; zamontowano tablicę informacyjną.

2023

Kontynuowano roboty budowlane. Projekt zakończono.

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCIE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Budynek przy ul. Sokolskiej 10a - stan po

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2023r.
Razem wydatki	2 337 034	109 268	1 045 863	1 181 903	nd.
Fundusze strukturalne	721 189	37 970	445 631	257 689	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	1 615 846	71 298	600 232	924 214	nd.

ROZBIÓRKA KŁADKI ORAZ ROZBIÓRKA I BUDOWA NOWEGO MOSTU W CIĄGU UL. BANKOWEJ NAD RZEKĄ RAWĄ W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MZUim

LATA REALIZACJI

2020-2021

LOKALIZACJA

UL. BANKOWA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt rozbiórki kładki i mostu oraz budowy nowego mostu nad rzeką Rawą.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2022

W ramach inwestycji rozebrano wyeksploatowaną kładkę oraz most, w miejscu których wybudowano jednoprzęsłowy most o konstrukcji ramowej. Obiekt wyposażony jest w jezdnię, ścieżkę pieszko-rowerową oraz ścieżkę pieszą.



Kładka oraz most nad rzeką Rawą - przed



Kładka oraz most nad rzeką Rawą – po

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2023 r.
Razem wydatki	4 295 868	97 170	4 198 698	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	2 196 519	97 170	2 099 349	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	2 099 349	nd.	2 099 349	nd.	nd.

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH PRZY UL. GLIWICKIEJ 13, 13A UL. J. ZARĘBSKIEGO 5A, 7A I UL. KS. BPA H. BEDNORZA 14

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2018 - 2021

LOKALIZACJA

UL. GLIWICKA 13, 13A
UL. J. ZARĘBSKIEGO 5A, 7A
UL. BEDNORZA 14

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował roboty z zakresu branży budowlanej oraz branży elektrycznej, w tym m.in.: wykonanie docieplenia dachu, wymiana okien i drzwi, ocieplenie i izolacja ścian, wykonanie konstrukcji pod instalację solarną, roboty rozbiórkowe i prace remontowe oraz wykonanie instalacji odgromowej.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2019

W okresie sprawozdawczym opracowane zostały dokumentacje i audyty energetyczne dla wszystkich czterech budynków, audyt zbiorczy, studium wykonalności oraz opinie ornitologiczno-chiropterologiczne. Uzyskane zostały pozwolenia budowlane dla budynków.

ul. Bednorza 14 - rozpoczęto roboty budowlane.

2020

ul. Bednorza 14 - zrealizowano roboty budowlane.

ul. Gliwickiej 13, 13a - trwały roboty budowlane.

ul. J. Zarębskiego 5a - zawarto umowę na kompleksowy nadzór inwestorski, rozpoczęto prace termomodernizacyjne oraz wykonano węzeł cieplny i instalację centralnego ogrzewania.

ul. J. Zarębskiego 7a - zawarto umowę na kompleksowy nadzór inwestorski, wykonano węzeł cieplny i instalację centralnego ogrzewania oraz rozpoczęto wymianę instalacji elektrycznej i gazowej.

2021

ul. Gliwickiej 13, 13a - wykonano roboty obejmujące wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, docieplenie elewacji budynku oraz remont piwnic.

ul. Zarębskiego 7a - wykonano roboty termomodernizacyjne i prace w zakresie zagospodarowania terenu.

ul. Zarębskiego 5a - wykonano roboty termomodernizacyjne i prace związane z remontem klatki schodowej i elementów zagospodarowania terenu.




Zarębskiego 5a – budynek przed modernizacją




Zarębskiego 5a – budynek po modernizacji



Gliwickska 13 – przed modernizacją (1)

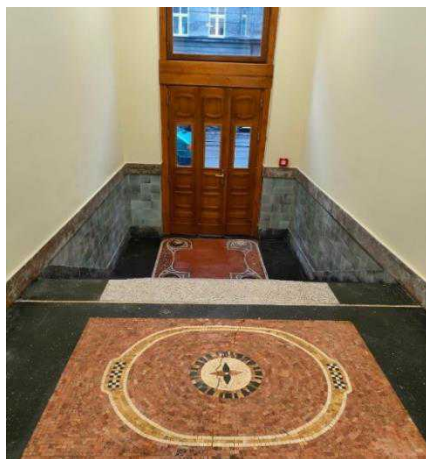

Gliwickska 13 po modernizacji (1)

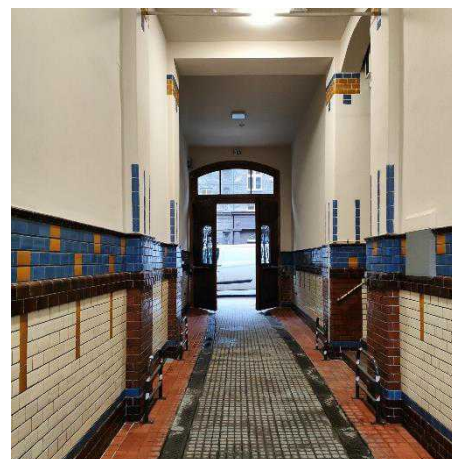

Gliwickska 13 – przed modernizacją (2)



Gliwickska 13 po modernizacji (2)



Zarębskiego 7a – przed modernizacją



Zarębskiego 7a – po modernizacji



DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w 2021 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2021r.
Razem wydatki	7 210 348	383 073	932 721,26	5 894 552,85	bd.
Fundusze strukturalne	3 019 698	244 192	372 598,42	2 402 907,45	bd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	bd.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	bd.
Środki własne	4 190 649	138 881	560 122,84	3 491 645,40	bd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.wkatowicach.eu/informacje/w-katowicach/Piekna-kamienica-przy-Gliwickiej-wsrod-najlepszych-rewitalizacji-w-Polsce/idn:1952>

ŻŁOBEK SZANSĄ NA ROZWÓJ DZIECKA I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW (komponent miękkiej)

PODMIOT REALIZUJĄCY

CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH/ ŻŁOBEK MIEJSKI/
URZĄD MIASTA

LATA REALIZACJI

2015 – 2017, 2019

LOKALIZACJA

UL. UNIWERSYTECKA 15
UL. MARCINKOWSKIEGO 13

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zapewnienie szerszego dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia w mieście Katowice i wyrównywanie szans na aktywność zawodową rodziców/opiekunów prawnych tychże dzieci poprzez uruchomienie dodatkowych, nowych miejsc w Żłobku. Efektem projektu było utworzenie dwóch nowych oddziałów Żłobka Miejskiego w specjalnie zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

✓ ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Poniesiono wydatki na utrzymanie budynków, bieżące funkcjonowanie w związku z otwarciem dwóch nowych oddziałów i grup żłobkowych, w których opieką objęto 140 dzieci, oraz wypłatę wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.

2017

Poniesiono wydatki na utrzymanie nowego oddziału Żłobka przy ul. Marcinkowskiego (na 50 miejsc) i dodatkowych miejsc w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej (90 miejsc) oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

W 2019 r. zamknięto rozliczenie finansowe projektu.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	2 842 045	5 581	1 196 840	1 548 716	90 907	nd.
Fundusze strukturalne	2 288 061	0	945 174	1 255 080	87 807	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	80 757	0	33 359	44 296,97	3 100	nd.
Pozyczki i kredyty	0	0	0	0	0	nd.
Środki własne	473 227	5 581	218 308	249 339	0	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/%C5%BB%C5%82obek-szans%C4%85-na-rozw%C3%B3j-dziecka-i-aktywno%C5%9B%C4%87-zawodow%C4%85-rodzic%C3%B3w.aspx>

ŻŁOBEK SZANSĄ NA ROZWÓJ DZIECKA I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW (komponent twardy)

PODMIOT REALIZUJĄCY

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH/
ŻŁOBEK MIEJSKI/ URZĄD

LATA REALIZACJI

2015 - 2017

LOKALIZACJA

UL. UNIWERSYTECKA 15
UL. MARCINKOWSKIEGO 13

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zapewnienie szerszego dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia w mieście Katowice i wyrównywanie szans na aktywność zawodową rodziców/opiekunów prawnych tychże dzieci poprzez uruchomienie dodatkowych, nowych miejsc w żłobku. Efektem projektu było utworzenie dwóch nowych oddziałów żłobka miejskiego w specjalnie zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

✓ ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Wykonano adaptację pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 6 i 19 na pomieszczenia żłobka oraz dostarczono i zamontowano niezbędne wyposażenia. Opracowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla żłobków wraz z wyposażeniem oraz program funkcjonalno-użytkowy żłobków. Ponadto zakupiono 6 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby realizacji projektu.

2017

Na terenie żłobka miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 wydzielono teren zabaw ogrodzeniem wewnętrznym, wykonano plac zabaw, plac gospodarczy, ciąg pieszo-jezdny, wiatę śmietnikową, nasadzano krzewy. Na terenie żłobka miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 wydzielono teren zabaw ogrodzeniem wewnętrznym, wykonano plac manewrowy wraz z placem gospodarczym, plac zabaw, nasadzano krzewy.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	2 836 085	105 374	2 453 076	277 635	nd.
Fundusze strukturalne	771 079	0	771 079	0	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	27 214	0	27 215	0	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	0	0	0,00	nd.
Środki własne	2 037 791	105 374	1 654 782	277 635	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/%C5%BB%C5%82obek-szans%C4%85-na-rozw%C3%B3j-dziecka-i-aktywno%C5%9B%C4%87-zawodow%C4%85-rodzic%C3%B3w.aspx>

MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH⁴

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
KZGM	2017-2023	WIELE	ZAKOŃCZONY/REALIZACJA
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
W ramach zadania remontowane są budynki mieszkalne i użytkowe, wchodzące w skład miejskiego zasobu nieruchomości, które ze względu na swój stan techniczny oraz walory estetyczne wymagają prac modernizacyjnych.			
			✓ ŚRÓDMIEŚCIE
			✓ ZAWODZIE
			✓ ZAŁĘŻE
			✓ BOGUCICE
			✓ SZOPIENICE-BUROWIEC
			✓ JANÓW-NIKISZOWIEC
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			
Lokalizacja	2022 r.	2023 r.	
ul. 3 Maja 36	Zadanie zakończone w 2017 r.		
ul. Katowicka 48a, 50	Zadanie zakończone w 2016 r.		
ul. Morawa 119a	Zadanie zakończone w 2016 r.		
ul. Plebiscytowa 4, 4a	Zadanie zakończone w 2017 r.		
ul. Mikołowska 11, 13	Zadanie zakończone w 2016 r.		
ul. Szeligiewicza 3c	Zadanie zakończone w 2018 r.		
ul. Powstańców 7,9	Zadanie zakończone w 2020 r.		
ul. Gliwicka 148	Zadanie zakończone w 2016 r.		
ul. PCK 1	Zadanie zakończone w 2017 r.		
ul. Drzymały 13	Zadanie zakończone w 2017 r.		
ul. Warszawska 6 / Teatralna 9	Odstąpiono od realizacji zadania.		
ul. Warszawska 42	Odstąpiono od realizacji zadania.		
ul. Królowej Jadwigi 6	Odstąpiono od realizacji zadania.		
ul. Astrów 3/Różana	Zadanie zakończone w 2017 r.		
ul. Karola 3	Zadanie zakończone w 2020 r.		
ul. Bednorza 22	W związku z wystąpieniem robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć w momencie podpisywania umowy, nastąpiła konieczność przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.12.2021r. Odbiór końcowy bezusterkowy robót budowlanych nastąpił w dniu 25.02.2022r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone ze środków niewygasających z upływem 2021r.	nd.	
ul. Markiefki 64, 68	Zadanie zakończone w 2019 r.		
ul. Zespół zabytkowych budynków Szybu Poniatowski	Brak wykonanego zakresu rzeczowego.	Brak wykonanego zakresu rzeczowego.	

⁴ Status projektu różny w zależności od lokalizacji.


ul. Skłodowskiej 42	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji.	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Unieważniono dwa przetargi na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie w zakresie realizacji robót budowlanych zaplanowano do realizacji w 2024 r.
ul. Stawowa 8	Została opracowana dokumentacja i ogłoszone postępowanie publiczne. Wpłynęły oferty przekraczające wysokość środków, przeznaczonych na sfinansowanie zadania. Mimo zwiększenia środków na zadaniu, postępowanie zostało unieważnione i przesunięte na rok kolejny.	Została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu źródła ciepła w postaci pompy ciepła powietrze/woda wraz z wymianą i rozbudową instalacji c.o. oraz robotami elektrycznymi i remontem dachu budynku Komisariatu VI Policji. Roboty zostały zakończone, odbiór techniczny nastąpił w dniu 30.10.23r.
ul. Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1	Ogłoszone zostało postępowanie konkursowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji. Oferty znacznie przewyższyły środki finansowe, zadanie zostało przesunięte na rok kolejny.	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Trwa opracowanie dokumentacji.

DANE FINANSOWE				
Lokalizacja	Łączne wykonanie finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.
OGÓŁEM	21 253 355			
ul. 3 Maja 36	2 079 645		Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Katowicka 48a, 50	1 986 580		Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. Morawa 119a	1 582 424		Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. Plebiscytowa 4, 4a	807 769		Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Mikołowska 11, 13	513 200		Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. Szeligiewicza 3c	701 404		Zadanie zakończone w 2018 r.	
ul. Powstańców 7,9	1 256 826		Zadanie zakończone w 2020 r.	
ul. Gliwicka 148	350 150		Zadanie zakończone w 2016 r.	
ul. PCK 1	4 374 516		Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Drzymały 13	474 784		Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Warszawska 6 / Teatralna 9	nd.		Odstąpiono od realizacji zadania.	
ul. Warszawska 42	nd.		Odstąpiono od realizacji zadania.	
ul. Królowej Jadwigi 6	nd.		Odstąpiono od realizacji zadania.	
ul. Astrów 3/Różana	93 553		Zadanie zakończone w 2017 r.	
ul. Karola 3	4 256 846		Zadanie zakończone w 2020 r.	
ul. Bednorza 22	1 763 051	1763051	0	nd.
ul. Markiefki 64, 68	134 836		Zadanie zakończone w 2019 r.	
Zespół zabytkowych budynków Szybu Poniatowski	97 495	7 183 197	nd.	nd.
ul. Skłodowskiej 42	58 794	0	47 035	11 759
ul. Stawowa 8	721 483	0	34 738	686 745
ul. Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1	0	0	0	0






Karola 3 – przed modernizacją (1)

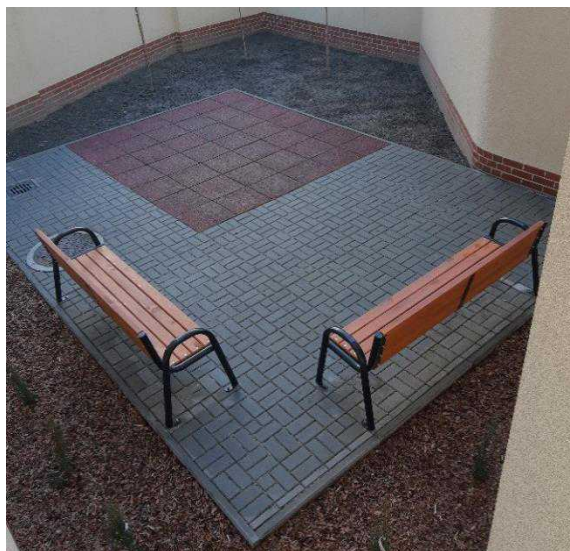

Karola 3 – po modernizacji (1)



Karola 3 – przed modernizacją (2)

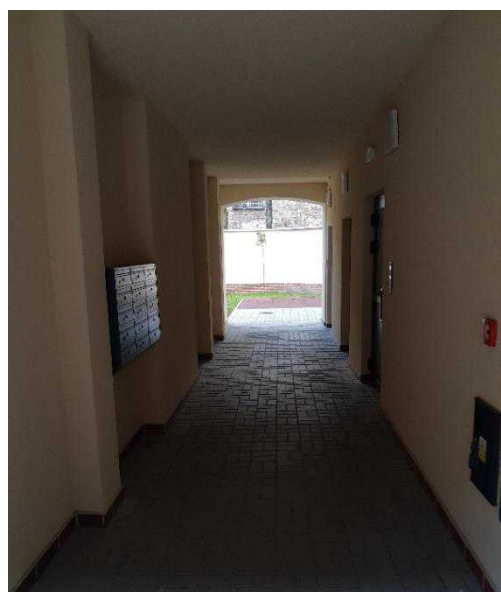

Karola 3 – po modernizacji (2)



Szeligiewicza 3c – przed modernizacją



Szeligiewicza 3c – po modernizacji

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE-KOMUNALNE

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2009-2017

LOKALIZACJA

ul. Kordeckiego 3, 4;
ul. Obr. Westerplatte 42-50

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował budowę obiektów mieszkalnych.

W ramach inwestycji przy ul. Kordeckiego 3 i Kordeckiego 4 wyburzono stare budynki w miejscu, w którym powstał nowy, funkcjonalny budynek mieszkalny. Obiekt posiada cztery kondygnacje. W każdej z klatek budynku znajduje się po 11 mieszkań, w tym po dwa mieszkania na parterze i po trzy mieszkania na pozostałych trzech kondygnacjach.

W ramach inwestycji przy ul. Obrońców Westerplatte - w trzech budynkach usytuowanych jest łącznie 45 lokali mieszkalnych: 18 lokali trzypokojowych o powierzchni użytkowej ok. 60 m², 18 lokali dwupokojowych o powierzchni użytkowej ok. 48 m², 9 lokali jednopokojowych o powierzchni użytkowej ok. 40 m².

Projekt współfinansowany był ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

ul. Kordeckiego 3,4 – trwały roboty budowlane. Ze względu na odstąpienie wykonawcy od umowy w dniu 25.07.2016 r. zaszła konieczność zlecenia dokończenia budowy. W wyniku przetargu publicznego, w dniu 29.11.2016 r. została zawarta umowa z wyłonionym wykonawcą robót z terminem zakończenia do 09.04.2017 r.

ul. Obr. Westerplatte 42-50 - w wyniku przetargu publicznego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, z którym w dniu 15.02.2016 r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do 15.11.2017 r. Z uwagi na konieczność przeprojektowania zagospodarowania terenu, sieci zewnętrznych oraz rzędnych posadowienia 2 budynków, przesunięto część wydatków na 2017 r., niewykorzystanych w 2016 r.

2017

ul. Kordeckiego 3b, 4b - zakończono budowę 22 mieszkań. W dniu 11.05.2017 r. została wydana decyzja na użytkowanie budynku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap - zakończono budowę 45 mieszkań. W dniu 08.11.2017 r. została wydana decyzja na użytkowanie trzech budynków. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	11 967 662,00	2 791 574,00	4 842 396,00	4 333 692,00	nd.
Fundusze strukturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Środki własne	11 967 662,00	2 791 574,00	4 842 396,00	2 404 842,03	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<http://www.kzgm.katowice.pl/aktualnosci/3739-nowoczesnie-modnie-i-wygodnie>

<http://www.kzgm.katowice.pl/aktualnosci/3762-nowe-mieszkania-nad-rawa>



ul. Kordeckiego 3,4 - stare budynki



ul. Obrońców Westerplatte 42, 44, 46



Wnętrza lokali



ul. Kordeckiego 3b, 4b - nowe budynki

MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OPARCIU O PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2018-2022

LOKALIZACJA

UL. ŚW. JANA 9,
UL. SIENKIEWICZA 17

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY/REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje zadania remontowe w budynkach komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

Lokalizacja	2022 r.	2023 r.
ul. Św. Jana 9	Podpisana została w dniu 30.06.2022 umowa na wykonanie remontu budynku usługowo-mieszkalnego, z terminem zakończenia do dnia 01.03.2023r.	Zakończono realizację zadania.
ul. Sienkiewicza 17	Zadanie zakończone w 2020 r.	

DANE FINANSOWE

Lokalizacja	Łączne wykonanie finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.
OGÓŁEM	1 488 257 zł			
ul. Św. Jana 9	1 382 777 zł	41 108 zł	1 341 669 zł	nd.
ul. Sienkiewicza 17	105 480 zł	Zadanie zakończone w 2020 r.		



Budynek przy ul. Św. Jana 9 – stan po

REMONT I MODERNIZACJA ORAZ WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW DYDAKTYCZNYCH I PRACOWNI DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADACH NAUKOWYCH W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

ŚLĄSKIE TECHNICZNE
ZAKŁADY NAUKOWE

LATA REALIZACJI

2015 - 2018

LOKALIZACJA

UL. SOKOLSKA 26

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2015

Przygotowano studium wykonalności.

2016

W okresie sprawozdawczym rozliczono umowę na wykonanie projekt budowlanego po wykonaniu ekspertyzy przeciwpożarowej, zakupiono frezarki CNC oraz dwie tokarki numeryczne, dostosowano budynek do przepisów p.poż. oraz osób niepełnosprawnych.

2017

W okresie sprawozdawczym wykonano remont dachu oraz sal tym m.in.: wymieniono posadzki, stolarkę drzwiową i okienną, wykonano tynki, instalacje elektryczne. Zamówiono obrabiarki CNC.

2018

W okresie sprawozdawczym dostarczono i zainstalowano 2 tokarki, 1 centrum obróbcze, 3 maszyny CNC oraz przeprowadzono szkolenie w zakresie ich obsługi dla 5 osób; zakończono prace budowlane we wszystkich pracowniach przewidzianych do remontu w ramach projektu; zmodernizowano instalację elektryczną, wykonano nową instalację informatyczną oraz instalację ewakuacyjną i hydrantową.

OBSZAR

ZDEGRADOWANY

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	3 549 561	1 398 794	2 150 767,00	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	2 312 698	858 696	1 454 002,41	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	0	0	0	nd.	nd.
Środki własne	1 236 863	540 098	696 764,59	nd.	nd.

SOS SZKOLENIA OTWARTYCH SZANS

PODMIOT REALIZUJĄCY

ŚTZN / MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016 - 2018

LOKALIZACJA

UL. SOKOLSKA 26

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego poprzez powiązanie systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy, jak również poprzez poprawę wyników egzaminów maturalnych i zawodowych. Projekt przewidywał realizację zajęć dodatkowych, kursów, praktyk i staży uwzględniających specyficzne potrzeby firm. Zawody, w jakich kształcili się uczniowie objęci wsparciem w ramach projektu to: technik elektronik, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik mechanik, technik mechatronik, technik informatyk i technik energetyk. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

OBSZAR ZDEGRADOWANY

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2017

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zajęcia grupowe i indywidualne z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 60 uczniów; zakończono szkolenie pierwszej grupy uczniów (11 osób) AutoCAD - podstawa; zakupiono 17 zestawów komputerowych, projektor i ekran projekcyjny do przeprowadzenia szkolenia AutoCAD 2D, AutoCAD 3D oraz Inventor; zrealizowano szkolenia z zakresu AutoCAD dla 11 nauczycieli i 36 uczniów; zakupiono meble do pracowni AutoCAD; wybrano wykonawcę na wykonanie instalacji stanowiskowej elektrycznej i teleinformatycznej; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

2018

Wykonano instalację elektryczną i teleinformatyczną w pracowni do rysunku technicznego komputerowego i odręcznego, zakupiono brakujące wyposażenie (krzesła szafy, tablice); zakończono kurs z zakresu rysunku komputerowego - Auto Cad 3D i Inwestor dla uczniów; przeprowadzono zajęcia dla 68 uczniów (8 grup) w ramach kursu programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie; zakupiono materiały eksploatacyjne wykorzystywane w ramach kursów i staży przez uczniów objętych projektem; zrealizowano staże dla uczniów w ramach projektu.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	525 427	267 296	258 131	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	432 697	223 544	209 153	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	50 943	26 337	24 606	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	0	0,00	0,00	nd.	nd.
Środki własne	41 786	17 415	24 371	nd.	nd.

DOPOSAŻENIE PRACOWNI OBRÓBKI MECHANICZNEJ ORAZ REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRACOWNI WARSZTATÓW SZKOLNYCH ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

ŚLĄSKIE TECHNICZNE
ZAKŁADY NAUKOWE

LATA REALIZACJI

2019

LOKALIZACJA

UL. SOKOLSKA 26

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował wykonanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię komunikacji w języku obcym oraz sterowników PLC i WS13 (część przeznaczona pod montaż maszyn): otynkowanie i malowanie ścian, wykonanie posadzki, obudowanie instalacji płytami g-k, wykonanie ścian działowych, remont parapetów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej, wykonanie sufitów, przebudowa części instalacji elektrycznej, a także zakup 3 urządzeń sterowanych numerycznie z wyposażeniem (frezarka CNC szt. 2 i tokarka CNC szt. 1) oraz 8 maszyn konwencjonalnych z wyposażeniem (4 tokarki i 4 frezarki). Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

OBSZAR

ZDEGRADOWANY

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2019

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania (doposażono pracownię obróbki mechanicznej m.in. o maszyny skrawające konwencjonalne; ukończono pracownię komunikacji w języku obcym oraz prace budowlane w pomieszczeniach warsztatów szkolnych); prace zostały odebrane.



Sala wykładowa



Sala do zajęć praktycznych

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 449 273	nd.	nd.	1 449 273	nd.
Fundusze strukturalne	962 078	nd.	nd.	962 078	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	nd.	nd.	0,00	nd.
Pożyczki i kredyty	0	nd.	nd.	0,00	nd.
Środki własne	487 196	nd.	nd.	487 196	nd.

SOS_2 SZKOLENIA OTWARTYCH SZANS

PODMIOT

ŚLĄSKIE TECHNICZNE
ZAKŁADY NAUKOWE

LATA REALIZACJI

2019 - 2020

LOKALIZACJA/LOKALIZA

UL. SOKOLSKA 26

STATUS

ZAKOŃCZONY

OBSZAR ZDEGRADOWANY

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

OPIS PROJEKTU

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów ŚTZN poprzez realizację staży zawodowych oraz kursów umożliwiających nabycie nowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje (kurs SEP, AutoCad, INVENTOE, programowanie sterowników PLC, doradztwo zawodowe, obsługa maszyn skrawających); doskonalenie zawodowe nauczycieli; adaptacja pomieszczenia na potrzeby pracowni języka obcego zawodowego; zakup wyposażenia, narzędzi i sterowników.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2019

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dostawę narzędzi skrawających do maszyn HAAS; 62 godzinny kurs operatora maszyn skrawających konwencjonalnych (po 32 godziny dla każdej z dwóch grup); zajęcia z obsługi maszyn skrawających konwencjonalnych dla 18 uczniów i nauczycieli; kurs AutoCAD podstawowy dla uczniów wraz z egzaminem w wymiarze 30 godzin dla każdej z trzech 12 osobowych grup; kurs AutoCAD podstawowy dla 6 nauczycieli języków obcych zawodowych w wymiarze 30 godzin; kurs z zakresu SEP dla 20 uczniów wraz z egzaminem; 8 godzin zajęć z doradztwa zawodowego grupowego dla 48 uczestników; rozpoczęto zajęcia z doradztwa zawodowego, obsługi maszyn skrawających konwencjonalnych i AutoCada dla uczniów; zakupiono materiały szkoleniowe oraz pręty aluminiowe; 16 uczniów odbyło staż w ramach projektu w zakładach pracy; kurs INVENTOR dla 6 nauczycieli języków obcych zawodowych oraz dla 36 uczniów; kurs obsługi maszyn CNC; kurs z zakresu programowania sterowników PLC; dostosowano i wyposażono pomieszczenia na potrzeby pracowni komunikacji w języku obcym.

2020

W okresie sprawozdawczym zorganizowano zajęcia grupowe i indywidualne z doradztwa zawodowego; zakończono kurs z zakresu programowania i obsługi sterowników PLC dla uczniów i nauczycieli; zrealizowano kurs SEP wraz z egzaminem dla uczniów w formie online; przeprowadzono kurs online z zakresu programowania i obsługi sterowników PLC oraz diagnostyki sterowników PLC; przeprowadzono staże dla uczniów; wypłacono stypendia dla uczniów; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.



Zestaw komputerowy wraz z stanowiskiem dydaktycznym wykonanym z wykorzystaniem sterowników PLC

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	625 983	nd.	238 889	387 094	nd.
Fundusze strukturalne	500 295	nd.	187 418	312 877	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	58 860	nd.	22 051	36 809	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
odki własne	66 828	nd.	29 420	37 408	nd.

SOS_3 SZKOLENIA OTWARTYCH SZANS

PODMIOT

ŚLĄSKIE TECHNICZNE
ZAKŁADY NAUKOWE

LATA REALIZACJI

2020-2022

LOKALIZACJA

UL. SOKOLSKA 26

STATUS

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia min. 60 uczniów poprzez realizację staży u pracodawców, kursów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje, rozwój kompetencji kluczowych doradztwo zawodowe oraz wyposażenie i adaptacja laboratoriów i pracowni szkoły.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2020

W okresie sprawozdawczym wyłoniono Kierownika Projektu oraz Specjalistę ds. Wdrażania Projektu; przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu; zakupiono pręty aluminiowe związane z odbywaniem kursu CNC oraz rozesłano zapytania ofertowe na zakup narzędzi CNC frezarskich i tokarskich na potrzeby realizacji kursów - operator maszyn skrawających konwencjonalnych i CNC.

2021

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kursy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych, w których udział wzięło 53 uczniów i 6 nauczycieli; zakupiono narzędzia frezarskie i tokarskie, materiały do obróbki, odczynniki oraz naczynia laboratoryjne, 2 spawarki inwertorowe TIG AC/DC, 4 spawarki elektrodowe MMA, przecinarkę, 2 spawarki MIG/MAG/MMA, 22 przyłbice i fartuchy spawalnicze, materiały spawalnicze, 5 zestawów tablic interaktywna z projektorem typu short, urządzenia wykonawcze do pracowni PLC wraz z narzędziami do ich instalacji.

2022

W okresie sprawozdawczym zorganizowano kursy: wykorzystywanie nowoczesnych metod analizy spektroskopowej w wybranych zagadnieniach analityki z zakresu ochrony środowiska oraz produktów żywnościowych z egzaminem wewnętrznym (8 uczestników), dla kandydatów na uczelnie wyższe ITC na poziomie zaawansowanym (14 uczestników), spawania metodą MIG/MAG dla nauczycieli (6 uczestników), wykorzystywanie nowoczesnych metod analizy chromatograficznej w wybranych zagadnieniach analityki z zakresu ochrony środowiska oraz produktów żywnościowych z egzaminem wewnętrznym (8 uczestników), dla kandydatów na uczelnie wyższe z matematyki i fizyki na poziomie zaawansowanym (42 uczestników), kurs spawania dla uczniów metodą MMA (12 uczestników), kurs z języka angielskiego zaawansowanego (14 uczestników), z zakresu SEP (20 uczestników); przeprowadzono zajęcia dla 3 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 4 uczniów i 3 nauczycieli odbyło staże zawodowe; poniesiono wydatki związane z obsługą (w tym finansowo-księgową) projektu.

OBSZAR

ZDEGRADOWANY

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCIE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	1 037 418 zł	757 086 zł	280 332 zł	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	806 167 zł	573 043 zł	312 877	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	94 850 zł	67 420 zł	36 809	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	136 400 zł	116 622 zł	37 408	nd.	nd.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W ZAWODZIU (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MOPS + NGO	2015 - 2017	UL. ŁĄCZNA 2-4	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU Projekt obejmował zadania związane z: diagnozą potrzeb mieszkańców wybranego obszaru dzielnicy Zawodzie i zasobów całej dzielnicy, działaniami realizowanymi w ramach aktywnej integracji (pozyskanie i wyszkolenie lokalnych liderów, wsparcie animatora lokalnego, organizacja warsztatów umiejętności społecznych), wolontariatem, działaniami o charakterze środowiskowym.			PODOBSZAR REWITALIZACJI
			ŚRÓDMIEŚCIE
			✓ ZAWODZIE
			ZĄŁĘŻE
			BOGUCICE
			SZOPIENICE-BUROWIEC
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			JANÓW-NIKISZOWIEC

2016

Program był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”. Zrealizowano następujące działania:

- 149 spotkań animacji lokalnej z mieszkańcami,
- 66 spotkań ze specjalistą ds. wolontariatu z wolontariuszami,
- cykl szkoleń wyjazdowych dla liderów lokalnych – cztery szkolenia dla 14 uczestników oraz wyjazdowa wizyta studyjna, w której udział wzięło 11 uczestników,
- trening umiejętności społecznych dla 13 uczestników, zorganizowano i współorganizowano wydarzenia lokalne, takie jak: spotkanie wielkanocne w Klubie 13 Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla 49 mieszkańców (w tym 11 uczestników Programu); Dzień Rodzica w Światlicy Specjalistycznej nr 5 - dla 40 mieszkańców; „Herbatka Sąsiedzka na Łącznej”; „Herbatka Sąsiedzka na Boh. Monte Cassino”; „Herbatka Sąsiedzka na Gwiazdach” i „Dzielnicowe Śniadania na Trawie” – w każdym z wydarzeń udział wzięło około 100 mieszkańców dzielnicy, w tym uczestnicy Programu; festyn z okazji Świątowych Dni Młodzieży dla około 200 mieszkańców; gra terenowa „Poznajemy Zawodzie” – dla 24 mieszkańców (w organizację gry zaangażowało się 15 uczestników Programu i 3 przedstawicieli instytucji lokalnych); II Dni Zawodzia dla około 500 mieszkańców;
- wsparło mieszkańców w realizacji inicjatywy lokalnej „Razem dla Rawy” – wydarzenie skierowane było do około 200 mieszkańców, w organizację zaangażowało się 14 uczestników Programu;
- wyjścia integracyjne – 11 wyjść dla uczestników Programu i ich najbliższego otoczenia oraz spotkania integracyjno-edukacyjne, m.in.: warsztaty fotograficzne, pieczenia chleba i bułek, relaksacyjne.

2017

W Programie wzięło udział 77 osób. Animatorzy lokalni przeprowadzili 234 spotkania z mieszkańcami, specjalista ds. wolontariatu przeprowadził 51 spotkań z wolontariuszami. Odbyły się 73 spotkania integracyjno-edukacyjne - warsztaty fotograficzne, rękodzieła, florystyczne, makijażu, szycia, stylizacji, treningi z trenerem personalnym, spotkania z dietetykiem, Grupa Praktyków Społecznych, warsztaty rozwojowe. Przeprowadzono cykl szkoleń wyjazdowych dla liderów lokalnych, zorganizowano wyjazdową wizytę studyjną. Zorganizowano i współorganizowano następujące wydarzenia lokalne:

- II Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy;
- gra terenowa „Poszukiwacze Skarbów”;
- tworzenie muralu przy ul. Łącznej, „Sąsiedzkie Zumbowisko”;
- gra terenowa „Zombie Szpil”;
- „Andrzejki”;
- Impreza Mikołajkowa;
- spotkanie świąteczne.

Współorganizowano III Dni Zawodzia. Animatorzy lokalni wsparli mieszkańców w przygotowaniu i realizacji inicjatyw lokalnych oraz w realizacji projektu w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	470 304	90 039	189 128	191 137	nd.
Fundusze strukturalne	467 304	90 039	186 128	191 137	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	nd.
Pożyczki i kredyty	0	0	0	0	nd.
Pozostałe środki krajowe	3 000	0	3 000	0	nd.



Rysunek 55 Spotkanie świąteczne 2017



Rysunek 53 Śniadanie na trawie 2016

DODATKOWE INFORMACJE

<https://mocnirazem.org/2017/12/30/cal-zawodzie/>
<https://pl-pl.facebook.com/CALZawodzie/>

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W ZAWODZIU (W RAMACH PROJEKTU PN. DAMY RADĘ! PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ W KATOWICACH)

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MOPS + NGO	2018 - 2020	UL. ŁĄCZNA 2-4	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
Projekt obejmował zadania związane z: diagnozą potrzeb mieszkańców wybranego obszaru dzielnicy Zawodzie i zasobów całej dzielnicy, działaniami realizowanymi w ramach aktywnej integracji (pozyskanie i wyszkolenie lokalnych liderów, wsparcie animatora lokalnego, organizacja warsztatów umiejętności społecznych), wolontariatem, działaniami o charakterze środowiskowym.			ŚRÓDMIEŚCIE
			✓ ZAWODZIE
			ZAŁĘŻE
			BOGUCICE
			SZOPIENICE-BUROWIEC
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			JANÓW-NIKISZOWIEC

2018

W ramach Programu Aktywności Lokalnej w Zawodziu – Partner, Stowarzyszenie „Mocni Razem” w 2018 roku zrealizował następujące działania: 175 spotkań animatorów lokalnych z mieszkańcami, 74 spotkań w ramach Klubu Wolontariusza, 28 spotkań integracyjno-edukacyjnych (warsztaty plastyczne, zdrowego żywienia oraz taneczne), 7 wydarzeń lokalnych o charakterze integracyjnym, 2 stacjonarne treningi kompetencji i umiejętności społecznych, kurs kwalifikacyjny wraz z certyfikacją, 2 wyjazdy w formie wizyt studyjnych, 4 wyjścia integracyjne dla uczestników projektu oraz ich otoczenia. Zrealizowano w ramach projektu usługi: asystenta rodziny (wsparcie 22 rodzin), poradnictwa pedagogicznego (12 osób), poradnictwa terapeutycznego (12 osób), asystenta osoby bezdomnej oraz usługę streetworkingu.

W ramach kompleksowego wsparcia osób borykających się z problemem uzależnień realizowanego przez partnera, Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii zrealizowano:

- 140 godzin spotkań z zakresu diagnozy i budowy Indywidualnego Planu Wsparcia,
- 428 godzin terapii indywidualnej i 300 godzin terapii grupowej w ramach wyjazdów grupowych,
- 192 godzin z treningów rozwojowo-korekcyjnych.
- 106 kursów zawodowych - 1281 godzin indywidualnych oraz 180 godzin grupowych spotkań z doradcą zawodowym w ramach Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy.

W ramach Klubu Integracji Społecznej realizowanego przez partnera, Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego zrealizowano rekrutację do trzech edycji KIS, z których wyłoniono 28 osób. Odbyły się spotkania uczestników z doradcą zawodowym oraz psychologiem (60h), warsztaty z zakresu umiejętności społecznych (140h), warsztaty z zakresu budowania przedsiębiorczości (40h), a także spotkania indywidualne w zakresie pośrednictwa pracy, treningu pracy, doradztwa zawodowego i konsultacji psychologicznych.

2019

W ramach Programu Aktywności Lokalnej w Zawodziu – Partner, Stowarzyszenie „Mocni Razem”, w 2019 roku zrealizował następujące działania:

- 135 spotkań animatorów lokalnych z mieszkańcami,
- 46 spotkań w ramach Klubu Wolontariusza.
- kurs kwalifikacyjny wraz z certyfikacją,
- 31 spotkań edukacyjno-integracyjnych (warsztaty taneczne, animacyjne oraz językowe),
- 3 wyjścia integracyjne w ramach Klubu Mam,
- wydarzenia lokalne - bieg „Damy radę” oraz „Bieg Mikołajkowy”.

Zrealizowano w ramach projektu usługi: asystenta rodziny (objął wsparciem 42 rodziny), pedagoga (objął wsparciem 24 osoby), terapeuty (objął wsparciem 32 osoby), asystenta osoby bezdomnej oraz usługę streetworkingu (objął wsparciem 38 osób) oraz kompleksowego wsparcia osób borykających się z problemem uzależnień realizowanego przez partnera - Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii. Partner udzielił 41 godzin terapii indywidualnej oraz zorganizował 39 kursów/szkoleń przygotowujących do zawodu, które były organizowane głównie we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

W ramach Klubu Integracji Społecznej realizowanego przez partnera, Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, zrealizowano:

- 50 godzin warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego,
 - 40 godzin warsztatów z zakresu umiejętności społecznych,
 - 30 godzin warsztatów z zakresu budowania postawy przedsiębiorczej,
 - 45 godzin warsztatów z zakresu treningu motywacyjnego,
 - 120 godzin indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym,
 - 72 godziny indywidualnych konsultacji z psychologiem,
 - 78 godzin indywidualnych spotkań z trenerem pracy,
 - 220 godzin indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy.
- Ponadto zorganizowano szkolenia zawodowe dla 15 osób oraz staże zawodowe dla 5 osób.

2020

W ramach Programu Aktywności Lokalnej w Zawodzie – Partner, Stowarzyszenie „Mocni Razem”, w 2020 roku zrealizował następujące działania:

- 139 spotkań animatorów lokalnych z mieszkańcami stacjonarnych oraz spotkań online m. in. pomoc w nauce świadczona przez wolontariuszy z Uniwersytetu Ekonomicznego,
- 51 spotkań w ramach Klubu Wolontariusza (w tym 28 spotkań online),
- 4 stacjonarne treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników,
- 40 spotkań integracyjno-edukacyjnych,
- 2 wyjazdy edukacyjne w formie wizyt studyjnych,
- wydarzenie lokalne pn.: „Zawodziańska wyprawa rowerowa” oraz „II Bieg Damy Radę”,
- inicjatywa „Sprzątamy dzielnicę”.

Zrealizowano w ramach projektu usługi: asystenta rodziny, pedagoga (objął wsparciem 27 osób), terapeuty (objął wsparciem 36 osób), asystenta osoby bezdomnej oraz usługę streetworkingu (objął wsparciem 20 osób). W ramach kompleksowego wsparcia osób borykających się z problemem uzależnień realizowanego przez partnera - Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii zrealizowano wsparcie dla 39 osób z zakresu diagnozy i budowy Indywidualnego Planu Wsparcia, 300 godzin terapii indywidualnej, 360 godzin treningów rozwojowo-korekcyjnych, 112 kursów zawodowych oraz szkoleń, 138 godzin indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, 2 grupowe Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, wsparcie animatora zatrudnienia i staży w wymiarze 160 godzin miesięcznie, wsparcie opiekuna szkoleń w wymiarze średnio 80 godzin miesięcznie, 2 grupowe wyjazdy terapeutyczne.

W ramach Klubu Integracji Społecznej realizowanego przez partnera, Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego zrealizowano: 64 godzin konsultacji psychologicznych, 8 godzin grupowego treningu pracy, 62 godziny indywidualnego pośrednictwa pracy.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	671 494	193 857	241 990	235 647	nd.
Fundusze strukturalne	550 897	166 437	187 918	196 542	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pozostałe środki krajowe	120 597	27 420	54 072	39 105	nd.

KATOWICKI SYSTEM ZINTEGROWANYCH WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH – WĘZEŁ „ZAWODZIE”

PODMIOT

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015 - 2020

LOKALIZACJA

OKOLICE PĘTLI UL. 1 MAJA,
BAGIENNEJ I KRAKOWSKIEJ

STATUS

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt zakładał budowę węzła przesiadkowego, z zachowaniem regulacji prawnych dot. poziomów hałasu. Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia przesiadek pomiędzy komunikacją autobusową i tramwajową oraz przesiadek z komunikacji indywidualnej na tramwaj i uzyskanie funkcji Park&Ride. Projekt ma na celu rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018/2019

Realizowano roboty budowlane.

2020

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania w zakresie wynikającym z umowy o dofinansowanie.

OBSZAR

ZDEGRADOWANY

ŚRÓDMIEŚCIE

✓ ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Centrum Przesiadkowe „Zawodzie”



Centrum Przesiadkowe „Zawodzie” – widok od strony torowiska

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	102 705 656 ⁵	22 632 371	33 554 290	29 489 669	50 159
Fundusze strukturalne	53 805 030	9 987 742	17 462 120	14 586 935	0
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	nd.
Pożyczki i kredyty	24 697 844	4 450 000	11 550 000	8 697 844	0
Środki własne	24 202 782	8 194 629	4 542 170	6 204 890	50 159

⁵ W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł

PRZEBUDOWA UL. 1 MAJA NA ODCINKU OD UL. STASZICA DO ISTNIEJĄCEJ PĘTLI TRAMWAJOWEJ W KATOWICACH-ZAWODZIU

PODMIOT

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2010-2012;
2014-2016

LOKALIZACJA

UL. 1 MAJA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

✓ ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC


JANÓW-NIKISZOWIEC

OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na przebudowie ulicy 1 Maja od skrzyżowania z ulicą Staszica do pętli tramwajowej w dzielnicy Zawodzie w Katowicach. Zakres przebudowy obejmował:

- ulicę wraz z chodnikami, ścieżką rowerową i wjazdami, miejscami postojowymi, zatokami autobusowymi;
- kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi;
- oświetlenie uliczne;
- sieć teletechniczną;
- zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym rozwiązaniem zgodnie z otrzymanymi warunkami i uzgodnieniami;
- nowe nasadzenia, elementy małej architektury;
- docelową organizację ruchu i organizację ruchu na czas robót.

Modernizacja ulicy 1 Maja polegała na przywróceniu pierwotnego przekroju poprzecznego poprzez wykonanie poszerzeń jezdni w miejscu istniejących peronów tramwajowych oraz zachowanie na całym odcinku szerokości pasa ruchu 6,25 m. Projekt zakładał wykonanie korekty przebiegu drogi, nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, ciągów pieszo-rowerowych, wjazdów, zatok autobusowych, miejsc postojowych. W zakresie mieściła się również przebudowa odwodnienia, oświetlenia i instalacji technicznej (zgodnie z uzgodnieniami branżowymi) oraz wykonanie przejazdu przez torowisko tramwajowe w ul. 1 Maja w rejonie ul. Marcinkowskiego.

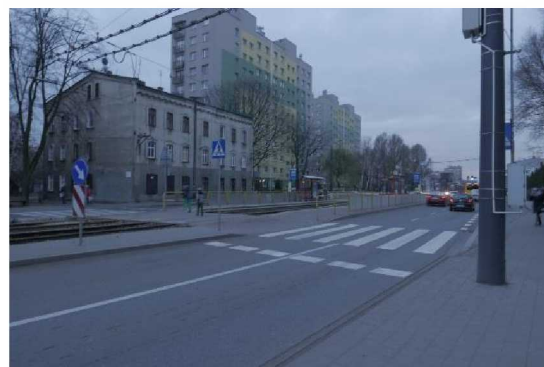

Ul. 1 Maja

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2014/2015

Realizowano i zakończono roboty budowlane. Trwało postępowanie w sprawie obniżenie wartości gruntu (położenie kabli) w ramach inwestycji.

2016

Środki zaplanowano na wypłatę jednorazowego odszkodowania w związku z obniżeniem wartości gruntu, jednak wycofano się z zawarcia umowy dotyczącej stanu prawnego, z uwagi na brak stanowiska Spółdzielni Mieszkaniowej w kwestii wysokości kosztów.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	11 512 729	11 512 729	0	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	7 285 328	7 285 328	0	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	0	0	0	nd.	nd.
Pozostałe środki krajowe	4 227 401	4 227 401	0	nd.	nd.

Cyfrowa Eksplozja Wiedzy – przebudowa i adaptacja pomieszczenia pod supernowoczesną pracownię multimedialno-edukacyjną w MDK „Bogucice-Zawodzie” wraz z jej wyposażeniem

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2017-2018

LOKALIZACJA

UL. MARCINKOWSKIEGO 13

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na przebudowie/adaptacji/remontie pomieszczenia po dawnym dziale księgowości w Dziale „Zawodzie” MDK „Bogucice-Zawodzie” na potrzeby stworzenia supernowoczesnej pracowni multimedialno-edukacyjnej wraz z jej profesjonalnym wyposażeniem komputerowym. Powstanie i uruchomienie pracowni umożliwiło stworzenie innowacyjnej i adekwatnej do potrzeb oferty edukacyjnej, z której skorzystać mogą mieszkańcy dzielnicy, w każdym wieku.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2017/2018

W związku z zawieszeniem z urzędu w 2017 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę pomieszczeń, przesunięto rzeczową realizację zadania na rok następny. W 2018 r. wykonano prace budowlane w ramach adaptacji pomieszczeń pod pracownię multimedialną. Wyposażono pracownię w meble oraz sprzęt komputerowy i multimedialny. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

✓ ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Sala zajęć



Lokalizacja projektu

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	111 000	6 612	104 388	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	0	0	0	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	0	0	0	nd.	nd.
Środki własne	111 000	6 612	104 388	nd.	nd.

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE - ETAP VIII C

PODMIOT

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2018; 2021-2022

LOKALIZACJA

UL. KAROLA MIARKI 6

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował termomodernizację budynku LO X.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

✓ ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2020

W okresie sprawozdawczym przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

2021

Realizowano roboty budowlane.

2022

Zakończono termomodernizację budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. K. Miarki 6.



Budynek X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego – po termomodernizacji

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2023 r.
Razem wydatki	4 265 738	3 161 510 zł	1 104 228 zł	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	1 483 120	1 211 336 zł	271 784 zł	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	156 647	124 672 zł	31 975 zł	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	0	0	0	nd.	nd.
Pozostałe środki krajowe	2 625 972	1 825 502 zł	800 470 zł	nd.	nd.

CENTRUM SPOŁECZNOŚCIOWE - "NASZE ZAŁĘŻE" - I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY

MOPS + ZESPÓŁ SZKÓŁ I
PLACÓWEK NR 2

LATA REALIZACJI

2017 - 2020

LOKALIZACJA

UL. ZARĘBSKIEGO 2

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował przystosowanie terenu pod organizację imprez plenerowych, modernizację ścieżki oraz stworzenie strefy dostosowanej do dzieci w wieku 2-10 lat oraz osoby starsze. Historyczna oś Parku będzie pełnić rolę edukacyjną. Głównymi elementami Parki będzie strefa rodzinna - plac zabaw wraz z miejscem dla imprez plenerowych, urządzenia do ćwiczeń oraz stoliki do szachów zakończone strefą ogródków sąsiedzkich.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2017

Podjęto działania związane z zatrudnieniem kadry realizującej zadania (ogłoszono nabór na animatorów lokalnych), organizacją projektu tj. przygotowaniem dokumentacji projektowej, promocji projektów, przygotowaniem do realizacji działań projektowych itp. Przeprowadzono remont i adaptację Centrum Społecznościowego „Nasze Załęże” - przygotowano miejsce do realizacji projektu. Dokonano prac remontowo-wykończeniowych tj. wymianę instalacji elektrycznej, remont podłogi, malowanie ścian, zakup usługi. Zorganizowano wraz z uczniami i pracownikami ZSiP2 Wieczornicę, na którą zakupiono poczęstunek w formie cateringu oraz przygotowano Barbórkę dla mieszkańców Załęża przez uczniów i pracowników SP 22.

2018

W wyniku prowadzonej rekrutacji zatrudniono 2 animatorów lokalnych. Prowadzono zajęcia w ramach Klubu, w tym także zajęcia muzyczno-taneczne. Udział w zajęciach brały dzieci i młodzież, zwłaszcza te, których na co dzień dotyczą negatywne skutki związane z bezrobociem rodziców czy problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Odbyły się spotkania terapeutyczne z uczestnikami projektu w ramach terapii dla podopiecznych i ich rodzin oraz wyjścia integracyjne dla uczęszczających do Klubu (do kina, do parku trampolin). W ramach projektu przeprowadzony został Dzień Otwarty Centrum Społecznościowego „Nasze Załęże”. Prowadzono działania związane z organizowaniem społeczności lokalnej. Łącznie odbyło się 30 spotkań animatora ze społecznością lokalną. Ponadto, odbyło się 14 spotkań w ramach Klubu Rodzica. W ramach powyższych działań odbyły się warsztaty plastyczne, warsztaty szydełkowania, warsztaty stylizacji i szycia fartuchów, warsztaty robienia naturalnych kosmetyków i zajęcia z rodzicami pt.: „Jak dbać o relację na linii rodzic – dziecko?”. Prowadzone przez Centrum Społecznościowe „Nasze Załęże” działania środowiskowe obejmowały współorganizację „Dnia Matki – Prywatka - lata 60”, Turnieju Piłki Nożnej „VI Turniej Fair Play” przy Zespole Szkół nr 7, Festynu Rodzinnego przy ZSiP2, Pikniku Rodzinnego przy Szkole Podstawowej nr 22. W ramach działań środowiskowych odbył się także „Dzień śląski”.

Ponadto, zorganizowano pokaz kina plenerowego oraz imprezę towarzyszącą z okazji Dni Załęża. Zorganizowano imprezy integracyjne, w tym piknik integracyjny dla rodzin, „Wieczornicę, czyli andrzejkowe spotkanie po zmierzchu”, rodzinne spotkanie z Mikołajem, imprezę z okazji Barbórki. W grudniu odbył się uroczysty występ chóru Gospel, a także spotkanie świąteczne. Ponadto odbyły się trzy edycje „Szafingu na Załężu” – imprezy mającej na celu wymianę odzieży, książek i innych przedmiotów przez mieszkańców Załęża. Od października do grudnia 2018 roku prowadzono także działania kulturalne. Odbyły się m.in. spotkania z autorami książek oraz warsztaty literacko-artystyczne dla dzieci.

2019

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 121 uczestników. W ramach działań środowiskowych wspierających potencjał i integrację społeczności zorganizowano wydarzenia lokalne i integracyjne jak: impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka. W lutym 2019 roku odbyła się zabawa karnawałowa dla mieszkańców Załęża. W czerwcu zorganizowano „Bieg o Puchar Jana Pawła II”. Ponadto odbyło się kino plenerowe. W lipcu odbył się letni cykl pikników, warsztaty kosmetyczne, plenerowe warsztaty tworzenia bransoletek i zdobienia paznokci. W sierpniu odbył się piknik sąsiedzki na zakończenie lata, zorganizowano także wydarzenie pn. „Zrób coś dla innych – zupa na Załężu dla potrzebujących”. Z kolei we wrześniu odbyła się pierwsza Załęska Gra Miejska pn. „Odkrywanie historii dzielnicy”. W listopadzie został zorganizowany „Andrzejkowy wieczór w Załężu”. W grudniu odbyły się „Uroczyste obchody Barbórki” oraz spotkanie wigilijne.

Zrealizowano 13 inicjatyw mieszkańców Załęża, m.in.: zajęcia z jogi, „Sąsiedzki piknik na zakończenie lata”, „Jesienna Biesiada w Załężu” połączona ze „Świętem Kartofla”, „Warsztat szycia świątecznych poduszek” oraz „Uroczyste strojenie choinki”. Ponadto odbyło się: 65 spotkań z animatorem lokalnym oraz 16 spotkań w ramach Klubu Rodzica, które obejmowały warsztaty rozwojowe prowadzone przez profesjonalnego coacha, wyjście integracyjne do kina oraz spotkania promujące efektywny sposób spędzania czasu wolnego, również z dziećmi. W listopadzie został zorganizowany Trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych.

Bardzo istotnym aspektem projektu było rozpoczęcie w październiku cyklu szkoleń w ramach Akademii Lidera Społeczności Lokalnej. W okresie od października do grudnia odbyło 7 spotkań. Zrealizowane szkolenia dotyczyły m.in. takich zagadnień jak komunikacja interpersonalna, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, współpraca międzyinstytucjonalna i skuteczna realizacja inicjatyw lokalnych. Ważnym elementem projektu było także utworzenie Punktu Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej dla mieszkańców dzielnicy. Osoby zainteresowane skorzystały z indywidualnego poradnictwa psychologicznego i dietetycznego. Łącznie udzielono 54 godzin poradnictwa psychologicznego oraz 40 godzin poradnictwa dietetycznego.

W ramach działań prowadzonych przez Zespół Szkół i Placówek nr 2 z Katowic prowadzono cykliczne zajęcia w ramach klubu społecznościowego dla dzieci i młodzieży, w tym także zajęcia muzyczno-taneczne i sportowe. Udział w zajęciach brały dzieci i młodzież, zwłaszcza te, których na co dzień dotyczą negatywne skutki związane z bezrobociem rodziców czy problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Łącznie odbyło się prawie 70 spotkań. Ponadto, zorganizowano 2 wyjścia integracyjne do kina oraz zajęcia sportowe w kręgielni. Odbyły się również spotkania terapeutyczne z zainteresowanymi mieszkańcami Załęża w ramach terapii dla podopiecznych i ich rodzin. W ramach projektu prowadzono także szereg działań kulturalnych uzupełniających ofertę wsparcia w projekcie. Zorganizowano m.in. następujące działania: warsztaty żydowskiej wycinanki, spotkanie pt. „Zawód archeolog”, warsztaty graficzne, warsztaty literacko – artystyczne.

2020

Do końca 2020 roku zrealizowano 28 inicjatyw mieszkańców Załęża:

- spotkanie dotyczące bezpiecznych ferii,
- warsztat tworzenia walentynkowych ramek na zdjęcia,
- akcję pn.: „Stop Dopalaczom”, którą współorganizowano z Miejską Izbą Wyrzeźwien i Ośrodkiem Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach,
- warsztat tworzenia flowerboxów techniką scrapbookingu,
- akcję pn.: „Kolorowe okna”, którą współorganizowano z Stowarzyszeniem Zielone Załęże,
- 3 akcje pn.: „Zupa dla potrzebujących”, którą współorganizowano z Wspólnotą Dobrego Pasterza (Klubem „Wysoki Zamek”),
- rewitalizację (odnowę) podwórka mieszącego się przy Klubie Wysoki Zamek, wspólnie ze Wspólnotą Dobrego Pasterza (Klubem „Wysoki Zamek”) i Stowarzyszeniem Zielone Załęże,
- „III Załęski Rajd Rowerowy”,
- opracowano „Felieton o Załężu wyobraźnią pisany” wspólnie z Radą Jednostki Pomocniczej nr 7 z okazji jubileuszu 660-lecia powstania dzielnicy,
- „Rodzinny turniej piłki nożnej” wspólnie z Zespołem Szkół i Placówek nr 2,
- 3 kina plenerowe,
- wycieczka dla załęskich seniorów do Raciborza,
- „IV Załęski Rajd Rowerowy”,
- akcję pn.: „Kawa na ławę” wspólnie z Klubem Wysoki Zamek,
- „Piknik na Zakończenie Lata”,
- warsztaty integracyjno-edukacyjne pn.: „Budujemy pewność siebie”,
- „Stop śmieciom” wspólnie z Miejskim Przedszkolem nr 26 im. M. Mroza w Katowicach,
- dwukrotnie odbyły się „Mistrzostwa Załęskich Seniorów w Darcie”.
- finał wydarzenia pn.: „Załęska Kapsuła Czasu 2020”.

Ponadto odbyły się 43 spotkania z animatorem lokalnym. W ramach spotkań zorganizowano m.in. malowanie na szkle, filcowanie maskotek, wspólne śniadanie i podwieczorek dla mieszkańców Załęża. Stałym elementem spotkań z animatorem były warsztaty Koła Gospodyń Załęskich. Odbywały się cykliczne spotkania z liderami społeczności lokalnej. W czasie trwania pandemii, kiedy wszyscy pozostawali w domach, zorganizowano wiele działań online, takich jak: „Konkurs wiosenny”, wirtualne krzyżówki, konkurs „Talentów czas”, „Kawa z animatorem online” oraz warsztaty z rękodzieła.

W okresie letnim w wyniku ograniczeń wprowadzonych z powodu pandemii odbywały się liczne zajęcia w plenerze. Ważnym wydarzeniem w dzielnicy zorganizowanym w ramach spotkań z animatorem było wydarzenie pt.: „Rendez-vous dla małżonków”, podczas którego przybyłe na spotkanie osoby mogły skorzystać z uroczystej kolacji i porozmawiać o metodach komunikacji i sposobach okazywania swoich uczuć. Ciekawym i inspirującym wydarzeniem było „Podsumowanie działań projektu Centrum Społecznościowe Nasze Załęże – I etap”. Podczas spotkania animatora z uczestnikami projektu przeprowadzono rozmowy dotyczące wszystkich działań i inicjatyw, które udało się zrealizować w czasie trwania projektu. Ponadto odbyło się 12 spotkań w ramach Klubu Rodzica. Działania obejmowały warsztaty z podstaw tworzenia biżuterii, wyjście integracyjne do kina oraz spotkanie z wykwalifikowanym kosmetykiem. W okresie letnim dwukrotnie zorganizowano warsztaty malowania akrylami, warsztaty tworzenia świec parafinowych i ekologicznych mydeł glicerynowych, zorganizowano „Trening umiejętności wychowawczych i rodzicielskich”.

W ramach Akademii Lidera Społeczności Lokalnej odbyły się 2 wizyty studyjne. Ważnym elementem projektu była także działalność Punktu Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej dla mieszkańców dzielnicy. Osoby zainteresowane skorzystały z indywidualnego poradnictwa psychologicznego (udzielono 34 godziny takiego poradnictwa), prawnego (20 godzin) i dietetycznego (23 godziny). Odbyło się także 10 poradnictw online z zakresu kreowania wizerunku (łącznie 40 godzin) oraz 64 godziny poradnictwa kosmetycznego. Ponadto odbyły się 3 spotkania pozwalające na skorzystanie z poradnictwa online z zakresu pedagogiki, dbania o swoje emocje i radzenia sobie ze stresem.

W ramach programu wspierającego rozwój zawodowy mieszkańców Załęża. Cykl spotkań i doradztwa ma na celu pomóc osobom bezrobotnym powrócić na rynek pracy. Zadanie realizowane jest przez Fundację Stałego Rozwoju z Nowego Sącza. W ramach zadania zrekrutowano 17 uczestników, 14 z nich zdobyło kwalifikacje zawodowe (m.in. pracownik biurowy i pracownik budowlany). Ponadto zrealizowano 102 godziny doradztwa zawodowego (każdy z uczestników odbył 6-godzinne indywidualne doradztwo), 48 godzin grupowych warsztatów aktywizacyjnych (warsztaty dotyczyły m.in. kształtowania aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, wzmocnienia automotywacji, pracy nad dokonywaniem zmian w życiu), 16 godzin treningu umiejętności społecznych w zakresie wzmocnienia samooceny, 16 godzin grupowego treningu umiejętności społecznych w zakresie doskonalenia komunikacji i motywacji, 48 godzin grupowych warsztatów psychologicznych oraz 408 godzin indywidualnego treningu pracy.

W ramach działań prowadzonych przez Zespół Szkół i Placówek nr 2 z Katowic prowadzono cykliczne zajęcia w ramach klubu społecznościowego dla dzieci i młodzieży, w tym także zajęcia sportowe. Łącznie odbyło się ponad 30 spotkań. Odbyły się również spotkania terapeutyczne z zainteresowanymi mieszkańcami Załęża w ramach terapii dla podopiecznych i ich rodzin. W ramach projektu prowadzono także szereg działań kulturalnych uzupełniających ofertę wsparcia w projekcie. Zorganizowano m.in. warsztaty literacko-artystyczne dla dzieci i warsztaty literacko-teatralne z Teatrem Trip (w formule online).



„Rajza na kole” – sierpień 2020



Rewitalizacja podwórka - czerwiec 2020

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	972 259	228 549	272 987	470 722	nd.
Fundusze strukturalne	847 204	183 088	244 174	419 942	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	99 743	21 511	28 814	49 418	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	25 311	23 950	0	1 361	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100057865231096>

CENTRUM SPOŁECZNOŚCIOWE - "NASZE ZAŁĘŻE" – II ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY

MOPS + ZESPÓŁ SZKÓŁ I
PLACÓWEK NR 2

LATA REALIZACJI

2020 - 2022

LOKALIZACJA

UL. ZARĘBSKIEGO 2

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zadania związane z: organizowaniem warsztatów edukacji społecznej oraz szkoleń m.in. z zakresu planowania i realizowania inicjatyw lokalnych, a także wydarzeń i spotkań o charakterze edukacyjno-integracyjno-animacyjnym; organizację spotkań grup samopomocowych oraz spotkań społeczności lokalnej.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2020

W dniu 30 października 2020 r. rozpoczęto realizację projektu. Zaangażowano do pracy 2 animatorów lokalnych, którzy rozpoczęli działania zmierzające do rekrutacji uczestników do projektu, dokonali analizy zastanej po I etapie sytuacji społecznej w dzielnicy oraz zaplanowali działania merytoryczne do realizacji w 2021 r.

2021

W ramach projektu zrealizowano:

- 13 inicjatyw lokalnych m.in. „Pierwszy Dzień Wiosny” (konkurs plastyczny „Wiosna na Załężu” oraz warsztaty sadzenia kwiatów). W inicjatywach lokalnych łącznie wzięło udział ok. 150 osób,
- 5 imprez integracyjnych, czyli wyjazd na paintball do „Utopii” w Rudzie Śląskiej, piknik dla dzieci, kino plenerowe, wydarzenie towarzyszące „Dniom Załęża” oraz Bal Andrzejkowy,
- 45 spotkań z animatorem lokalnym m.in. warsztaty rękodzielnicze. Mieszkańcy Załęża uczestniczyli w konkursie krzyżówkowym na temat dzielnicy, w wieczorach planszówek oraz spotkaniach Klubu Książki. Odebrali się również warsztaty z układania kompozycji kwiatowych. W Załężu miał także miejsce piknik w domowym zaciszu, piknik rodzinny oraz śniadanie na trawie.
- spotkanie w ramach Treningu Umiejętności Rodzicielskich i Wychowawczych,
- 20 spotkań w ramach Klubu Aktywnych Kobiąt, w których wzięły udział 53 osoby. Odebrali się m.in. spotkanie z brafitterką, zajęcia taneczne oraz arteterapia z malowania emocjonalnego. Miały miejsce wyjścia integracyjne, a także wyjścia do NOSPR-u oraz Teatru Śląskiego,
- 28 spotkań w ramach Klubu Społecznościowego „Senior w działaniu”, w których łącznie uczestniczyło około 60 osób. W ramach spotkań zorganizowano m.in. warsztaty online z tworzenia wełnianych i świątecznych ozdób. Ponadto zorganizowano „Senioralny Dzień Kobiąt”, w trakcie którego załęskie seniorki mogły odebrać poczęstunek oraz drobny prezent.
- 21 spotkań w ramach „Seniora w podróży”, w których uczestniczyło około 65 osób. Seniorzy odwiedzili katowickie dzielnice Wełnowiec-Józefowiec, Dąb oraz Zadole, spacerowali także po Załężu i Nikiszowcu. Odebrali się również spacer m.in. do Parku Kościuszki. Seniorzy odwiedzili także Tarnowskie Góry, Żywiec, Stadion Śląski i Palmiarnię w Gliwicach.
- 8 spotkań „Seniora w akcji”, w ramach których zorganizowano „Senioralną Grę Terenową”, tworzenie mebli z europalet, 2 edycje wymiany doświadczenia kulinarnego pn. „Przepysznik”, warsztaty robienia na drutach i szydełkowania oraz zajęcia z kisenia. W zajęciach uczestniczyło 41 osób,
- w ramach działań realizowanych przez Zespół Szkół i Placówek nr 2 do końca 2021 r. realizowano wydarzenia sportowe, prowadzono zajęcia w ramach klubu społecznościowego dla dzieci i młodzieży (sportowe i animacyjne). Pracę w środowisku prowadził także streetworker, który spotykał się z dziećmi na Placu im. Londzina, placu zabaw przy ZSiP nr 2 oraz na piknikach i imprezach organizowanych na terenie dzielnicy,

Projekt „Centrum społecznościowe Nasze Załęże – II etap” w zakresie zadania „Działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie” realizowany jest przez Filię nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. W 2021 r. prowadzono szereg działań kulturalnych (m.in. koncert piosenki poetyckiej Grzegorza Paczkowskiego „Kiedy już wrócę”, koncert piosenki francuskiej w wykonaniu Joanny Moździan, „Opowieści od serca” - warsztaty literacko-artystyczne prowadzone przez Mateusza Świstaka, spotkanie pn. „Jak z posiadacza mózgu stać się jego właścicielem. Joga z książką. Warsztaty Lidii Machaj „Płomyk”, wernisaż wystawy Karoliny Kaźmierkiewicz). Zorganizowano także wernisaż wystawy prac podopiecznych ŚDS nr 2 pt. „Zimowe impresje”.

PODOBZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

2022

W ramach projektu zrealizowano:

- 32 spotkania z animatorem, które obejmowały m.in.: zajęcia rękodzielnicze, wyjście do chorzowskiego Ogrodu Świąteł, integracyjne spotkanie z animatorami pn.: „Pora na pączka”, zorganizowano zajęcia z linorytu, wyjście integracyjne do kina, wyjście na lodowisko, do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, Planetarium oraz do Jump City. Odbyły się również „Śniadania na trawie”, które zorganizowano na zrewitalizowanym Placu Londzina, warsztaty ogrodnicze przeprowadzone przez Fundację „Ogrody Przyszłości” mające na celu zazielenienie terenu wokół Klubu Wysoki Zamek, wyjście integracyjno-edukacyjne do Jump City, wyjścia do escape roomu, paintball, wyjścia do Teatru Rozrywki w Chorzowie,
- 33 spotkania w ramach Klubu „Aktywnych Kobiet”, które obejmowały m.in. spotkania liderki społeczności lokalnej obejmujące planowanie działań i aktywności na kolejne miesiące, spotkania warsztatowe dotyczące tworzenia biżuterii z żywicy epoksydowej i mozaiki ze szkła witrażowego, warsztaty lasu i plaży w słoiku, warsztaty kulinarne oraz spotkania, podczas których uczestniczki tworzyły makramy. Zorganizowano warsztaty z tworzenia świec zapachowych, kremów naturalnych i warsztaty rozwoju osobistego pn. „Kobiety rozmowy”.
- prowadzono regularnie poradnictwa dietetyczne, podologiczne, psychologiczne oraz z zakresu kreowania wizerunku,
- zorganizowano kurs „I pomocy przedmedycznej”,
- 8 imprez integracyjnych: „Piknik rodzinny”, który odbył się w Klubie Wysoki Zamek, „Piknik rodzinny w ZSiP nr 2”, podczas którego celebrowano Dzień Dziecka. Dodatkowo odbył się „Dzień Dziecka na Załęskich Tarasach” oraz „Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 22”. Odbyły się również 2 seanse kina plenerowego, zorganizowano ognisko dla mieszkańców oraz wydarzenie towarzyszące „Dniom Załęża” (warsztaty tworzenia biżuterii),
- odbyło się 17 inicjatyw lokalnych zaplanowanych i realizowanych przez mieszkańców, m.in.: „Dzień Śląski”, organizowany wspólnie z Zespołem Szkół nr 7, podczas którego odbyło się przedstawienie muzyczno-artystyczne poświęcone Śląskowi i „Kolorowe okna”, czyli coroczna akcja organizowana wraz ze Stowarzyszeniem „Zielone Załęże”, w ramach której mieszkańcy sadzili kwiatki do drewnianych donic,



Gimnastyka na trawie – lipiec 2022 r.



Warsztaty las w słoiku - czerwiec 2022 r.

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2023 r.
Razem wydatki	1 087 596	391 704	695 892	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	921 905	315 808	606 097	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	0	nd.	nd.
Środki własne	165 690	75 896	89 794	nd.	nd.

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE - ETAP II

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2014 - 2020

LOKALIZACJA

UL. GLIWICKA 74A

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCIE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Zawarto umowę o dofinansowanie projektu

2019


Realizowano roboty budowlane.

2020

W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. ul. Gliwickiej 74a.



Gliwicka 74A – budynek po modernizacji (1)

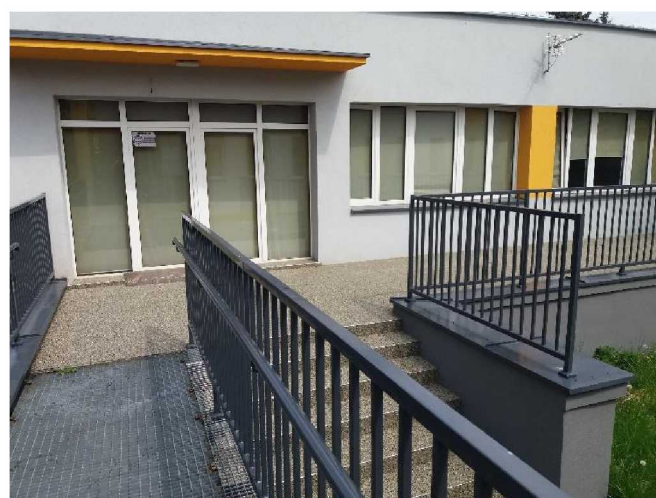

Gliwicka 74A – budynek po modernizacji (2)

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	1 458 345	1 461	990 724	466 160	nd.
Fundusze strukturalne	550 010	667	496 410	52 932	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Pozyczki i kredyty	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	908 335	794	494 314	413 227	nd.

REWITALIZACJA PLACU LONDZINA

PODMIOT REALIZUJĄCY

ZZM

LATA REALIZACJI

2017 - 2019

LOKALIZACJA

UL. GLIWICKA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował przystosowanie terenu pod organizację imprez plenerowych, modernizację ścieżki oraz stworzenie strefy dostosowanej do dzieci w wieku 2-10 lat oraz osoby starsze. Historyczna oś Parku będzie pełnić rolę edukacyjną. Głównymi elementami Parku będzie strefa rodzinna - plac zabaw wraz z miejscem dla imprez plenerowych, urządzenia do ćwiczeń oraz stoliki do szachów zakończone strefą ogródków sąsiedzkich.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018


Dokonano płatności ostatniej raty za wykonanie studium wykonalności.

2019


Wykonano wszystkie prace budowlane zgodnie z projektem, który zakładał zagospodarowanie parku: budowę nowych oraz przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, budowę miejsca pod organizację imprez plenerowych, budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej oraz strefy ogródków sąsiedzkich, zagospodarowanie elementami małej architektury ze szczególnym naciskiem na elementy edukacyjne oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnację roślinności wysokiej i niskiej.

DANE FINANSOWE


Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	2 035 751	25 500	1 500	2 008 751	nd.
Fundusze strukturalne	1 176 288	21 675	1 275	1 153 338	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	138 387	2 550	150	135 687	nd.
Pożyczki i kredyty	nd.	nd.	0	0	nd.
Środki własne	721 076	1 275	75	719 726	nd.

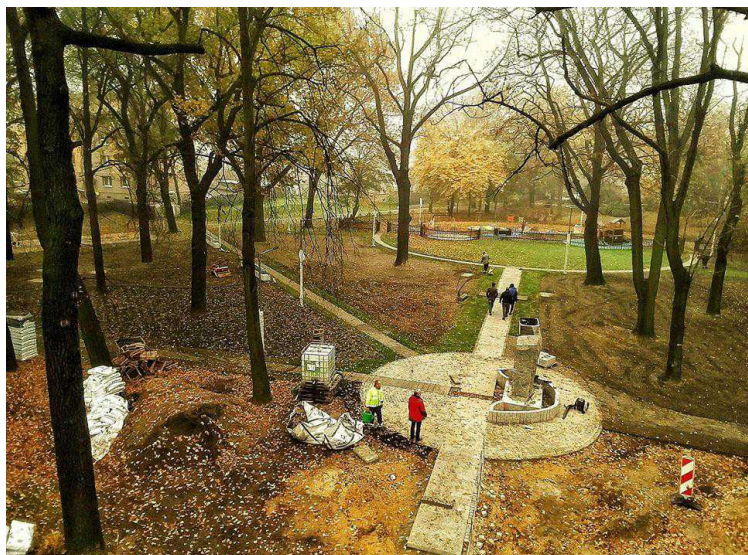

Plac Londzina – prace budowlane (1)
(źródło: Pracownia AMAYA ARCHITEKCI)

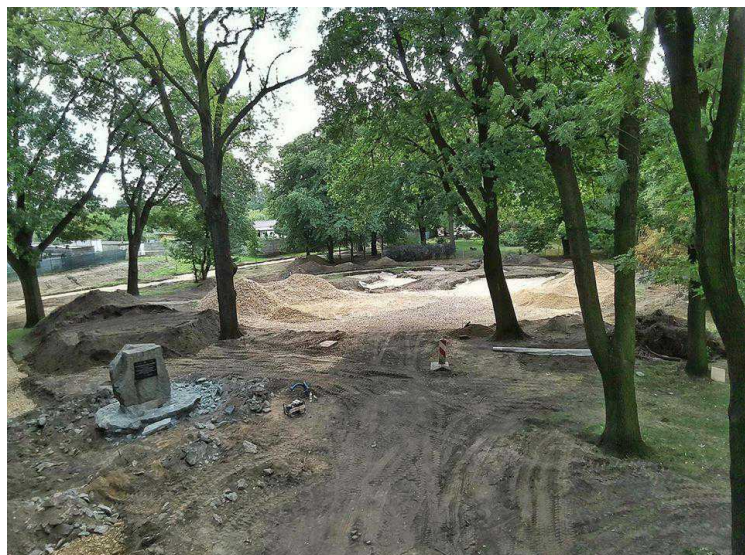

Plac Londzina – prace budowlane (2)
(źródło: Pracownia AMAYA ARCHITEKCI)

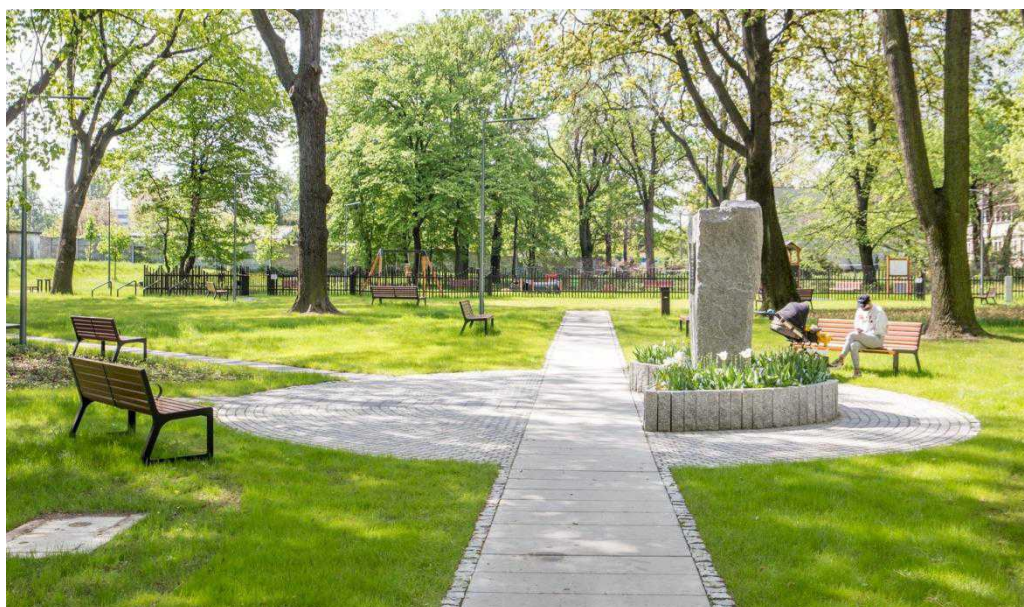

Plac Londzina – efekt końcowy (1)



Plac Londzina – efekt końcowy (2)

RESILIENT EUROPE - WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ELASTYCZNOŚCI MIEJSKIEJ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016 - 2018

LOKALIZACJA

DZIELNICA ZAŁĘŻE

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było zaproponowanie mechanizmów i instrumentów umożliwiających przezwyciężenie sytuacji kryzysowej obszaru Załęża w wymiarze społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i środowiskowym. Efektem projektu będzie opracowanie Zintegrowanego Planu Działania dla obszaru Załęża przy współpracy z powołaną Lokalną Grupą Urbact.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Zorganizowano spotkanie członków projektu w Katowicach; wyjazd służbowy 3 pracowników Urzędu Miasta i 3 członków LGU do Holandii; wykonano tłumaczenie pism z języka polskiego na język angielski; poniesiono wydatki z tytułu uczestnictwa w projekcie; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu; dokonano płatności za wykonanie usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta wiodącego w projekcie; zakończono realizację umowy na opracowanie dokumentu pn. "Zmiany przestrzenne w dzielnicy Załęże w kontekście wzmacniania rezyliencji miejskiej"; wykonano materiały promocyjne z logiem projektu oraz zrealizowano film promocyjny.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC


JANÓW-NIKISZOWIEC



LEGENDA

- ul. Gliwicka - Główna arteria i oś dzielnicy
- Powiązania poprzeczne do ul. Gliwickiej (ulice, ciągi piesze, kładki)
- Planowane i potencjalne powiązania (ul. Nowogliwicka, powiązanie z dworcem PKP)
- Miejsca węzłowe wybrane do szczegółowej analizy
- Ważniejsze funkcje usługowe w rejonie węzłowych przestrzeni publicznych
- Potencjalne kształtowanie pierzei węzłowych przestrzeni publicznych
- • Przystanki tramwajowe i autobusowe

Schemat struktury systemu przestrzeni publicznych Załęża (element opracowania pt.: "Zmiany przestrzenne w dzielnicy Załęże w kontekście wzmacniania rezyliencji miejskiej")

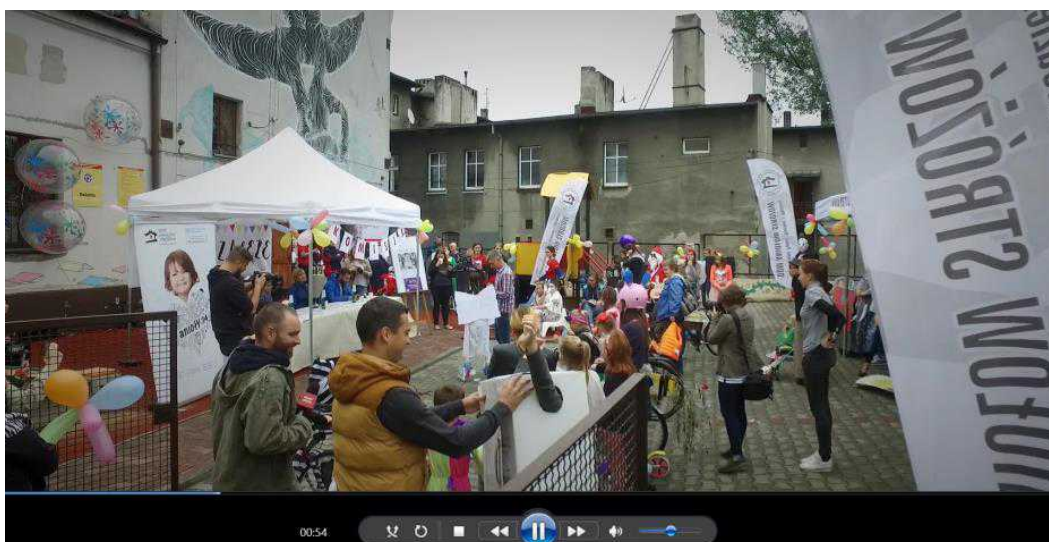

Kadr z filmu promującego projekt



DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	125 343	70 563	54 780	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	95 627	59 979	35 648	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	nd.	nd.
Pożyczki i kredyty	0	0	0	nd.	nd.
Środki własne	29 716	10 584	19 132	nd.	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

Broszura nt. projektu: http://www.katowice.eu/SiteAssets/Strony/Resilient-Europe/Broszura_PL.pdf
<https://urbact.eu/resilient-europe>

BUDOWA WODNYCH PLACÓW ZABAW W KATOWICACH (ul. Gliwicka)

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2018

LOKALIZACJA

UL. GLIWICKA 214

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt zakładał rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz urozmaicenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci w mieście Katowice, poprzez budowę wodnego placu zabaw przy ul. Gliwickiej 214 na obszarze parku w sąsiedztwie kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik”.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Zakres inwestycji obejmował budowę wodnego placu zabaw wraz z zapleczem technicznym mieszczącym technologię uzdatniania wody i zbiornik wyrównawczy, budowę zaplecza sanitarnego (kontenerowego), budowę oświetlenia terenu, wykonanie monitoringu wizyjnego, zagospodarowanie terenu, niezbędne przekładki i zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego kolidującego z zakresem zamówienia, budowę sieci i przyłączy niezbędnych do funkcjonowania obiektu.



Plan sytuacyjny



Wodny plac zabaw - Gliwicka 214

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 660 500	nd.	1 660 500	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	0	nd.	0	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	nd.	0	nd.	nd.
Środki kredytu	0	nd.	0	nd.	nd.
Środki własne	1 660 500	nd.	1 660 500	nd.	nd.

REMONT NAWIERZCHNI DRÓG OSIEDLOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. GLIWICKIEJ 218, 220, 222 ORAZ JANASA 7A I 15A (BO)

PODMIOT REALIZUJĄCY

MZUiM

LATA REALIZACJI

2020-2021

LOKALIZACJA

UL. GLIWICKA 93

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz budowę miejsc parkingowych.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2020

Opracowano dokumentację projektową.

2021

Zadanie zakończone i odebrane.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w 2021 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2021 r.
Razem wydatki	430 191	0	44 993	385 197	nd.
Fundusze strukturalne	0	0	0	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	nd.	nd.
Środki kredytu	0	0	0	nd.	nd.
Środki własne	430 191	0	44 993	385 197	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://bo.katowice.eu/Projekty/Strony/Remont-nawierzchni-dr%C3%B3g-osiedlowych-wraz-z-budow%C4%85-miejsc-postojowych-w-rejonie-budynk%C3%B3w-mieszkalnych-przy-ul--Gliwickiej-21.aspx>

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. GLIWICKIEJ 190 I 194

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2019-2022

LOKALIZACJA

UL. GLIWICKA 190 I 194

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2020



W roku 2020 wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia budowlane dla obu zadań. Ponadto ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

2021

W roku 2021 zadanie zostało przesunięte do realizacji w ramach projektów UE. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

2022

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dot. Termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194.

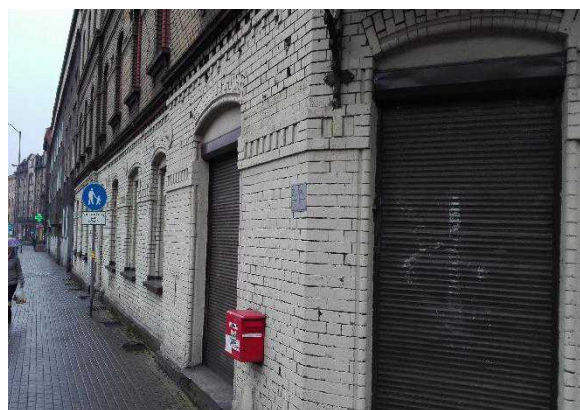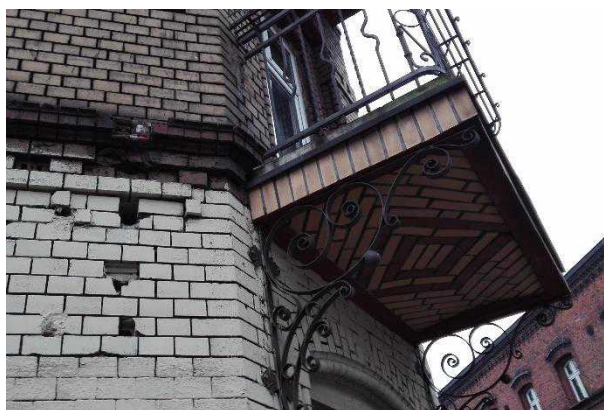

Budynki przy ul. Gliwickiej 190 i 194 – stan przed



Budynki przy ul. Gliwickiej 190 i 194 – stan po

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2023 r.
Razem wydatki	3 324 157	2 539 942	784 215	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	977 499	898 967	78 532	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki kredytu	1 276 001	1 276 001	0	nd.	nd.
Środki własne	1 070 657	364 974	705 683	nd.	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://kzgm.katowice.pl/aktualnosci/3980-gliwicka-190-i-194>

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. WOLNEGO 8, UL. ZAMENHOFA LUDWIKA 36-38, 36A-38A, 36B-38B W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MZUiM

LATA REALIZACJI

2020-2021

LOKALIZACJA

UL. GLIWICKA 93

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofs Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2019

Przedsięwzięcie przygotowane do realizacji, otrzymało dofinansowanie.

2020

W okresie sprawozdawczym realizowano zaplanowane roboty budowlane dot. budynków przy ul. Wolnego 8, Zamenhofs Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b, wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, roboty ociepleniowe, remonty dachów wraz z kominami i obróbkami blacharskimi. Zakończono kompleksowe remonty klatek schodowych, budowę wiat śmietnikowych i wykonano chodniki wokół budynków.

2021

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację robót budowlanych dot. termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8 oraz ul. Zamenhofs 36-38, 36a-38a, 36b-38b - zadanie zakończono.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC


JANÓW-NIKISZOWIEC



Wolnego 8 – budynek przed termomodernizacją



Wolnego 8 – budynek po termomodernizacji

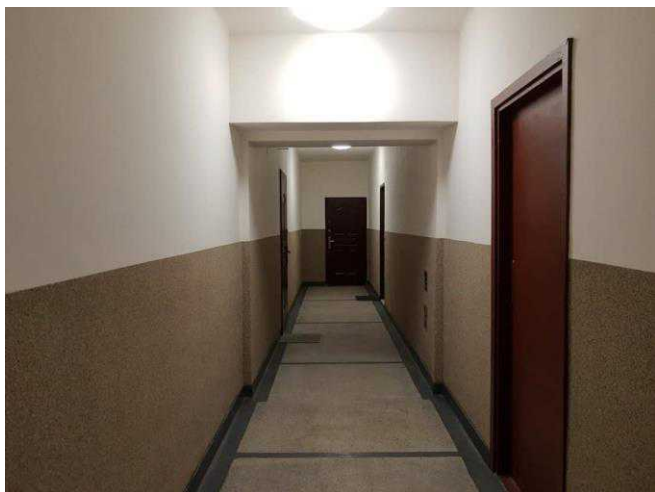

Wolnego 8 – korytarz po modernizacji



Wolnego 8 – klatka schodowa po modernizacji



Zamenhofa – przed modernizacją



Zamenhofa - po modernizacji

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w 2021 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2021 r.
Razem wydatki	5 298 195	138 362	4 366 433,72	793 400	nd.
Fundusze strukturalne	3 359 641	89 647	3 240 560	29 434	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	395 253	10 548	381 242	3 463	nd.
Środki kredytu	0	0	0	0	nd.
Środki własne	1 543 301	38 167	744 631	760 503	nd.

PRZEDŁUŻENIE UL. BAILDONA W KIERUNKU PLANOWANEJ UL. NOWOGLIWICKIEJ

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE	2015 - 2016	UL. BAILDONA	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU Projekt obejmował realizację drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.			PODOBSZAR REWITALIZACJI ZAWODZIE-PORCELANOWA ✓ DĄB-BAILDONA KOLONIA ALFRED WEŁNOWIEC-KONDUKTORSKA SZOPIENICE-WOŹNIAKA
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY 2015 W efekcie realizacji projektu wykonano: 1 037,63 m ² drogi oraz 379,55 m ² chodnika oraz most, w tym 104,64 m ² pow. asfaltowa płyty mostowej i 96,28 m ² chodnika.			
2016 Wyplacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami. Zakończono realizację zadania.			



Zakres projektu nr 92

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	2 513 218	2 080 908	432 310	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	0	0	0	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	nd.	nd.
Środki kredytu	0	0	0	nd.	nd.
Środki własne	2 513 218	2 080 908	432 310	nd.	nd.

BOGUCICE - MOJE MIEJSCE NA ZIEMI. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MOPS	2018 - 2020	UL. MARKIEFKI 68 UL. MARKIEFKI 64	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
Projekt obejmował zadania związane z: animacją lokalną, szkołą liderów lokalnych, Punktem Informacji Obywatelskiej, działaniami środowiskowymi wzmocniającymi potencjał społeczności lokalnej i jej mieszkańców, programem wspierającym reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Bogucice.			ŚRÓDMIEŚCIE
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			ZAWODZIE
2018			ZAŁĘŻE
Zatrudniono 2 animatorów lokalnych. W PAL Bogucice prowadzono szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej Bogucic. W ramach Programu odbyło się 15 spotkań ze społecznością lokalną, łącznie z 57 osobami. Zrealizowano inicjatywę lokalną pn. „Kolorowe podwórko” oraz piknik, jako zwieńczenie wcześniejszej inicjatywy. Zorganizowano również wydarzenie lokalne w ramach cyklu Sportowe Bogucice pn. „Rodzinny Piknik sportowy z postaciami z bajek”. Odbywały się spotkania w ramach Klubu Społecznościowego „Babska Strefa”. W okresie od października do grudnia odbyło się 13 spotkań. Podczas spotkań przeprowadzone zostały warsztaty rękodzieła, szycia, wytwarzania domowych kosmetyków, warsztaty kulinarne. Odbyło się zwiedzanie Muzeum Śląskiego, wyjście do kina. Zorganizowano wyjścia integracyjne. Mieszkańcy Bogucic mieli możliwość dwukrotnego uczestnictwa w spotkaniach edukacyjno-integracyjnych: z zakresu robienia naturalnych kosmetyków oraz tworzenia ozdób świątecznych. W ramach zadania: sportowe Bogucice w grudniu odbyło się wydarzenie zatytułowane: „Przedświąteczne bicie rekordu tańca ulicznego”. Nawiązano kontakt z młodzieżą i przedstawiono ofertę PAL, która jest dostępna w ramach Klubu Społecznościowego „Lokalna Strefa Młodych”.			✓ BOGUCICE
2019			SZOPIENICE-BUROWIEC
W ramach projektu prowadzono szereg działań na rzecz aktywizowania, wspierania i integrowania społeczności lokalnej. Wsparciem objętych zostało 40 uczestników. Animatorzy lokalni aktywnie uczestniczyli w życiu dzielnicy m.in. poprzez udział w wydarzeniach ważnych dla mieszkańców takich jak np. odsłonięcie muralu Jerzego Kukuczki czy odsłonięcie tablicy poświęconej również Jerzemu Kukuczce. Animatorzy rozpowszechniali także informacje o działalności Programu wśród instytucji działających na terenie Bogucic, tj. szkół, przedszkoli, MDK itp. oraz utrzymywali kontakt z mieszkańcami dzielnicy. Ponadto odbyły się: 23 spotkania ze społecznością lokalną, 37 spotkań w ramach Klubu Społecznościowego „Babska Strefa”, 25 spotkań Klubu Społecznościowego dla młodzieży pn. „Lokalna Strefa Młodych”, 7 spotkań edukacyjno-integracyjnych.			JANÓW-NIKISZOWIEC

W ramach działań środowiskowych zorganizowano „Akcję Zima”, na którą składały się takie wydarzenia jak wyjście na lodowisko, do wesołego miasteczka, zimowy trening piłkarski. Ponadto zorganizowana została „Akcja Lato”, w tym 2 treningi piłkarskie. Odbył się piknik rodzinny oraz projekcję kina plenerowego. Zorganizowano 5 wydarzeń w ramach „Sportowych Bogucic”. Ponadto odbyły się 2 edycje wydarzenia pod nazwą „Bogucki Szafing”, czyli bezpłatnej, sąsiedzkiej wymiany odzieży, książek oraz innych przedmiotów. Zorganizowano kawiarenkę naprawczą, podczas której mieszkańcy Bogucic przy wsparciu członków Stowarzyszenia Wolnej Herbaty z Katowic mieli możliwość naprawy zużytego sprzętu elektronicznego, ubrań itp. Odbyły się również warsztaty pn. „O herbacie przy herbacie” oraz „Lepimy Dzielnicę!”, warsztaty ze stylistką dotyczące m.in. doboru kolorów i warsztaty pn. „Wszystko o kawie”. W październiku wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 40 z Katowic zorganizowano „Święto Kartofla”.

W ramach wzmocnienia inicjatywy mieszkańców dzielnicy zorganizowano warsztaty szycia na maszynie oraz szycia ekologicznych toreb. Odbyła się również akcja pn. „Sprzątamy Bogucice”. W ramach inicjatywy mieszkańców odbyły się treningi koszykówki oraz siatkówki. Z inicjatywy mieszkańców odbył się również „Bieg dookoła Bogucic”. W połowie maja został otwarty „Bogucki PoDzielnik” – miejsce, z którego można bezpłatnie zabrać coś potrzebnego (np. odzież, książki), a zostawić coś, co przyda się drugiej osobie. W listopadzie dzielnicy zawiązała się także „Bogucka Grupa Biegowa”.

W marcu w ramach projektu rozpoczęły się spotkania z brokerem edukacyjnym, których celem było ustalenie Indywidualnego Planu Działania dla tych mieszkańców Bogucic, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Łącznie odbyło się 56 godzin spotkań z brokerem. Od lutego rozpoczęto realizację specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców, natomiast od kwietnia poradnictwa dietetycznego.

W ramach projektu prowadzono także szereg działań kulturalnych uzupełniających ofertę wsparcia w projekcie. Zorganizowano m.in. następujące działania: 12 edycji rodzinnych warsztatów plastycznych, 11 edycji integracyjnych warsztatów kulinarnych, 5 edycji integracyjnych spotkań ze znanymi ludźmi kultury, sztuki i nauki, 4 koncerty muzyczne, 12 spotkań z cyklu „Bery i bojki w godce ślunskiej” – spotkania z gwarą śląską, 5 prelekcji o historii Bogucic, warsztaty tańca break dance i hip hop.

2020

W związku z sytuacją związaną ze stanem epidemii niemożliwym był bezpośredni kontakt z mieszkańcami oraz instytucjami działającymi na terenie dzielnicy. Jednak animatorzy pozostawali do dyspozycji tych mieszkańców, którzy potrzebowali wsparcia w tej trudnej sytuacji m.in.: włączyli się w akcję szycia maseczek dla seniora oraz osobiście rozdawali maseczki seniorom. Ponadto odbyło się:

- 31 spotkań animatora ze społecznością lokalną m. in. spotkania warsztatowe oraz organizacja 10 konkursów w formie online. Konkursy dotyczyły m.in.: tworzenia ozdób świątecznych z materiałów wtórnych, aktywności na kwarantannie, fotografii,
- spotkanie wyjazdowe do Zamku Moszna,
- 18 spotkań stacjonarnych z uczestnikami Akademii Lidera Społeczności Lokalnej, w tym jedno wspólne spotkanie z uczestnikami Akademii Lidera w Centrum Społecznościowym „Nasze Załęże”,
- odbyły się 3 wizyty studyjne: do Częstochowy, Wrocławia i Katowic – Nikiszowiec (Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych), gdzie liderzy zapoznali się ze sposobem pracy placówek i działaniami realizowanymi przez nie na rzecz mieszkańców miasta,
- 34 spotkania w ramach Klubu Społecznościowego „Babska Strefa” warsztaty m. in. rękodzieła, ozdabiania świec, pielęgnacji twarzy oraz zajęcia fitness w Parku Boguckim. W ramach Babskiej Strefy panie udały się również do Wisły na letni kulig, wspólny spacer i góralski poczęstunek. Uczestniczki skorzystały także z możliwości wspólnego wyjścia do Teatru Rozrywki w Chorzowie,
- 30 spotkań Klubu Społecznościowego dla Młodzieży pn.: „Lokalna Strefa Młodych”. Tematyka spotkań była różnorodna, dotyczyła rękodzieła, fotografii czy wizażu. Dla grupy młodzieży zorganizowano także wyjścia, wyjazdy integracyjne, zajęcia z legorobotyki oraz warsztaty pn.: „Jak zostać Youtuberem – praca z kamerą”,
- zorganizowano „Akcję Zima”, na którą składały się 2 wydarzenia pikniki zorganizowane w Parku Boguckim. W ramach „Akcji Lato w Parku Boguckim” zorganizowano 3 pokazy kina plenerowego oraz przedstawienie dla dzieci wraz z animacjami. Odbyło się wydarzenie w ramach Sportowych Bogucic oraz zrealizowano również akcję – „Wakacje w parku”, podczas której ok. 140 mieszkańców rodzinie korzystało z atrakcji m.in. dmuchańców dla dzieci. W okresie letnim realizowano też cyklicznie zajęcia fitness i zajęcia Nordic Walking dla seniorów. Mieszkańcy wzięli również udział w Rajdzie Górskim do Brennej i okolic,
- zrealizowano 15 inicjatyw oddolnych zgłoszonych przez mieszkańców oraz 44 spotkania w ramach spotkań integracyjnych i edukacyjnych i warsztatów zainteresowań dla mieszkańców,
- pod koniec roku odbyły się spotkania wigilijne,
- odbyło się 10 edycji „Boguckiego PoDzielnika” – miejsca, z którego można bezpłatnie zabrać coś potrzebnego (np. odzież, książki), a zostawić coś, co przyda się drugiej osobie,

W ramach projektu mieszkańcy Bogucic skorzystali z poradnictwa specjalistycznego, m.in. z poradnictwa dietetycznego, które częściowo zostało zrealizowane w formie zdalnej (zrealizowano 150 godzin poradnictwa), drugim poradnictwem były porady prawne (zrealizowano 50 godzin). W czasie pandemii jednym z nowych form poradnictwa było poradnictwo z zakresu kreowania wizerunku. (zrealizowano 60 godzin poradnictwa). Innowacyjnym poradnictwem było poradnictwo z zakresu zdrowego stylu życia, prowadzone przez fizjoterapeutę (zrealizowano 120 godzin poradnictwa).

W ramach projektu realizowano także działania z zakresu aktywizacji zawodowej mieszkańców Bogucic. Zrealizowano 120 godzin doradztwa zawodowego dla 20 uczestników (każdy z uczestników odbył 6-godzinne indywidualne doradztwo), 48 godzin grupowych warsztatów aktywizacyjnych dla każdej z 2 grup uczestników (dwie grupy po 10 uczestników). Warsztaty dotyczyły m.in. kształtowania aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, wzmocnienia automotywacji, pracy nad dokonywaniem zmian w życiu, 16 godzin treningu umiejętności społecznych w zakresie wzmocnienia samooceny dla każdej z 2 grup, 16 godzin grupowego treningu umiejętności społecznych w zakresie doskonalenia komunikacji i motywacji dla każdej z 2 grup, 48 godzin grupowych warsztatów psychologicznych dla każdej z 2 grup, znaczna część uczestników uzyskała kwalifikacje (przeprowadzono m.in. kurs przedstawiciela handlowego wraz z egzaminami). Zadanie realizowane było w całości przez Fundację Stałego Rozwoju z Nowego Sącza.

W ramach projektu prowadzono także szereg działań kulturalnych uzupełniających ofertę wsparcia w projekcie. Zorganizowano następujące działania: 10 edycji rodzinnych warsztatów plastycznych, 9 edycji integracyjnych warsztatów kulinarnych, 4 edycje integracyjnych spotkań ze znanymi ludźmi kultury, sztuki i nauki, 5 koncertów muzycznych, 11 spotkań z cyklu „Bery i bojki w godce ślunskiej” – spotkania z gwarą śląską, 14 warsztatów tańca break dance i hip hop, 4 warsztaty fotograficzne, 3 prelekcje o historii Bogucic.



Warsztaty kulinarne z tworzenia przetworów świątecznych –
kwiecień 2020



Warsztaty rękodzieła z tworzenia mandali – marzec 2020



Działania środowiskowe - 2019



Organizowanie społeczności lokalnej - 2019

DANE FINANSOWE					
Wydatki	łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	1 594 744	145 165	477 491	972 088	nd.
Fundusze strukturalne	1 298 313	121 831	407 292	769 190	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	152 743	14 334	47 917	90 492	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	143 688	9 000	22 282	112 406	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.facebook.com/ProgramAktywnosciLokalnejBogucice>

BOGUCICE - MOJE MIEJSCE NA ZIEMI. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - II ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MOPS	2021 - 2022	UL. MARKIEFKI 68 UL. MARKIEFKI 64	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			
Projekt obejmował zadania związane z: animacją lokalną, szkołą liderów lokalnych, Punktem Informacji Obywatelskiej, działaniami środowiskowymi wzmacniającymi potencjał społeczności lokalnej i jej mieszkańców, programem wspierającym reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Bogucice.			
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			
2021			
W ramach projektu kontynuowane były działania z zakresu organizowania społeczności lokalnej prowadzone wśród mieszkańców Bogucic rozpoczęte w trakcie I etapu projektu. Prowadzono szereg działań na rzecz aktywizowania, wspierania, edukowania i integrowania społeczności lokalnej. Organizatorzy społeczności lokalnej aktywnie uczestniczyli w życiu dzielnicy, m.in. poprzez stały kontakt z mieszkańcami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie dzielnicy.			
Ponadto odbyły się:			
– 42 spotkania animatorów ze społecznością lokalną, – 37 spotkań w ramach Klubu Społecznościowego „Babska Strefa”, – 45 spotkań w ramach Klubu Społecznościowego dla dzieci i młodzieży, – spotkania z brokerem edukacyjnym, – w ramach cyklu „Lider w działaniu” lokalni liderzy dzielnicy Bogucice wyjechali na 3-dniowy wyjazd do Ustronia na trening umiejętności społecznych.			
W ramach działań środowiskowych:			
– odbyło się 21 spotkań i warsztatów edukacyjnych m.in. spotkanie z grami planszowymi, warsztaty zdrowych nawyków, spotkanie edukacyjne dotyczące ogólnopolskiego dnia walki z depresją, – zrealizowano 12 turniejów „Boguckiej Ligii Darta” w ramach „Sportowych Bogucic”, – odbył się podwieczorek na sportowo w Parku Boguckim, – zrealizowano „Wyjazd integracyjny do alpakarni” dla najmłodszych wraz z rodzicami.			
W ramach „Dzielnicowej Akademii Seniora” w 2021 roku realizowano częściowo w formie zdalnej, częściowo w formie stacjonarnej następujące działania animacyjne:			
– cykl „Senior w akcji”: 16 spotkań m.in. „Senioralny Dzień Kobiet w PAL”, 3 edycje „Senioralnego Śniadania na Trawie” w Parku Boguckim, akcja tworzenia i przekazania zabawek dla bezdomnych kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, – cykl „Na zdrowie” – warsztat on-line z zakresu suplementacji dla seniora oraz stacjonarne spotkanie z podologiem. Ponadto odbyło się 6 spotkań edukacyjnych z zakresu fizjoterapii i akupresury, – cykl „Radość życia”: 2 warsztaty psychologiczne dla seniorów w formie on-line, – cykl „Senior w działaniu”: 29 spotkań, w tym 12 warsztatów on-line, – cykl „Senior w ruchu”: 31 spotkań Nordic Walking, które gromadziły średnio 8 osób, – cykl „Senior w podróży”: 3 wyjścia integracyjne do Muzeum Śląskiego. Ponadto seniorzy wzięli udział w kilku imprezach wyjazdowych m.in. wyjazd do Trójwsi Beskidzkiej.			
2022			
Zrealizowano:			
– 36 spotkań animatorów ze społecznością lokalną, – 54 spotkania w ramach „Klubu Społecznościowego – Babska Strefa” m.in. warsztaty rękodzieła, – 45 spotkań w ramach „Klubu Społecznościowego dla Dzieci i Młodzieży”, – w ramach zadania zorganizowano „Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej” dla 7 uczestników projektu, – realizowane było poradnictwo indywidualne z zakresu dietetyki, podologa oraz kreowania wizerunku.			

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

✓ **BOGUCICE**

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

W ramach działań środowiskowych:

- odbyło się 13 spotkań w ramach zajęć edukacyjnych i warsztatów zainteresowań dla mieszkańców,
- zrealizowano 12 turniejów „Boguckiej Ligii Darta” w ramach cyklu „Sportowe Bogucice” oraz 7 zajęć zumbi,
- odbyły się również m.in. 2 akcje sprzątania dzielnicy, rajd rowerowy, spotkanie dla sympatyków karate, piknik alpinistyczny połączony z biegiem na orientację,

W ramach „Dzielnicy Akademii Seniora” w 2022 roku zrealizowano:

- spotkania w ramach cyklu „Senior w akcji” – m.in. warsztaty kulinarne i spotkania kreatywne prowadzone przez seniorów dla seniorów, na których seniorzy dzielili się swoimi pasjami z innymi poprzez prowadzenie warsztatów
- 5 spotkań w ramach cyklu „Senior on-line” dotyczących praktycznej nauki obsługi komputera, smartfona i podstawowych programów komputerowych,
- cykl „Senior w działaniu” - organizacja spotkań integracyjno-edukacyjnych (rękodzielniczych, z zakresu rozwoju osobistego, warsztaty artystyczne, warsztaty edukacyjne z hortiterapii, spotkania z animatorem), cykl wyjść do Kina Komos pod nazwą „Senioralne spotkania z kinem polskim” oraz cykl integracyjnych wyjść seniorów na kręgielnię,
- cykl „Senior w ruchu” - organizacja zajęć ruchowych dla seniorów m.in.: nordic walking, krav maga oraz zumba,
- cykl „Senior w podróży”: wyjazdy integracyjny
- cykl psychologiczny „Radość życia” – „Piękna Seniorka, Przystojny Senior” - zajęcia z wizażystą.

Ponadto w ramach zadania zleconego w 2022 roku zrealizowano również Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Bogucice (realizowano m.in. kursy kwalifikacyjne oraz staże zawodowe dla mieszkańców dzielnicy pozostających bez pracy). Na skutek tego wsparcia 8 uczestników projektu podjęło pracę zawodową oraz nabyło nowe kwalifikacje potrzebne na rynku pracy.



Bieg dookoła Bogucic – wrzesień 2022



Piknik Świątojański, Turniej Piłkarski – czerwiec 2022

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2023 r.
Razem wydatki	1 382 816	556 381	826 435	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	1 177 002	459 002	718 000	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	205 814	97 379	108 435	nd.	nd.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI MIEJSKICH W TYM PRZEBUDOWA I REMONT OBIEKTÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYSZŁEGO OTOCZENIA W DZIELNICY BOGUCICE – REWITALIZACJA PARKU BOGUCKIEGO

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM/ZZM

LATA REALIZACJI

2013, 2015/16, 2018/19

LOKALIZACJA

UL. KOPALNIANA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zagospodarowanie przestrzeni Miasta Katowice, w tym przebudowę i remont lokali zlokalizowanych w obrębie budynków znajdujących się przy ul. Markiefki 64 i 68 w Katowicach dla potrzeb realizacji projektu pn. „Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej” wraz z modernizacją przestrzeni publicznej Parku Boguckiego.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane wraz z robotami dodatkowymi (murarskie, tynkarskie, izolacyjne, malarskie, posadzkarskie, okładzinowe, instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, elektryczne; wykonano instalację wentylacji mechanicznej, podłączono elektryczne piece grzewcze, zainstalowano urządzenia sanitarne; wykonano renowację ceglanej elewacji frontowej; na podwórzu wykonano nawierzchnię z kostki betonowej i nasadzenie zieleni niskiej) dot. lokalu w budynku przy ul. Markiefki 64. W zakresie przebudowy lokali w budynku przy ul. Markiefki 68 ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. W zakresie zagospodarowania parku przeprowadzono 16% robót budowlanych, z czego całość robót rozbiórkowych, 27% robót związanych z budową ciągów pieszych i 21% prac w zieleni, 33% prac związanych z budową nowego oświetlenia oraz 43% prac związanych z częścią hot-spotów Wi-Fi. Trwały roboty budowlane oraz prowadzony był nadzór inwestorski.

2019

W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie prace budowlane zgodnie z projektem. Projekt zakończono.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

✓ **BOGUCICE**

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Rewitalizacja Parku Boguckiego – efekt końcowy

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	7 339 757	176 876	1 218 268	5 944 611	nd.
Fundusze strukturalne	4 994 622	113 752	919 851	3 962 754	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	587 602	13 383	108 218	466 206	nd.
Środki kredytu	0	0	0	0	nd.
Środki własne	1 757 532	49 741	190 199	1 515 651	nd.

UKŁAD KOMUNIKACYJNY DLA TERENU BUDOWY NOWEGO MUZEUM ŚLĄSKIEGO, MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KONGRESOWEGO ORAZ SIEDZIBY NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2008-2018

LOKALIZACJA

kwartał ul. Olimpijskiej,
Góreckiego, Dobrowolskiego,
al. Roździeńskiego

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Zakres projektu obejmował ulicę Dobrowolskiego stanowiącą przedłużenie ul. Dudy Gracza oraz ul. Nadgórników oraz przedłużenie śladu ulicy Olimpijskiej, co łącznie stanowiło 2,2 km nowych i przebudowanych dróg. Ponadto wybudowano parking w rejonie ul. Olimpijskiej; kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską oraz ścieżki rowerowe.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

✓ BOGUCICE


SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Trwały postępowania odszkodowawcze.

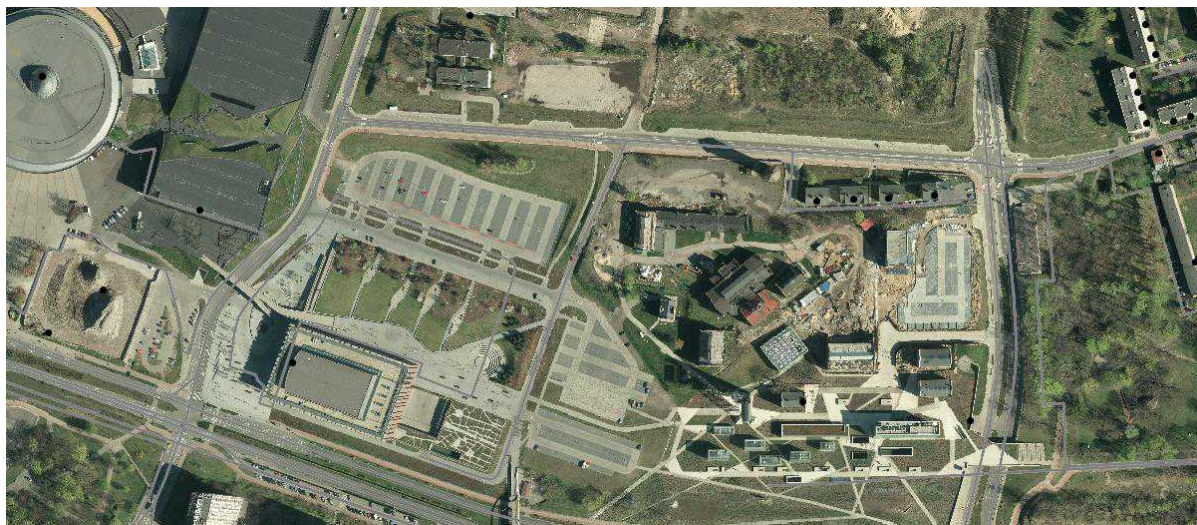

Układ komunikacyjny

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	153 916 356	153 600 696	285 659	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	0	0	0	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	nd.	nd.
Środki kredytu	117 587 475	117 587 475	0	nd.	nd.
Środki własne	36 328 881	36 013 221	285 659	nd.	nd.

Centrum Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach - I etap

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MOPS + NGO	2017 - 2020	UL. KRAKOWSKA 138	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU Projekt obejmował zadania związane z: animacją lokalną, działaniami środowiskowymi wzmacniającymi potencjał społeczności lokalnej, prowadzeniem Punktu Informacji Obywatelskiej. Głównym celem projektu jest aktywizacja dorosłych mieszkańców oraz instytucji lokalnych do działań dla społeczności lokalnej oraz integracji społecznej.			PODOBSZAR REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIE ZAWODZIE ZAŁĘŻE BOGUCIE ✓ SZOPIENICE-BUROWIEC JANÓW-NIKISZOWIEC
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			

2017

Podjęto działania organizacyjne, administracyjno – biurowe projektu, działania dotyczące spraw promocyjno – informacyjnych projektu. Odbyły się spotkania animatora z mieszkańcami, udział w spotkaniach środowiskowych organizowanych przez mieszkańców (z okazji 10 – lecia działań mieszkańców na osiedlu Bagno) i przez Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10 (spotkanie z przedstawicielami instytucji lokalnych działających w rejonie Szopienic). Animatorzy lokalni rozeznają lokalne potrzeby i zasoby. Odświeżono pomieszczenie pod Centrum Społecznościowe Szopki, zakupiono meble i część wyposażenia Centrum Społecznościowego Szopki.

2018

Przeprowadzono 16 spotkań animatora lokalnego z mieszkańcami. Spotkania dotyczyły działań na rzecz społeczności lokalnej oraz możliwości włączenia się mieszkańców w organizację działań i wydarzeń lokalnych. W ramach działań animatora zorganizowano także warsztaty: „Ludowe sposoby zdobienia wnętrza- wycinanka” oraz rękodzielniczy – ozdoby świąteczne. Prowadzono również działania środowiskowe wzmacniające potencjał społeczności lokalnej. W ramach wyjść i wyjazdów integracyjnych zorganizowano wycieczkę do Krakowa oraz wyjście integracyjne do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia osoby. W ramach wydarzeń lokalnych przeprowadzono m.in. „Piknik integracyjny na Borkach” oraz grę terenową dla mieszkańców dzielnicy, zakończoną wspólnym grillem. We wrześniu odbył się Festyn Rodzinny oraz dwie projekcje kina plenerowego. W grudniu miało miejsce spotkanie świąteczne połączone z warsztatem rękodzielniczym – wykonywanie stroików świątecznych. W ramach działań środowiskowych odbyły się dwa warsztaty kulinarne. W czerwcu 2018 roku w TPPS 10 odbyło się spotkanie środowiskowe podczas którego animatorzy lokalni promowali działania Centrum Społecznościowego Szopki wśród instytucji lokalnych. Odbyło się 8 spotkań z partnerami projektu, podczas których poruszano tematy związane z realizacją działań na rzecz społeczności lokalnej. W marcu odbyło się spotkanie informacyjne na temat oferty projektu i planowanych działań, w którym uczestniczyło 23 przedstawicieli instytucji lokalnych.

Partner Projektu - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” zrealizował:

- 207 spotkań animatora z mieszkańcami,
- 21 spotkań integracyjno - edukacyjnych (m.in. z okazji Dnia Kobiet),
- 4 szkolenia umiejętności społecznych (m.in. z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych i zarządzania czasem),
- 8 wyjść integracyjnych m.in. do pizzerii, do Jump World, do kregielni,
- dwa wydarzenia lokalne: „Rodzinna Strefa Animacji” oraz „spotkanie świąteczne”,
- wyjazd edukacyjny w formie wizyty studyjnej do Centrum Gier FURIA,
- młodzież przy wsparciu animatora lokalnego przeprowadziła animacje w trakcie Dni Burowca,
- szkolenia umiejętności społecznych.

Partner Projektu - Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka” zrealizował:

- 48 spotkań z animatorami w ramach Klubu SZOPKI oraz 1 mikołajowe i 2 świąteczne,
- 4 spotkania warsztatowe – decoupage,
- 6 warsztatów kulinarnych i 10 warsztatów komputerowych,
- 3 warsztaty „Wizaż paznokci”, 3 warsztaty pt. „Makijaż i stylizacja z elementami pielęgnacji” -
- warsztaty: „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy, zmiana niesatysfakcjonującej pracy”, „Pokochaj siebie. Jak wzmocnić poczucie własnej wartości i zostać swoim najlepszym przyjacielem”, „Jak żyć i przetrwać w rodzinie z problemem uzależnienia”. „Wzmocnienie samokontroli”.

- 20 dyżurów terapeuty uzależnień oraz 20 dyżurów psychologa,
- wyjście uczestników projektu na pieszą wędrówkę szlakiem Gór Opawskich,
- prelekcja pt. „Dopalacze zaraźliwy (M)ocarz”,
- obóz terapeutyczno-integracyjny w Jarnołtówku,
- wyjazd aktywizacyjno-integracyjno-turystyczny do Kamesznicy,
- wyjazd na grzybobranie,
- wizytę studyjną w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie.

2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zrealizował:

- 44 spotkania animatora lokalnego z mieszkańcami m. in. cykliczne wieczory gier planszowych oraz odbywały się spotkania w ramach Wyjątkowej Strefy Kobiet,
- spotkanie z członkami Rady Jednostki Pomocniczej oraz spotkanie sąsiedzkie z mieszkańcami ul. Bednorza,
- 7 wyjść m.in. do kręgielni, kina, Papugarni,
- 2 spotkania z makijażystką,
- 3 wyjazdy integracyjne m.in. do Parku Wodnego w Tychach oraz do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach,
- „Tłusty Czwartek na Szopkach” W trakcie spotkania dla dzieci zorganizowano przedstawienie teatralne wraz z animacjami,
- „Zabawę Andrzejkową”,
- Centrum Społecznościowe Szopki wsparło wydarzenie lokalne realizowane przez Miejskie Przedszkole nr 66 w Katowicach doposażając paczki dla 220 dzieci,
- piknik dla społeczności lokalnej,
- usługę brokera edukacyjnego,
- 3 pokazy kina plenerowego: w dzielnicy Borki, Burowiec i w okolicach ul. Kocura w Szopienicach,
- Festyn Rodzinny na skwerze Roździeńskiego,
- promocję projektu m.in. poprzez udział w spotkaniu pn. „Przy bonkawie i kołoczach”, realizowanego przez MDK Szopienice-Burowiec, podczas którego animatorzy lokalni informowali mieszkańców o ofercie projektu,
- działania kulturalne organizowane przez MDK Szopienice-Burowiec, m.in. Kulturalne Katowice, Klub Podróżnika, „Integracyjny bal karnawałowy,

Partner projektu - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” zrealizował:

- ok. 130 spotkań animatora z mieszkańcami. Wśród nich były również spotkania warsztatowe, Kawiarenki Wolontariusza, spotkania grupy Młodych Liderów oraz indywidualne spotkania z animatorem,
- 2 akcje wolontariackie pt. „Dobre duchy”, a także 5 razy animacje na podwórkach dzielnicy Szopienice oraz w przedszkolu.
- 25 spotkań integracyjno-edukacyjnych dot. tańca z ogniem, a także 6 spotkań integracyjno – integracyjnych o innej tematyce,
- bal karnawałowy,
- wyjścia integracyjne m.in. do Laser House, do kręgielni oraz do pizzerii,
- cykl szkoleń umiejętności społecznych (6 szkoleń) m.in. z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych i zarządzania czasem oraz animacji lokalnej,
- wizyty studyjne m. in. do obserwatorium astronomicznego AstroLab oraz do Centrum Rozwoju Inicjatyw CRIS w Rybniku,
- kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej dedykowany dla uczestników projektu,
- 2 spektakle dla mieszkańców dzielnicy,
- Wakacyjny Piknik Wolontariusza pt.: „O wolontariacie”,
- Kawiarenka wolontariusza - spotkanie poświęcono planszówkom,
- spotkanie integracyjno-edukacyjne pt: „Włochy z Włochem”,
- „Rodzinna Strefa Animacji”, która była częścią „V Dni Burowca”. Wolontariusze poprowadzili animacje dla mieszkańców
- 2 szkolenia umiejętności społecznych,

Partner Projektu - Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka” zrealizował:

- 39 spotkań z animatorami w ramach Klubu SZOPKI,
- wyjazd integracyjny do Goczałkowic,
- 5 warsztatów decupage,
- Festyn Ekologiczny „Sprzątanie świata”,
- wyjście integracyjne z okazji Dnia Matki i Dziecka dla 13 osób,
- warsztaty: plastyczne, kulinarne i interpersonalne,
- 8 warsztatów „Wizaż paznokci”,
- warsztat - szkolenie „Poszukiwanie pracy marzeń” ,
- wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej Rybka, a także odbyła się wizyta studyjna do Żarek,
- dwa razy w miesiącu odbywały się dyżury psychologa oraz terapeuty uzależnień,
- dwutygodniowy wyjazd na obóz terapeutyczny do Rycerki,
- Festyn Rodzinny,
- wyjazd na grzybobranie,
- Zabawę Andrzejkową.

2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zrealizował m.in.:

- 14 spotkań animatora lokalnego z mieszkańcami m. in. warsztaty rękodzielnicze oraz akcję sprzątania terenów ogólnodostępnych. W ramach spotkań pt.: „Aktywna Jesień”, przy wsparciu animatora uruchomiono grupę Nordic Walking,
- wyjście integracyjne do kina oraz wyjazd do Sztolni Królowa Luiza,
- warsztaty tworzenia biżuterii,
- 2 pokazy kina letniego,
- piknik integracyjny dla mieszkańców osiedla Borki,
- Dzień Zumby w Szopienicach,
- warsztaty z brafitingu dla mieszkanki dzielnicy,
- zajęcia z rękodzieła,
- promocję projektu m.in. poprzez udział w spotkaniu pn. „Przy bonkawie i kołoczcu” oraz w trakcie imprezy „Letnie zachody słońca na Burowcu”, realizowanych przez MDK Szopienice- Burowiec, podczas którego animatorzy lokalni informowali mieszkańców o ofercie projektu,
- działania kulturalne organizowane przez MDK Szopienice-Burowiec, m.in. Kulturalne Katowice, festyn dzielnicowy, warsztaty rzeźbiarskie, Szopienicka scena monogramu, warsztaty ozdób świątecznych, warsztaty kuglarskie, Szopienicka scena piosenki aktorskiej, wycieczki z przewodnikiem po Katowicach, zajęcia integracyjno – edukacyjno – kulturalne.

Parter Projektu - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” zrealizował:

- ponad 100 spotkań animatorów z mieszkańcami (również w formie zdalnej)
- spotkania grupy tańczącej z ogniem prowadzone przez animatora,
- spotkania Teatru Stara Kotłownia,
- akcja szycia maseczek, które trafiły do mieszkańców dzielnicy oraz do Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach – Szopienicach,
- Planetę Dobrej Energii – grupa na Facebooku tworzona przez mieszkańców Szopienic i Burowca, przy wsparciu animatora lokalnego,
- Wakacyjną Akademię Animatora Podwórkowego- młodzież prowadziła animacje dla dzieci na podwórkach w dzielnicy,
- Integracyjny Bal Karnawałowy,
- wydarzenie lokalne „Stwórzmy razem Eko-Mural” - stworzenie muralu wzmacniającego ekologiczną świadomość mieszkańców,
- 2 wyjścia integracyjne do pizzerii oraz wyjazd integracyjny do Ustronia,
- 7 spotkań integracyjno-edukacyjnych dot. tańca z ogniem,
- 4 spotkania integracyjno-edukacyjne mających na celu zapewnienie młodym ludziom praktycznych narzędzi i pomysłów, które pomogą im poruszać się w życiu,
- 3 szkolenia umiejętności społecznych,
- spotkanie podsumowujące działania prowadzone w ramach Akademii Animacji i Aktywności Społecznej.

Parter projektu - Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka” zrealizował:

- 15 spotkań z animatorami w ramach Klubu SZOPKI (w tym 11 odbyło się w formie on-line),
- Inicjatywę lokalną przy wsparciu animatorów lokalnych - Pożegnanie lata pn.: „Wieczór z gitarą i poezją”,
- warsztaty „Asertywność a komunikacja interpersonalna”, „Eliminacja zachowań aspołecznych”, „Zmiana niesatysfakcjonującej pracy”,
- wyjazd integracyjny do Korbielowa,
- wyjazd na obóz terapeutyczno – integracyjny,
- 7 warsztatów m.in. wizaż paznokci, makijaż i stylizacja, „Pokochaj siebie”, „Wzmocnienie samokontroli” „Eliminacja zachowań asertywnych”,
- zabawa karnawałowa Maskarada,
- warsztaty decupage w formie online,
- wykład w formie online pt.: „Medyczne i społeczne problemy uzależnienia od alkoholu kobiet dla życia rodzinnego i seksualnego”,
- akcja szycia maseczek „Maseczki dla mieszkańców Katowic”,
- inicjatywę pogotowia zakupowego dla seniorów oraz szyli maseczki,
- 1 dyżur psychologa oraz odbył się 1 dyżur terapeuty uzależnień,
- 2 spotkania grupy rozwojowo – terapeutycznej,
- wyjazd na grzybobranie w ramach inicjatywy lokalnej,
- w ramach inicjatywy lokalnej odbyło się spotkanie kończące projekt w „Kręgielni”,
- 2 warsztaty pn.: „Wzmocnienie samokontroli”.



Festyn Rodzinny – wrzesień 2019



Warszaty w ramach Wyjątkowej Strefy Kobiet - 2019



Warszaty w ramach Wyjątkowej Strefy Kobiet – czerwiec 2019



Tłusty czwartek – luty 2019

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	1 654 002 ⁶	501 893	565 514	539 761	nd.
Fundusze strukturalne	1 358 481	423 753	484 447	450 281	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	159 821	49 854	56 991	52 976	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	135 700	28 286	24 076	36 504	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://mocnirazem.org/2017/12/30/cal-zawodzie/>
<https://www.facebook.com/centrumsocznoscioweszopki>

⁶ W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 46.834 zł

Centrum Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach - II etap

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MOPS + NGO	2020 - 2022	UL. KRAKOWSKA 138	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU Projekt obejmował zadania związane z: animacją lokalną, działaniami środowiskowymi wzmacniającymi potencjał społeczności lokalnej, prowadzeniem Punktu Informacji Obywatelskiej. Głównym celem projektu jest aktywizacja dorosłych mieszkańców oraz instytucji lokalnych do działań dla społeczności lokalnej oraz integracji społecznej.			PODOBSZAR REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIE ZAWODZIE ZAŁĘŻE BOGUCICE ✓ SZOPIENICE-BUROWIEC JANÓW-NIKISZOWIEC
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY 2020 W dniu 1 listopada 2020 r. rozpoczęto realizację projektu. Zaangażowano do pracy kadrę, w tym animatorów lokalnych, którzy rozpoczęli działania zmierzające do rekrutacji uczestników do projektu, dokonali analizy zastanej po I etapie sytuacji społecznej w dzielnicy oraz zaplanowali działania merytoryczne do realizacji od 2021 r. Rozpoczęto również spotkania z mieszkańcami. W okresie sprawozdawczym odbyło się 19 spotkań animatorów lokalnych i pracownika ds. reintegracji młodzieży z mieszkańcami.			
2021 <u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zrealizował m.in. następujące działania:</u> – 19 spotkań w ramach kuchni społecznej prowadzonej przez animatora, – 2 pokazy filmowe dla mieszkańców dzielnicy w ramach letniego kina plenerowego, – w ramach spotkań edukacyjno-integracyjnych odbyły się m.in.: spotkania z kosmetologką, spotkania z dietetyczką, szkolenie z komunikacji interpersonalnej, zajęcia z ćwiczeniami dla zdrowego kręgosłupa, – 14 spotkań z animatorem w ramach których uczestnicy wykonywali rękodzieło (m.in. tworzenie wianków i stroików wielkanocnych, rodzinne szycie poduszek, tworzenie własnych zakładki do książek, aniołki z masy solnej, własnoręcznie robione abażury do lampek, kartki świąteczne dla Hospicjum Cordis), – 10 spacerów Nordic Walking, – 2 wyjazdy integracyjne dla mieszkańców dzielnicy (do Ogrodów Kapiasa oraz do Muzeum Chleba), – 2 wyjścia integracyjne: piknik dla rodzin z dziećmi na Dolinie 3 Stawów oraz wyjście mieszkańców do muzeum Walcowni Cynku w Szopienicach, – 2 spotkania, na których animatorka uczyła rodziców i dzieci podstaw gry na gitarze, – 6 spotkań Strefy Kobiet dla mieszkanki dzielnicy, – 10 spotkań animatora z mieszkańcami,			
<u>Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” zrealizowało m.in.:</u> – 192 spotkania z animatorami lokalnymi i pracownikiem ds. reintegracji młodzieży i rodziny w środowisku lokalnym, – 8 spotkań edukacyjnych z zakresu obsługi aparatu z funkcją filmowania i podstaw realizacji zdjęć filmowych i montażu wideo, – 5 spotkań edukacyjnych z zakresu promocji i marketingu, – 5 spotkań edukacyjnych w ramach cyklu „Akademia Młodego Animatora”, – 3 stacjonarne treningi umiejętności i kompetencji społecznych dla młodzieży,			
<u>Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka” zrealizowało m.in.:</u> – 71 spotkań z animatorami w ramach Klubu Mieszkańca SZOPKI, – 119 spotkań z animatorami w ramach Klubu mieszkańca „Nasz Czas”, – 18 spotkań „Profilaktyka i rehabilitacja Seniora”, – 5 inicjatyw lokalnych: – przygotowanie i dostarczenie 50 szt. świątecznych paczek wielkanocnych, – wydarzenie pn. „Senioriada”, – współorganizacja pikniku integracyjnego, – 7 warsztatów plastycznych, – 4 projekcje filmowe,			

Od stycznia 2021 r., przy wsparciu animatorów lokalnych, wolontariusze oraz byli uczestnicy Projektu Centrum Społecznościowe SZOPKI w Szopienicach – I etap, realizują inicjatywę pogotowia zakupowego i pomocowego dla seniorów z dzielnicy objętej programem. W okresie rozliczeń z Urzędem Skarbowym uruchomiono również punkt pomocy w przygotowaniu rozliczenia podatku za 2020 r. oraz do września punkt wsparcia w realizacji obowiązku spisu powszechnego.

Projekt „Centrum społecznościowe w Szopienicach – II etap” w zakresie zadania „Działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie” realizowany jest przez Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”. W 2021 r. MDK zrealizował szereg działań kulturalnych, integracyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców m.in.: Teatralne Szopienice, spotkanie z dietetykiem, Niedzielne spotkania przy bonkawie i maszkietach, Święto Seniora, Spotkanie z Kulturą, zajęcia Kulturalny Bajtel, zajęcia Bezpieczny Maluch.

2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zrealizował m.in. następujące działania:

- noworoczne spotkanie w ramach „Klubu Społecznościowego dla Rodziców”,
- warsztaty rękodzieła,
- 3 spaceru nordic walking,
- wieczory z planszówkami i grami integracyjnymi oraz wieczór wspólnego muzykowania z animatorem,
- w ramach „Klubu Społecznościowego dla Rodziców” odbyły się warsztaty kulinarne, warsztaty kompetencji rodzicielskich, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty edukacyjne, warsztaty z robotyki, warsztaty czekolady, warsztaty pn. „Szalony naukowiec”, warsztaty dla rodziców z origami, decoupage, recyklingu/upcyklingu oraz tworzenia lasu w słoikach,
- „Akademię Lidera Społeczności Lokalnej” (zakres tematyczny spotkań dotyczył m.in. podstaw komunikacji interpersonalnej, cech, ról i działania skutecznego lidera),
- w ramach inicjatywy oddolnej mieszkańców wsparto festyn „Sercem Sercu”, zorganizowano wiosenne sprzątanie okolicy, przygotowywanie pierogów z zaproszonymi gośćmi z Ukrainy, międzypokoleniowe pieczenie sernika, przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka, które przygotowali najmłodsi uczestnicy projektu, zorganizowano ognisko sąsiedzkie na Borkach, Bal sąsiedzki na Borkach oraz zrealizowano inicjatywę pn. „Zielony skwer przy ratuszu”,
- wyjście integracyjne do Teatru Wyspiańskiego, Cinema City, Multikina, Planetarium Śląskiego oraz do Laserhouse,
- wyjazd integracyjny do Pszczyny,
- spotkania propagujące zdrowy styl życia,
- spotkanie z dietetyką,

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” zrealizowało m.in.:

- 184 spotkania animatorów lokalnych i pracownika ds. reintegracji młodzieży i rodziny w środowisku lokalnym,
- 5 spotkań edukacyjnych dla młodzieży w ramach cyklu „COOL-turowe spotkania polsko-ukraińskie”,
- 5 stacjonarnych treningów umiejętności i kompetencji społecznych dla młodzieży,
- wyjście integracyjne do „Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum”.
- 5 inicjatyw lokalnych: „Walentynki w Kotlewni”, „Szalone Szopy na Start”, „Festiwal Szalonych Szopów”, Teatr Forum – spektakl „Piernik do wiatraka, czyli złe relacje”, „Nowe życie murali”,
- zorganizowano grę terenową pn. „Zorientuj się!”,
- w ramach spotkań animatorów lokalnych z młodzieżą odbywały się także spotkania tematyczne tj. Halloween, Andrzejki, Mikołajki czy pieczenie pierników.

Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka” zrealizowało:

- 209 spotkań z animatorami lokalnymi;
- 207 akcji pn. „Codziennie szklanka soku”,
- 36 zajęć profilaktyczno-rehabilitacyjnych,
- 30 warsztatów plastycznych,
- 17 wykładów i prelekcji dotyczących „Zdrowia Seniora”, a także prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa seniora,
- 2 spotkania autorskie,
- 1 obóz integracyjno-rozwojowy,
- 7 warsztatów pielęgnacji i stylizacji paznokci,
- 1 spotkanie świąteczne,
- minifestyn pn. „Senior Dzieciom”,
- 2 wyjazdy integracyjne (Zamek Moszna, Czantoria) oraz 2 wyjścia integracyjne (Planetarium Śląskie, Park Śląski),
- seniorzy wzięli udział w „Festiwalu Organizacji Pozarządowych” oraz w „Dniach Seniora”,
- 1 zabawę integracyjną,
- 2 wyjścia na mecz piłki siatkowej.

Ponadto w ramach zadania zleconego w 2022 roku zrealizowano również Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Szopienice – Burowiec (realizowano m.in. kursy kwalifikacyjne oraz staże zawodowe dla mieszkańców dzielnicy pozostających bez pracy). Na skutek tego wsparcia 14 uczestników projektu podjęło pracę zawodową oraz nabyło nowe kwalifikacje potrzebne na rynku pracy.

W ramach projektu realizowano także działania kulturalne organizowane przez Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”. Odbyły się m.in. niedzielne spotkania przy bonkawie i kołocz, przeprowadzono kurs samoobrony dla kobiet oraz zorganizowano wycieczki krajoznawczo-kulturalne.



Wyjazd integracyjny – wrzesień 2021



Piknik integracyjny – październik 2021



Spotkanie wielkanocne – kwiecień 2022



Warsztaty makramy – listopad 2021

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2023 r.
Razem wydatki	1 987 385 ⁷	771 815 zł	1 215 570 zł	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	1 697 565	692 585 zł	1 004 980 zł	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	289 820	79 230 zł	210 590 zł	nd.	nd.

⁷ W łącznych nakładach finansowych w pozycji środki własne uwzględniono wkład własny Partnera - 115.947 zł

CENTRUM ANIMACJI MŁODZIEŻOWEJ (CAM) W SZOPIENICACH - I ETAP

PODMIOT

MOPS + NGO

LATA REALIZACJI

2018-2020

LOKALIZACJA

UL. BRYNICY 7

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Utworzenie Centrum Animacji Młodzieżowej, w ramach którego będą realizowane działania mające na celu wsparcie członków rodzin (grupy samopomocowe, asysta rodzinna, poradnictwo).

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2019

W okresie sprawozdawczym prowadzone były działania na rzecz organizowania i wspierania rodzin z dzielnicy Szopienice. Zatrudniono 2 asystentów rodziny (Lider) i specjalistów, 2 pedagogów i psychologa (Partner), a także 1 prawnika na umowę zlecenie oraz 1 w ramach porozumienia wolontariackiego (Partner). Zatrudniono także specjalistę ds. integracji rodziny.

Zrealizowali następujące działania:

- usługę asysty rodzinnej,
- 32 spotkania Klubu Nastolatka,
- 30 spotkań Klubu Rodzica/Opiekuna,
- wyjście integracyjne dla Klubu Rodzica/Opiekuna,
- wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego - 81 porad, pedagogicznego – 132 porady, prawnego – 105 porad,
- 24 spotkania edukacyjne dla Klubu Rodzica/Opiekuna m.in. warsztaty z pierwszej pomocy,
- 1 wyjazdowy trening umiejętności społecznych dla młodzieży,
- 5 stacjonarnych treningów umiejętności społecznych dla młodzieży,
- 5 stacjonarnych treningów umiejętności opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców,
- 3 wydarzenia o charakterze integracyjnym skierowane do rodzin w tym spotkanie świąteczne,
- 7 wyjść integracyjnych: 6 wyjść w ramach Klubu Nastolatka m.in. do pizzerii, do ośrodka hipoterapeutycznego oraz 3 wyjścia w ramach Klubu Rodzica/Opiekuna, m.in. Wielkiej Fabryki Elfów w którym udział wzięło średnio kilkunastu uczestników oraz kilkanaścioro dzieci,
- 4 spotkania edukacyjne pn. „Fotografia dla młodych” - warsztaty fotograficzne z użyciem telefonów komórkowych,
- 3 spotkania edukacyjne: „Pysnie i zdrowo czyli dietetyczne wariacje” - warsztaty dietetyczne
- 4 warsztaty rękodzieła,
- wydarzenia o charakterze integracyjnym: wernisaż fotograficzny oraz czyli spotkanie z lokalnymi poetami”.

2020

W okresie sprawozdawczym realizowane były usługi społeczne niwelujące deficyty opiekuńczo – wychowawcze utrudniające realizację funkcji rodziny; działania wspierające rodzinę poprzez wdrażanie różnorodnych form pracy z rodziną, takich jak: organizacja stacjonarnych treningów umiejętności społecznych dla młodzieży oraz stacjonarnych treningów opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców, prowadzenie grup samopomocowych, poradnictwo specjalistyczne (pedagogiczne, psychologiczne i prawne), wsparcie asystenta rodziny, realizację działań integrujących. Zakończono realizację projektu.




Warsztaty z rękodzieła – listopad 2019



Spotkanie świąteczne – grudzień 2019



Park linowy – lipiec 2020

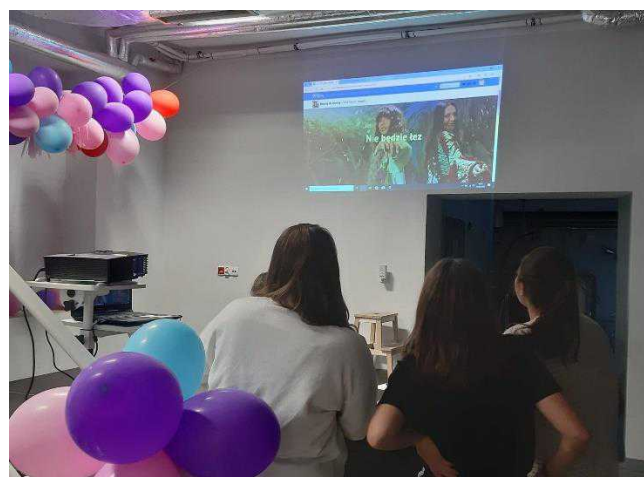

Karaoke – luty 2020

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	969 859 ⁸	102 726	448 085	392 753	nd.
Fundusze strukturalne	796 676	93 889	357 948	344 839	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	74 982	8 837	33 689	32 456	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	98 201	0,00	56 448	15 458	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.facebook.com/CAMSzopienice>

⁸ W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 26.295 zł

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ (PO KOTŁOWNI) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 W KATOWICACH – SZOPIENICACH POD CENTRUM ANIMACJI MŁODZIEŻOWEJ W SZOPIENICACH WRAZ REWITALIZACJĄ PARKU OLIMPIJCZYKÓW W DZIELNICY SZOPIENICE

PODMIOT REALIZUJĄCY

ZZM / GIMNAZJUM NR 13

LATA REALIZACJI

2015/16; 2018/19

LOKALIZACJA

UL. BRYNICY 7

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował adaptację pomieszczeń w budynku w gimnazjum nr 13 w Katowicach na potrzeby Centrum Animacji Młodzieżowej wraz z nadbudową pomieszczenia opału kotłowni oraz rozbudową budynku szkoły o przedsionek windy, a także rewitalizacja Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice. Celem projektu był wzrost dostępności i jakości usług społecznych oraz zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany teren dzielnicy Szopienice-Burowiec.

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu była wykorzystywana w szczególności do projektów planowanych do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap (podziałanie 9.2.1 RPO WSL 2014-2020),
- Centrum Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach - I etap (podziałanie 9.1.1 RPO WSL 2014-2020).

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC


WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane w zakresie nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po kotłowni i składzie opału oraz rozbudowy o przedsionek windy. W zakresie rewitalizacji parku przeprowadzono całość robót ziemnych i rozbiórkowych, część robót związanych z budową nowych ciągów pieszych oraz roboty związane z wykonaniem oświetlenia. Trwały roboty budowlane oraz prowadzony był nadzór inwestorski.

2019

Wykonano wszystkie prace budowlane zgodnie z projektem. Projekt zakończono.

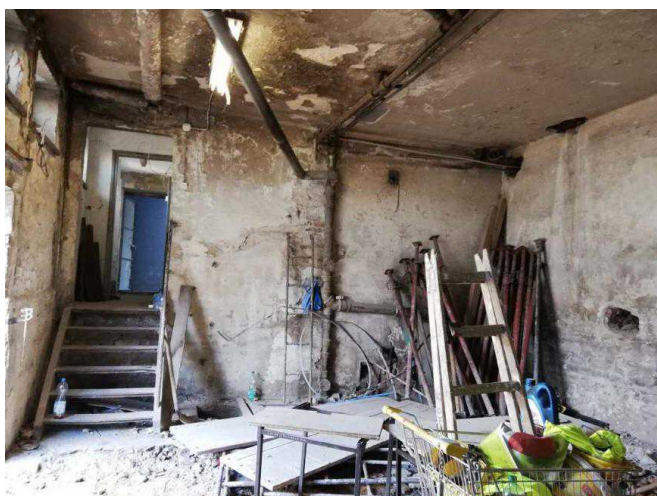


Pomieszczenie kotłowni - przed remontem (1)




Pomieszczenie kotłowni - przed remontem (2)



Pomieszczenie kotłowni – po remoncie (1)

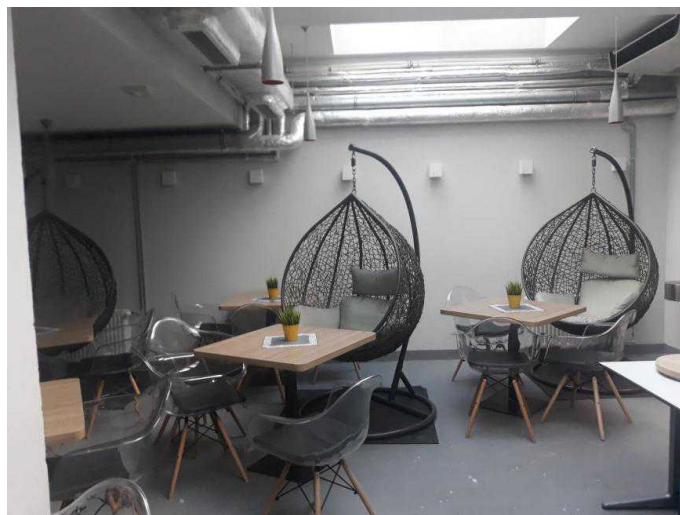

Pomieszczenie kotłowni – po remoncie (2)

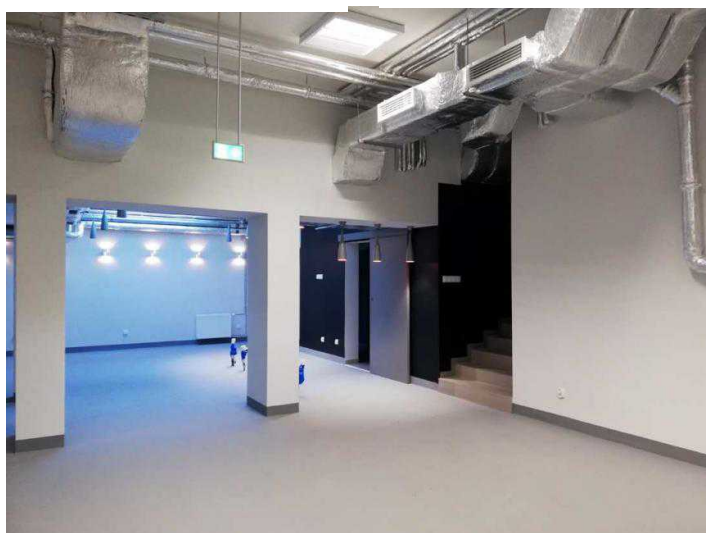

Pomieszczenie kotłowni – po remoncie (3)

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	2 670 613	129 773	1 415 100	1 125 740	nd.
Fundusze strukturalne	1 577 142	110 306	773 188	693 648	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	185 546	12 977	90 963	81 606	nd.
Środki kredytu	0	0	0	0	nd.
Środki własne	907 925	6 490	550 949	350 486	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

[http://katowice.eu/Strony/Dostosowanie-pomieszcze%C5%84-\(po-kot%C5%82owni\)-przy-Gimnazjum-nr-13-w-Katowicach---Szopienicach-pod-Centrum-Animacji-M%C5%82odzie%C5%BCowej-w.aspx](http://katowice.eu/Strony/Dostosowanie-pomieszcze%C5%84-(po-kot%C5%82owni)-przy-Gimnazjum-nr-13-w-Katowicach---Szopienicach-pod-Centrum-Animacji-M%C5%82odzie%C5%BCowej-w.aspx)

WZROST DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ROZBUDOWANYCH PRZEDSZKOLACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM BYŁO MIASTO KATOWICE (MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 66)

PODMIOT REALIZUJĄCY

MP NR 66/ CUW

LATA REALIZACJI

2016-2018

LOKALIZACJA

UL. BRYNICY 50

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował doposażenie dwóch miejskich przedszkoli w pomoce dydaktyczne, dodatkowe zajęcia dla dzieci, zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Faktyczna realizacja projektu rozpoczęła się w 2017 roku. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Wykonany zakres obejmował utworzenie i funkcjonowanie nowych oddziałów dla 72 dzieci: 2 oddziały ogólnodostępne, 2 oddziały integracyjne oraz prowadzenie zajęć z zakresu rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych, hipoterapii, dogoterapii oraz zajęć na basenie. W okresie sprawozdawczym zakupiono środki czystości oraz pomoce naukowe do sali doświadczania świata. Realizacja projektu została zakończona z dniem 31.08.2018 r.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Sala w MP nr 66 (1)



Sala w MP nr 66 (2)

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	944 252	0	254 859	689 393	nd.
Fundusze strukturalne	786 674	0	209 344	577 330	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	nd.
Środki kredytu	0	0	0	0	nd.
Środki własne	157 578	0	45 515	112 063	nd.

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE WIOSNY LUDÓW ORAZ SKRZYŻOWANIA Z UL. LWOWSKĄ, BEDNORZA, OBROŃCÓW WESTERPLATTE (PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH)

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2010-2016; 2017-2019

LOKALIZACJA

UL. WIOSNY LUDÓW

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zadania z zakresu przebudowy infrastruktury drogowej.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

Rzeczowa realizacja zadania obejmowała okres **2010-2016**.

2018

Trwały postępowania odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2019 rok.

2019

Trwały postępowania odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2019 rok.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Układ komunikacyjny w rejonie skrzyżowania z ul. Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte (1)



Układ komunikacyjny w rejonie skrzyżowania z ul. Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte (2)

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	7 894 337	7 894 337	0	0	nd.
Fundusze strukturalne	0	0	0	0	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	nd.
Środki kredytu	0	0	0	0	nd.
Środki własne	7 894 337	7 894 337	0	0	nd.

PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU UL. LWOWSKIEJ

PODMIOT REALIZUJĄCY

MZUIM

LATA REALIZACJI

2017-2019

LOKALIZACJA

UL. LWOWSKA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zadania z zakresu przebudowy infrastruktury drogowej.

PODOB SZAR
REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Zakończono przebudowę wiaduktu drogowego nad ul. Bagienną (DK79).

2019

Zadanie zakończone i odebrane. Rozliczenie robót z roku 2018.



Lokalizacja projektu nr 111

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	6 227 067	1 622 572	3 728 839	875 655	nd.
Fundusze strukturalne	0	0	0	0	nd.
Środki budżetu państwa	1 523 000	1 523 000	0	875 655	nd.
Środki kredytu	0	0	0	0	nd.
Środki własne	4 704 067	99 572	3 728 838,53	0	nd.

BUDOWA TRZECH BASENÓW W DZIELNICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015 - 2020

LOKALIZACJA

UL. HALLERA/UL. KONNA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Budowa basenu krytego w Szopienicach.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016-2017

Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowy na: pełnienie usług Inżyniera Kontraktu oraz na wykonanie robót budowlanych.

2018-2019

Trwały roboty budowlane.

2020

Zakończenie realizacji zadania.



Basen Burowiec



Hala sportowa w budynku basenu Burowiec

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	40 050 835	9 188 865	19 754 452	11 107 518	nd.
Fundusze strukturalne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	b. d.	b. d.	b. d.	b. d.	nd.
Środki kredytu	b. d.	b. d.	b. d.	b. d.	nd.
Środki własne	b. d.	b. d.	b. d.	b. d.	nd.

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM BYŁO MIASTO KATOWICE, POPRZECZ UTWORZENIE NOWYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015-2017

LOKALIZACJA

UL. BRYNICY 50

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na rozbudowie Miejskiego Przedszkola nr 41 i 66 w oparciu o modułowe rozwiązania.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Ze względu na późny termin podpisania umowy z wykonawcą robót, przesunięto realizację zadania na rok 2017.

2017

Wykonano wszystkie prace demontażowe i rozbiórkowe. Wykonano ponadto zabudowę kontenerową, stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną, prace elewacyjne, wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne i kanalizacyjne, instalacje C.O., zagospodarowanie terenu, dostarczono i zamontowano wyposażenie sal i kuchni.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	3 829 665	97 939	0	3 731 726	nd.
Fundusze strukturalne	2 707 430	83 248	0	2 624 182	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	nd.
Środki kredytu	0	0	0	0	nd.
Środki własne	1 122 235	14 691	0	1 107 544	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<http://katowice.eu/Strony/Zwi%C4%99kszenie-dost%C4%99pno%C5%9Bci-do-plac%C3%B3wek-wychowania-przedszkolnego%2C-dla-kt%C3%B3rych-organem-prowadz%C4%85cym-jest-miasto-Katowice-poprze.aspx>

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE - ETAP VII

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2014-2021

LOKALIZACJA

UL. CIESIELSKA 1

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 65.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2019

Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

2020

Realizowano roboty budowlane.

2021

W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację budynku.



Ciesielska 1 - budynek po termomodernizacji (1)



Ciesielska 1 - budynek po termomodernizacji (2)

DANE FINANSOWE

Wydatki	łącznie nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie w 2021 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2021 r.
Razem wydatki	1 960 669	1 646	1 564 579	394 444	nd.
Fundusze strukturalne	934 254	851	872 629	60 774	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	1 026 415	795	691 951	333 670	nd.

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY SZOPIENICE-GISZOWIEC PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 10 W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2014; 2016/17; 2019

LOKALIZACJA

UL. OBROŃCÓW
WESTERPLATTE 10

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach. Jego celem było zwiększenie efektywności wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii w obiekcie. Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia zużycia energii i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2019 rok.

2019

W okresie sprawozdawczym zrealizowano prace budowlane zgodnie z projektem.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCIE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Prace termomodernizacyjne budynku



Budynek przy ul. Obrońców Westerplatte 10 – stan przed

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 105 507	38 376	nd.	1 067 131	nd.
Fundusze strukturalne	409 538	0	nd.	409 538	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	48 179	0	nd.	48 179	nd.
Środki kredytu	0	0	nd.	0	nd.
Środki własne	647 789	38 376	nd.	609 413	nd.

ZAGOSPODAROWANIE SKWERU JANUSZA SIDŁY

PODMIOT REALIZUJĄCY

ZZM

LATA REALIZACJI

2015-2016

LOKALIZACJA

UL. 11 LISTOPADA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował przebudowę parku, w tym przebudowę ciągów pieszych, budowę miejsca edukacyjnego i zagospodarowanie skarpy stanowiącej część placu.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2015/2016

W roku 2015 opracowano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na rozpoczęcie robót budowlanych. W roku 2016 wykonano roboty budowlane, polegające na niwelacji i utwardzeniu powierzchni gruntu, remoncie uszkodzonych fragmentów istniejących nawierzchni oraz zagospodarowania skweru zielenią. Ustawiono ogrodzony wybieg dla psów oraz inne elementy małej architektury (ławki i kosze). Zadanie zakończone i odebrane.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Skwer Janusza Sidły – (1)



Skwer Janusza Sidły – (2)

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	223 605	10 947	212 658	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	0	0	0	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	nd.	nd.
Środki kredytu	0	0	0	nd.	nd.
Środki własne	223 605	10 947	212 658	nd.	nd.

SZOPIENICE-CENTRUM. REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. BEDNORZA 14 NA POTRZEBY REALIZACJI USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2017-2019

LOKALIZACJA

UL. BEDNORZA 14

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

PODOB SZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował dostosowanie lokalu (dotychczasowa funkcja - apteka) o powierzchni ok. 180 m² do nowej funkcji tj. usług społecznościowych. Projekt współfinansowany był ze środków EFRR w ramach poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty: murarskie, tynkarskie, izolacyjne, posadzkarskie, okładzinowe, malarskie, stolarkę drzwiową, instalacje elektryczne, przeciwpożarową, wodno-kanalizacyjną, c.o., wykonano montaż urządzeń sanitarnych, dźwigu osobowego, remont klatek schodowych.

2019

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane oraz dokonano odbioru końcowego.



Budynek przy ul. Bednorza 14

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 145 942	71 217	960 199	114 526	nd.
Fundusze strukturalne	515 954	44 007	423 555	48 392	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	60 700	5 177	49 830	5 693	nd.
Środki kredytu	0	0	0	0	nd.
Środki własne	569 288	22 033	486 814	60 441	nd.

BUDOWA STANICY 10 HARCERSKIEJ DRUŻYNY ŻEGLARSKIEJ IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W KATOWICACH - SZOPIENICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2018-2022

LOKALIZACJA

UL. MORAWA 118A

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Budowa nowego obiektu Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018/2019

Złożono dokumentację badań podłoża gruntowego oraz opracowywano dokumentację projektową.

2020

Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane – trwały prace komisji przetargowej.

2021

Trwały roboty budowlane.

2022

Zakończono prace budowlane. Powstał trzykondygnacyjny budynek z hangarem na łodzi, skutnią, żagłownią, magazynem, salami spotkań, jak również zapleczem kuchennym i sanitarnym. Ponadto uporządkowano teren otaczający stację, przygotowano alejki, nowe oświetlenie, infrastrukturę żeglarską – z nową keją i pomostem – oraz kąpieliskową.



Budynek Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Harcerskiej.



Strefa kąpieliskowa – staw Morawa

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2023 r.
Razem wydatki	7 709 629	4 850 276	2 859 353	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki kredytu	3 000 000	3 000 000	0,00	nd.	nd.
Środki własne	4 709 629	1 850 276	2 859 353	nd.	nd.

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. DR STANISŁAWA OLCHAWY 3-5 W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2018-2020

LOKALIZACJA

UL. OLCHAWY 3-5

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Kompleksowa modernizacja energetyczna - przeprowadzenie robót budowlanych m.in. w zakresie: wykonania docieplenia dachu, wymiany okien i drzwi, ocieplenia i izolacji ścian, wykonania konstrukcji pod instalację solarną, robót rozbiórkowych i prac remontowych oraz wykonanie instalacji odgromowej.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2019

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty izolacyjne na ścianach piwnic, wymianę kanalizacji zewnętrznej oraz częściową wymianę stolarki otworowej.

2020

W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie zaplanowane prace budowlane - zadanie zakończone.



Olchawy 3-5 – budynek przed modernizacją



Olchawy 3-5 – budynek po modernizacji

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	1 511 875	23 715	120 465	1 367 695	nd.
Fundusze strukturalne	736 127	16 388	72 014	647 725	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	nd.
Środki kredytu	0	0	0	0	nd.
Środki własne	775 748	7 327	48 451	719 970	nd.

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. WIOSNY LUDÓW 23-37

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2021-2023

LOKALIZACJA

UL. WIOSNY LUDÓW 23-37

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Zadanie dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2021

Opracowano dokumentację projektową.

2022

Realizowano roboty budowlane (docieplenie ścian piwnic, wymianę okien, modernizację i izolację instalacji c.o., instalacje wody i kanalizacji w mieszkaniach, instalację odgromową, prace w obrębie piwnic i loggii, instalacje elektryczne na klatkach schodowych) oraz zamontowano tablicę informacyjną.

2023

Kontynuowano roboty budowlane (izolacja ścian podziemnych budynku, izolacja ścian nadziemnych budynku, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach mieszkalnych oraz instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, budowa nowej instalacji gazowej, wymiana okien, montaż kominków odpowietrzenia kanalizacji, prace remontowe przy posadzkach i ścianach klatek schodowych, prace przy zagospodarowaniu terenu, montaż fotowoltaiki i remont pokrycia dachowego). Projekt zakończono.



Wiosny Ludów 23-37 – budynek przed modernizacją



Wiosny Ludów 23-37 – budynek po modernizacji

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2023 r.
Razem wydatki	11 343 207	72 355	2 052 827	9 218 024	nd.
Fundusze strukturalne	4 271 831	47 515	1 316 587	2 924 298	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki kredytu	4 743 719	11 385	0,00	4 732 334	nd.
Środki własne	2 327 657	13 455	736 240	1 561 392	nd.

CENTRUM SPOŁECZNOŚCIOWE W NIKISZOWCU - I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MOPS + NGO	2017 - 2020	UL. SZOPIENICKA 58	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU Projekt obejmował zadania związane z: animacją lokalną, integracją społeczną, inicjatywami lokalnymi (drobne, niskonakładowe działania, pobudzające społeczność do aktywności, niebędące jednocześnie alternatywą i konkurencją dla inicjatyw lokalnych z ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, budżetu obywatelskiego, małych grantów itp.)			PODOBSZAR REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIE ZAWODZIE ZAŁĘŻE BOGUCICE SZOPIENICE-BUROWIEC ✓ JANÓW-NIKISZOWIEC
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY 2017 Podjęto działania związane z zatrudnieniem kadry realizującej zadania, organizacją projektu tj. przygotowaniem dokumentacji projektowej, promocji projektów, przygotowaniem do realizacji działań projektowych. Podjęto wstępne działania diagnostyczne obszarów objętych projektem tj. osiedla Nikiszowiec, Korea oraz część Janowa. Realizowano działania związane z działaniami Inkubatora Animatorów Nikiszowca. Jego działalność opierała się na regularnych, codziennych spotkaniach z młodzieżą. W ramach działalności Inkubatora niektórzy młodzi ludzie zostali przygotowywani – zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej – do roli przewodnika turystycznego w Nikiszowcu. W ramach działań związanych z rewitalizacją Nikiszowca nawiązano współpracę z miejscowością Ratingen w Zagłębiu Ruhry ze względu na analogie między tymi regionami i wynikającą z tego potrzebę dalszego – bardziej kompleksowego i profesjonalnego – podejścia do działań związanych z wykorzystaniem zasobów turystycznych Nikiszowca i ich wykorzystanie dla rozwoju ekonomicznego miejsca.			
2018 Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych. W okresie sprawozdawczym prowadzono badania pogłębione związane z diagnozą zasobów i potrzeb lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki gentryfikacji osiedla Nikiszowiec. Nawiązywano współpracę z przedstawicielami lokalnych instytucji – zorganizowano spotkania z dyrektorami przedszkoli miejskich na terenie dzielnicy, spotkanie z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych (m.in. KSM, HGSM, ŚląskoDąbrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa), spotkania z liderami Stowarzyszenia Razem dla Nikiszowca, spotkanie z dzielnicowym, spotkania z członkami „Klubu Ślązoka” z Janowa, spotkanie z Radą Osiedla Janów, spotkanie z kierownikiem Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Realizowane były działania w ramach Inkubatora Animatorów Nikiszowca, w tym działania dla młodzieży, m.in. czwartkowe spotkanie w ramach „Gier bez prądu” oraz spotkania dla mieszkańców w ramach cyklu podróżniczego pt. „Stany – szalona jazda”. Realizowano spotkania indywidualne z mieszkańcami dzielnicy i uczestnikami projektu. W ramach projektu realizowano działania animacyjne, integracyjne i edukacyjne. Funkcjonowało Centrum Zimbardo, które było otwarte na spotkania mieszkańców dzielnicy. W Centrum dyżurowali lider i animator inkubatora animatorów. W spotkaniach uczestniczyli także inni animatorzy projektu. W ramach projektu odbywały się spotkania animatorów z mieszkańcami, zorganizowano spotkania, wydarzenia tematyczne oraz wyjazd integracyjno-szkoleniowy.			
W ramach projektu, w okresie sprawozdawczym prowadzono aktywną współpracę z mieszkańcami osiedla Kolonia Wysockiego (Korea). W miesiącu sierpniu miało miejsce spotkanie z przedstawicielami instytucji lokalnych. Dzięki współpracy zostało zrealizowane wydarzenie „Śniadanie na Trawie dla Mieszkańców Korei”. Wydarzenie to integrowało całą społeczność poprzez wspólne jedzenie, rozmowę oraz zabawy. Od września odbywały się spotkania z młodzieżą zamieszkałą w dzielnicy, zwłaszcza na obszarze Kolonii Wysockiego. W wyniku wielu rozmów oraz spotkań ze społecznością lokalną dzielnicy doszło m.in. do realizacji kilku inicjatyw lokalnych m. in.: we współpracy ze Stowarzyszeniem Ad Vitam Dignam włączono się w organizację: otwarcia ogrodu sensorycznego na terenie Janowa, pomoc dla Miejskiego Przedszkola nr 62 w Katowicach i pomogli w organizacji „Jesiennych spotkań w ogrodzie”.			

W ramach projektu rozpoczęto także realizację poradnictwa specjalistycznego. W październiku wspólnie z uczestnikami projektu przygotowano pierwszy numer gazety lokalnej pt. „Magiel. Niecodziennik Nikiszowiecki”. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów sprzętu komputerowego i biurowego. W dniach 26-28.10 odbyła się wizyta studyjna do Łodzi. Istotnym elementem wizyty było wspólne doświadczanie różnorodnych działań rewitalizacyjnych w różnych częściach miasta. W ramach spotkań i wspólnej pracy animatorów i mieszkańców poruszano tematy związane m.in. z efektami działań rewitalizacyjnych, skalą wyzwań, jakie czekają Nikiszowiec i Janów oraz różnicami w podejściu do aktywizacji społeczności lokalnej w Łodzi i w Janowie-Nikiszowcu.

2019

Zrealizowano następujące działania:

- 13 spotkań animatorów lokalnych z mieszkańcami Osiedla Kolonia Wysockiego oraz 34 spotkania z mieszkańcami dzielnicy Janów w ramach usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym,
- 5 treningów nordic walking w ramach spotkań z animatorem lokalnym,
- 4 cykle akcji „Sprzątamy na Janowie” oraz „Sprzątamy na Korei”,
- 2 Dni Sąsiada – na Janowie i na Osiedlu Kolonia Wysockiego,
- inicjatywy dla mieszkańców m. in.: „Piknik na trawie”, budowa „domku na książki”,
- spotkania w ramach akcji: „Wakacje na Korei”, „Piknik na Korei”, „Wakacje na Grodowej”, „Szkoła jazdy na rolkach”, „Gry bez prądu”
- spotkania w ramach: warsztatów decoupage dla mieszkańców dzielnicy oraz rękodzieła, kursu języka angielskiego, 5 spotkań w ramach poradnictwa specjalistycznego – coaching rodzicielski,
- 2 spotkania w ramach poradnictwa specjalistycznego – job coaching, indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne i dietetyczne dla mieszkańców dzielnicy Janów-Nikiszowiec,
- wydarzenie pt. „Global Girls Game” czyli Walentynkowy Dzień Kobiet na Jantorze,
- wizytę studyjną w Zagłębiu Ruhry,
- 40 spotkań w ramach prób zespołu muzycznego N.I.E. (kontynuacja inicjatywy lokalnej),
- 3 warsztaty kompetencji społecznych – kurs samoobrony, warsztaty rozwoju osobistego i warsztaty stawiania granic,
- wyjazd integracyjno-edukacyjny do Warszawy,
- przygotowano i wydano wraz z mieszkańcami 2 numery bezpłatnej gazety: „Magiel. Niecodziennik Nikiszowiecki”,
- końcem marca zainaugurowano kurs przewodników lokalnych po Nikiszowcu, do którego zaangażowani zostali mieszkańcy dzielnicy. Osoby, które zdały egzamin tworzą sieć lokalnych przewodników.

2020

Wspieraniem w ramach projektu objętych zostało 88 uczestników. W ramach działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach realizowane były działania dla młodzieży, m.in. czwartkowe spotkanie w ramach „Gier bez prądu”. Realizowano spotkania indywidualne z mieszkańcami dzielnicy i uczestnikami projektu (animacyjne, integracyjne i edukacyjne). Funkcjonowało Centrum Zimbardo, w którym odbywały się spotkania mieszkańców dzielnicy. Zrealizowano m. in. następujące działania:

- 48 spotkań animatora lokalnego Korei (Kolonia Wysockiego) z mieszkańcami dzielnicy, w ramach usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym (w tym m.in. warsztaty recyklingowe, warsztaty rękodzieła, spotkania indywidualne, spotkania integracyjne, wyjścia integracyjne, Wakacje na Korei),
- 21 treningów Nordic Walking,
- 3 spotkania w ramach poradnictwa specjalistycznego, 1 spotkanie w ramach poradnictwa specjalistycznego – psycholog, 8 spotkań w ramach poradnictwa prawnego, 15 spotkań w ramach poradnictwa specjalistycznego – poradnictwo terapeutyczne,
- 43 spotkania w ramach kursu z języka angielskiego – większość w formule online oraz zajęcia z języka francuskiego,
- 72 spotkania animatora Osiedla Janów z mieszkańcami dzielnicy,
- 5 inicjatyw lokalnych,
- 21 spotkań animatorów z młodzieżą szkolną dzielnicy,
- 7 prób zespołu muzycznego N.I.E. (kontynuacja inicjatywy lokalnej)
- 49 indywidualnych spotkań z animatorami,
- 9 tematycznych spotkań edukacyjnych, m.in.: Pierwsza pomoc - zasady ratownictwa medycznego,
- 33 tematyczne spotkania z animatorami z Nikiszowca,
- 5 spotkań z młodzieżą w ramach akcji „Lato w mieście”,
- 12 warsztatów kompetencji społecznych nt. wrażliwości i siły wewnętrznej, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz nt. emocji,
- wydanie 1 numeru gazety „Magiel - Niecodziennik Nikiszowiecki”,
- 4 wyjścia edukacyjno - integracyjne z młodzieżą szkolną dzielnicy m. in. wyjście do kina,
- 1 wyjazd edukacyjno - integracyjny do Wisły,
- 2 wyjścia integracyjne – mikropodróż „Rajza na kole”,
- 3 wyjścia kulturalno - integracyjne,
- 14 spotkań z doradcą zawodowym,
- 3 kursy zawodowe,
- 3 spotkania lokalnych przewodników z Nikiszowca.



Warszaty rękodzieła – kwiecień 2020



Instrukcja szycia maseczek online – kwiecień 2020



Warsztat pszczelarski – czerwiec 2020



Sadzonki dla mieszkańców – maj 2020

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	1 391 748 ⁹	504 881	477 491	342 064	nd.
Fundusze strukturalne	1 182 986	436 733	407 292	303 791	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	139 175	51 385	47 917	35 737	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	69 587	16 763	22 282	2 536	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100068536135029>

⁹ W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 50.288 zł

CENTRUM SPOŁECZNOŚCIOWE W NIKISZOWCU - II ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY

MOPS + NGO

LATA REALIZACJI

2020-2022

LOKALIZACJA

UL. SZOPIENICKA 58

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zadania związane z: animacją lokalną, integracją społeczną, inicjatywami lokalnymi (drobne, niskonakładowe działania, pobudzające społeczność do aktywności, niebędące jednocześnie alternatywą i konkurencją dla inicjatyw lokalnych z ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, budżetu obywatelskiego, małych grantów itp.).

PODOBSZAR
REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

✓ JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2020

W dniu 30 października 2020 r. rozpoczęto realizację projektu. Zaangażowano do pracy kadre, w tym organizatorów społeczności lokalnej, którzy rozpoczęli działania zmierzające do rekrutacji uczestników do projektu, dokonali analizy zastanej po I etapie sytuacji społecznej w dzielnicy oraz zaplanowali działania merytoryczne planowane do realizacji od 2021 r. Zorganizowano pierwsze indywidualne spotkania z animatorami oraz warsztaty artystyczne z tworzenia świątecznych kompozycji.

2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zrealizował m.in. następujące działania:

- 18 spotkań Klubu Seniora – warsztaty artystyczne dla Seniorów prowadzone przez animatora (ogródek w szkole, doniczki recyklingowe, wianki wiklinowe, świece żelowe, warsztaty florystyczne, ozdobne poduszki),
- 12 spotkań Klubu Seniora – gry karciane,
- 4 wyjazdy dla seniorów,
- 30 warsztatów rękodzieła,
- 80 treningów Nordic Walking, w tym 4 dla seniorów,
- 10 treningów jogi dla seniorów,
- 27 spotkań indywidualnych z animatorem,
- 5 warsztatów pn. „Naturalnie”,
- 7 spotkań pn. „O Janowie”,
- 9 spotkań pn. „Szyciowa partyzantka”,
- 4 spotkania pn. „Eko warsztaty”,
- 3 wycieczki rowerowe pn. „Rajza na kole”,
- 6 warsztatów „Akcja Fermentacja” (kiszenie warzyw i owoców),
- 3 spotkania pn. „Śniadanie na trawie”,

W ramach Organizacji wydarzeń proekologicznych zrealizowano:

- 3 wydarzenia pn. „Sprzątanie Janowa”,
- 1 spotkanie pn. „Wymiana roślin”,
- 1 wydarzenie pn. „Miododajna donica”,
- 1 konkurs pn. „Moja miododajna sadzonka”.

W ramach Inicjatywy lokalnej zrealizowano:

- 1 spotkanie pn. „O Janowie przy kawie”,
- 1 spotkanie pn. „Grill na powitanie lata”,
- 6 spotkań pn. „Letnia szkoła jazdy na rolkach”,
- 1 spotkanie pn. „Kartka dla Hospicjum”,
- 1 wyjście integracyjne – kulturalne,
- ognisko integracyjne,
- wyjście do kina.

Partner projektu Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych zrealizował m.in. następujące działania:

- 38 spotkań animatorów z młodzieżą szkolną dzielnicy,
- 28 indywidualnych spotkań z animatorami,
- 2 warsztaty z rękodzieła,
- 5 warsztatów kulinarnych,
- 30 spotkań specjalistycznych – job coaching,
- 42 spotkania specjalistyczne – poradnictwo psychologiczne,
- 18 tematycznych spotkań z animatorem,
- 3 spotkania z organizacjami i instytucjami,
- 6 inicjatyw lokalnych,
- 13 spotkań edukacyjnych,
- 4 wyjścia edukacyjno – integracyjne,
- 1 warsztat kompetencji społecznych,
- 10 spotkań edukacyjnych.

Projekt „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu – II etap” w zakresie zadania „Remont i adaptacja oraz funkcjonowanie lokalu przy ul. Rymarskiej 4 na potrzeby realizacji usług aktywnej integracji w projekcie” realizowany jest przez Muzeum Historii Katowic. W 2021 roku w ramach zadania przeprowadzono remont i zakupiono wyposażenie, co pozwoliło wyodrębnić w obiekcie muzeum, przestrzeń na działania animacyjne dla mieszkańców.

2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zrealizował m.in. następujące działania:

- 56 treningów Nordic Walking,
- 45 warsztatów artystycznych takich jak tworzenie ozdobnych świec, pachnących zawieszek do szafy, kremów do rąk, ozdób świątecznych, wysiew nasion oraz nasadzenia kwiatów,
- 41 spotkań indywidualnych z animatorem,
- 5 spotkań pn. „Przerabiamy”,
- 1 bieg z okazji 300-lecia Janowa,
- 4 spotkania pn. „Z etnografią na Ty”,
- 6 spotkań pn. „Poczytane”,
- 5 wyjść kulturalnych do kina i NOSPR,
- 12 zajęć z jogi dla mieszkańców,
- 5 spotkań dot. poradnictwa specjalistycznego – zdrowy kręgosłup,
- 11 spotkań dot. poradnictwa psychologicznego,
- 40 spotkań przy grach karcianych w ramach klubu społecznościowego „Senior w działaniu”,
- 34 warsztaty rękodzieła w ramach klubu społecznościowego „Senior w działaniu”, m.in.: warsztaty florystyczne, tworzenie ozdobnych domków dla ptaków, wyszywanki, makrama,
- 22 treningi jogi dla seniorów „Senior w ruchu”,
- cykl warsztatów wizażu dla seniorów – 4 warsztaty grupowe,
- cykl „Na zdrowie”, w ramach którego odbyły się 3 grupowe spotkania z psychologiem,
- 6 wyjazdów jednodniowych w ramach cyklu „Senior w podróży”, w ramach których seniorzy zwiedzili min.: górę Żar, stację kolei wąskotorowej w Rudach, wystawę obrazów Van Gogha, Teatr Korez i Planetarium Śląskie.

Partner projektu – Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych zrealizował m.in. następujące działania:

- 51 spotkań animatorów z młodzieżą szkolną dzielnicy,
- 21 spotkań edukacyjnych,
- 5 warsztatów oddychania,
- 6 warsztatów kompetencji społecznych,
- 6 wyjść kulturalno-integracyjnych,
- 2 inicjatywy lokalne (wystawa obrazów oraz inicjatywa pn. „Jesteśmy razem”),
- 10 indywidualnych spotkań z animatorem,
- 36 spotkań grupowych z animatorem,
- 3 spotkania integracyjne z młodzieżą.



Dzień sąsiada – wrzesień 2021



Bieg z okazji 300 lecie Janowa – listopad 2022



Nordic walking – październik 2022



Spotkanie „Przerabiamy” – październik 2022

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2023 r.
Razem wydatki	1 179 616	525 471	654 145	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	1 006 645	525 471	481 174	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	172 971 ¹⁰	0,00	172 971	nd.	nd.

¹⁰ W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 38.602 zł

ROZBUDOWA OBIEKTU JANTOR II NA LODOWISKO Z INSTALACJĄ MROŻENIOWĄ, SALĄ GIMNASTYCZNĄ, ZAPLECZEM SZATNIOWO – SANITARNYM WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM POMIĘDZY LODOWISKAMI JANTOR I I JANTOR II

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE/MOSIR	2018-2019	UL. NAŁKOWSKIEJ 11	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU Projekt obejmował wykonanie płyty lodowiska wraz z instalacją mrożeniową i bandami, wykonanie zaplecza i łącznika między lodowiskami Jantor I i Jantor II, modernizację sali gimnastycznej z wykonaniem podłogi sportowej.			PODOBSZAR REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIE ZAWODZIE ZAŁĘŻE BOGUCICE SZOPIENICE-BUROWIEC ✓ JANÓW-NIKISZOWIEC
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY 2018 Wykonano mapę do celów projektowych, dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami branżowymi i pozwoleniem na budowę; projekt wykonawczy prac. Zakres prac budowlanych: 1) Wykonanie lodowiska, w tym: nowa płyta lodowiska, technologia chłodzenia, bandy - wykonano częściowo; 2) Wykonanie dla lodowiska zaplecza i łącznika pomiędzy obiektami Jantor I i Jantor II, w tym: roboty budowlane i konstrukcyjne, roboty elektryczne, instalacyjne wentylacyjne, wykonanie systemu ppoż. i monitoringu wizyjnego - wykonano częściowo; 3) Modernizacja sali gimnastycznej, w tym: roboty rozbiórkowe, wzmocnienie konstrukcji stalowej sali gimnastycznej, roboty budowlane, ułożenie parkietu - wykonano częściowo. 2019 Wykonano roboty budowlane i konstrukcyjne, elektryczne, instalacyjne i wentylacyjne, wykonano system ppoż. i monitoring wizyjny, usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. Zadanie zakończone i odebrane.			

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	8 649 199	nd.	6 149 199	2 500 000	nd.
Fundusze strukturalne	0	nd.	0	0	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	3 300 000	200 000	nd.
Środki kredytu	0	nd.	0	0	nd.
Środki własne	5 149 199	nd.	2 849 199	2 500 000	nd.

ZAMKOWA - "ULICA OBIETNIC" - REMONT DROGI (BO)

PODMIOT REALIZUJĄCY

MZUim

LATA REALIZACJI

2020-2021

LOKALIZACJA

UL. ZAMKOWA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

✓ JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2020

Opracowano dokumentację projektową.

2021

Zakończono procedurę przetargową. Podpisano umowę z Wykonawcą.

2022

Wykonano wymianę nawierzchni chodników, wjazdów i jezdni wraz z wykonaniem nowego oznakowania poziomego i pionowego na odcinku od ul. Zamkowej do przejazdu kolejowego. Zadanie zrealizowane.



Ul. Zamkowa – przed remontem



Ul. Zamkowa – po remoncie

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2023 r.
Razem wydatki	592 425	79 950	512 475	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	592 425	79 950	512 475	nd.	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://archiwumbo.katowice.eu/Projekty/Strony/Zamkowa---ulica-obietnic---remont-drogi.aspx>

MOJE WYBORY – MOJE KWALIFIKACJE – MOJE ZAWODOWE PERSPEKTYWY. NOWOCZESNE I AKTYWNE ZDOBYWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY

ZSZ NR 3/CUW

LATA REALIZACJI

2016-2018

LOKALIZACJA

DZIELNICA JANÓW-NIKISZOWIEC

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było powiązanie wiedzy zdobywanej przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach w trakcie procesu kształcenia z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Projekt obejmował organizację kursów oraz staży dla uczniów szkoły. Projekt współfinansowany był ze środków RPO WSL 2014-2020 – poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

✓ JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W okresie sprawozdawczym zakończono kurs rozpoczęty w 2017 roku dla 12 uczniów w zawodzie technik elektronik; przeprowadzono kurs w zakresie uprawnień elektrycznych SEP dla 10 uczniów, zakończony egzaminem; kurs montażu instalacji fotowoltaicznych dla 10 uczniów; warsztaty samokształcenia i doradztwa zawodowego dla 14 uczniów; kontynuowano dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie odnawialnych źródeł energii dla 2 nauczycieli; realizowano staże i praktyki zawodowe dla 4 uczniów w zawodzie technik elektryk, dla 8 uczniów w zawodzie technik elektronik, dla 3 uczniów w zawodzie technik górnictwa podziemnego; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	169 350	90 585	78 765	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	141 672	74 722	66 950	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	16 667	8 791	7 876	nd.	nd.
Środki kredytu	0	0	0	nd.	nd.
Środki własne	11 010	7 072	3 938	nd.	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/Moje-wybory---moje-kwalifikacje---moje-zawodowe-perspektywy--Nowoczesne-i-aktywne-zdobywanie-kwalifikacji-zawodowych.aspx>

NAUCZYCIELEM WSZYSTKIEGO JEST PRAKTYKA – MODERNIZACJA BAZY WARSZTATOWO-DYDAKTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3 W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

ZSZ nr 3

LATA REALIZACJI

2015-2017

LOKALIZACJA

UL. SZOPIENICKA 66

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował przebudowę bazy warsztatowo-dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

✓ JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Zapłacono I ratę za dozór techniczny projektu. Ponadto środki zaplanowano na wyposażenie warsztatów w nowoczesny sprzęt w celu umożliwienia uczniom zdobywania praktycznych umiejętności w zakresie elektryki, elektrotechniki, górnictwa i ekonomii. Realizacja zadania była kontynuowana w 2017 roku w związku z późnym terminem podpisania umowy o dofinansowanie.

2017

Wykonano remont i modernizację budynku warsztatów szkolnych oraz pracowni; zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, projektor z tablicą interaktywną, sprzęt komputerowy, maszyny specjalistyczne (m.in. do metalu, drewna, spawania, dokonywania pomiarów geodezyjnych) oraz szafy narzędziowej. Projekt zakończono.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2018 r.
Razem wydatki	1 106 142	43 050	1 063 092	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	733 448	10 200	723 248	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	nd.	nd.
Środki kredytu	0	0	0	nd.	nd.
Środki własne	372 694	32 850	339 844	nd.	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/Nauczycielem-wszystkiego-jest-praktyka---modernizacja-bazy-warsztatowo-dydaktycznej-w-Zespole-Szk%C3%B3%C5%82-Zawodowych-nr-3-w-Katow.aspx>

Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach).

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	OBSZAR ZDEGRADOWANY	STATUS PROJEKTU
MOPS	2015-2017	WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC, DAB	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zadania związane z: diagnozą potrzeb mieszkańców – działania realizowane w ramach aktywnej integracji (pozyskiwanie i wyszkolenie lokalnych liderów, wsparcie animatora lokalnego, organizacja warsztatów umiejętności społecznych), wolontariatem, działaniami o charakterze środowiskowym.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016


W 2016 roku uczestnictwo w PAL-W rozpoczęło 41 osób. W ramach Programu zorganizowano m.in.: wyjazdowy trening kompetencji społecznych, w którym udział wzięło 12 uczestników; szkolenia i spotkania animacyjne - odbyło się 149 spotkań z animatorami (spotkania z mieszkańcami, spotkania z młodzieżą, spotkania indywidualne, Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich), a także zorganizowano 6 spotkań z przedstawicielami instytucji lokalnych; Lokalną Strefę Kobiet – zajęcia animacyjno-integracyjne dla mieszkanki dzielnicy. Odbyło się 31 spotkań (w tym spotkania z animatorem, spotkania edukacyjno-integracyjne, zajęcia fitness, wyjścia integracyjne dla mam z dziećmi, a także zatrudniono opiekunkę do dzieci). Lokalna Strefa Kobiet skupiła 13 uczestniczek, wydarzenia lokalne – Program wsparł organizację biegu przełajowego organizowanego przez Gimnazjum nr 9, w którym uczestniczyło 40 osób, a także Objazdowego Kina Dzielnicowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa, w którym wzięło udział ok. 100 mieszkańców, Dni Wełnowca-Józefowca, w których udział wzięło ok. 250 mieszkańców, a także Andrzejki dla mieszkańców, w których uczestniczyło 17 osób, warsztaty genealogiczne przeprowadzone przez mieszkańca dzielnicy dla 6 osób, 3 wyjścia integracyjne dla uczestników i ich otoczenia. W wyjściach wzięło udział 10 osób. W 2016 r. Program pozyskał 8 wolontariuszy (2K/6M), którzy pomagali w organizacji wydarzeń lokalnych.

2017

W 2017 roku w Programie rozpoczęły udział 24 osoby (18K i 6M). Łącznie w 2017 roku w warsztatach, spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Program wzięło udział 344 osoby (239 K i 105 M), w tym 49 uczestników Programu (41 K i 8 M). Prowadzono działania związane z organizowaniem społeczności lokalnej, w tym spotkania z mieszkańcami (spotkania z animatorem lokalnym, zajęcia rękodzielnicze, kulinarne, zajęcia Lokalnej Strefy Kobiet, w ramach, której zapewniono opiekę nad dziećmi). Realizowano również działania z zakresu integracji: podczas ferii zimowych (m.in. Muzeum Śląskie, Warsztaty Terapii Zajęciowej UNIKAT, Jump World), podczas wakacji letnich (m.in. sąsiedzki grill, wyjście integracyjne do kręgielni, PAL-FEST), wyjścia integracyjne z grupą mam z dziećmi do bawilandii oraz zorganizowano wyjście integracyjne do teatru. Odbyło się kilka wydarzeń lokalnych, m.in. gra terenowa dla rodzin „Polowanie na PALoWe pisanki”, „Szafing – wymiana odzieży”, czy Dni Wełnowca-Józefowca. Podpisano 7 porozumień o wolontariacie. Wolontariuszka - mieszkanka prowadziła otwarte zajęcia fitness dla mieszkanki ww. dzielnic. Pracownicy PAL-W wspierali mieszkańców w realizacji 2 projektów w ramach inicjatyw lokalnych. Zorganizowano wyjazdowy Trening Umiejętności Społecznych.



Grill sąsiedzki - lipiec 2017 r.



**Program Aktywności Lokalnej
Wełnowiec-Józefowice-Dąb**



Dzień otwarty - październik 2015 r.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2017 r.
Razem wydatki	344 563	71 171	123 455	149 937	nd.
Fundusze strukturalne	344 563	71 171	123 455	149 937	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	nd.
Środki kredytu	0	0	0	0	nd.
Środki własne	0	0	0	0	nd.

Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębnie (w ramach projektu pn. Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach).

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	OBSZAR ZDEGRADOWANY	STATUS PROJEKTU
MOPS	2018-2020	WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC, DAB	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zadania związane z: diagnozą potrzeb mieszkańców – działania realizowane w ramach aktywnej integracji (pozyskanie i wyszkolenie lokalnych liderów, wsparcie animatora lokalnego, organizacja warsztatów umiejętności społecznych), wolontariatem, działaniami o charakterze środowiskowym. Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX, Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR”.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W 2018 roku uczestnictwo w PAL-W rozpoczęło 35 osób. Prowadzono szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej. PAL-W w tym okresie w sumie objął swoimi działaniami 310 osób, w tym 35 uczestników. Zrealizowano 183 spotkania animatorów ze społecznością lokalną, 13 warsztatów twórczych, 60 spotkań Klubu Wolontariusza, 37 spotkań w ramach Klubu Aktywnego Mieszkańca, 11 wydarzeń lokalnych, 7 wyjść integracyjno-edukacyjnych, 8 spotkań w ramach Lokalnej Strefy Cyfrowej, 3 dniowy wyjazd Trening Umiejętności Społecznych w Lalikach.

2019

W ramach Programu Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębnie (PAL-W) prowadzono szereg działań na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej. Projekt w tym okresie w sumie objął swoimi działaniami 690 osób. Zrealizowano 189 warsztatów i spotkań animacyjnych, 47 spotkań edukacyjno-integracyjnych, 20 spotkań dla seniorów i młodzieży w ramach Lokalnej Strefy Cyfrowej, 22 wyjścia integracyjno-edukacyjne, trzydniową wycieczkę krajoznawczą, 11 wydarzeń lokalnych, w których udział wzięło ok. 410 osób.

2020

PAL-W w tym okresie w sumie objął swoimi działaniami 234 osoby. Zrealizowano: 89 spotkań animatorów ze społecznością lokalną (w tym online), 46 spotkań edukacyjno-integracyjnych, 6 spotkań w ramach Lokalnej Strefy Cyfrowej, 15 wyjść i wyjazdów edukacyjno – integracyjnych, 2 kursy kwalifikacyjne z I pomocy przedmedycznej, wydarzenie lokalne: sprzątanie Wełnowieckich Alp „Zielona Hałda 2” wraz z boguckim Programem Aktywności Lokalnej.



Lokalna Strefa Rodzica i Smyka – maj 2020



Dzień kobiet – marzec 2019



Haloween – październik 2019



Warszaty świąteczne – grudzień 2019



Wyjście do kina Rialto – październik 2019



Szafing wietrzenie szafy – maj 2018

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	584 639	188 391	217 019	179 229	nd.
Fundusze strukturalne	502 732	168 517	190 138	144 076	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	81 907	19 874	26 881	35 153	nd.

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.facebook.com/welnowieczozefowiecdab>

KATOWICE MIASTO OTWARTE – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH – I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	ODDZIAŁYWANIE	STATUS PROJEKTU
MOPS + NGO + PODMIOT PRYWATNY	2018-2019	HORYZONTALNE	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował zwiększenie zdolności do zatrudnienia, integrację społeczno-zawodową oraz poprawę funkcjonowania społecznego uczestników projektu, wywodzących się z grup i środowisk doświadczających wykluczenia społecznego bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby bezdomne, bezrobotne i bierne zawodowo, uzależnione, osoby z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

W okresie sprawozdawczym zatrudniono kadrę i rozpoczęto rekrutację uczestników oraz realizację usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej; prowadzono ośrodek "Integracja", w ramach którego realizowano: krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością, krótkookresowy pobyt dzienny dla osób z autyzmem, usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, dietetyka, fizjoterapeuty.

2019

Kontynuowano prowadzenie ośrodka "Integracja" w ramach, którego realizowano m.in. krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością, krótkookresowy pobyt dzienny dla osób z autyzmem, usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z serii spotkań z fizjoterapeutami. Prowadzone były zajęcia z pacjentami obejmujące: ćwiczenia usprawniające dopasowane indywidualnie dla pacjenta z wykorzystaniem sprzętów (orbitrek, bieżnia, rower stacjonarny, Redcord), gimnastyka, zabiegi fizykoterapeutyczne (elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, sonoterapia i terapia światłem Biopton), masaże (klasyczny, centryfugalny, poprzeczny, funkcyjny), terapia manualna, terapia manualna tkanek miękkich oraz grupowe ćwiczenia relaksacyjne i aromaterapia.). Uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z indywidualnych i grupowych konsultacji z dietetykiem. Przeprowadzono z uczestnikami wywiady żywieniowo-zdrowotne, analizę nawyków żywieniowych, składu ciała, ocenę stanu odżywiania. Każdy uczestnik otrzymał zalecenia dietetyczne, przepisy na przekąski, analizowano dzienniczek posiłków, tworzone indywidualne diety. Uczestnicy krótkookresowych pobytów dziennych wyjechali wraz z rodzicami oraz terapeutami na wyjazd terapeutyczny do Lalik. W trakcie wyjazdu uczestnicy wraz z rodzicami korzystali z zabiegów fizjoterapeutycznych, zwiedzali Wisłę oraz Istebną, uczestniczyli w zajęciach z kynoterapii, regionalnych zajęciach edukacyjnych w Zagrodzie Edukacyjnej w Koniakowie, warsztatach edukacyjnych bez drutów i szydeł. Zorganizowano również dla rodziców i uczestników oraz terapeutów krótkookresowych pobytów dziennych Wigilię.



*Zajęcia w ramach krótkookresowego pobytu
dziennego, 2019 r.*



Działania towarzyszące CUS, 2019 r.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	3 365 254	nd.	1 100 642	2 123 878	nd.
Fundusze strukturalne	2 660 650	nd.	934 770	1 688 953	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	250 413	nd.	87 242	159 694	nd.
Środki kredytu	0	nd.	0	0	nd.
Środki własne	454 191	nd.	78 630	275 231	nd.

KATOWICE MIASTO OTWARTE – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH – II ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	ODDZIAŁYWANIE	STATUS PROJEKTU
MOPS + NGO	2020-2022	HORYZONTALNE	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt adresowany był do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących wszystkie obszary rewitalizowane w Katowicach (wskazane w LPR) lub korzystających ze wsparcia oferowanego w ramach Centrum Usług Społecznych (CUS) (zlokalizowanego na terenie rewitalizowanym przy ul. Francuskiej 43). Zadania projektu obejmował: krótkookresowe wsparcie dzienne dla niskofunkcjonujących osób niepełnosprawnych, krótkookresowe wsparcie dzienne dla osób z autyzmem, organizację wsparcia środowiskowego i asystenckiego, działania towarzyszące w centrum usług społecznych – rehabilitacja i ćwiczenia ogólnorozwojowe.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2020

Wyłoniono wykonawcę do świadczenia usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON). Wykonawca rozpoczął rekrutację personelu oraz przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu. Do skorzystania z usług AOON zrekrutowano 3 osoby niepełnosprawne, które skorzystały łącznie ze 136 godzin wsparcia.

2021

W okresie sprawozdawczym z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) skorzystało 80 osób, w tym 26 osobom zapewniono wsparcie w dotarciu na szczepienie przeciwko COVID-19. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 16 062,5 godzin zegarowych usługi AOON. Ponadto w okresie sprawozdawczym, ogłoszono ponownie postępowanie na Świadczenie usług Opiekuna osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania.

2022

W ramach projektu świadczone usługi Opiekuna osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania. Opiekunowie zrealizowali 106,5 godziny dla 4 osób. W dniu 31.03.2022 roku zakończono realizację projektu.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2023 r.
Razem wydatki	707 069	684 949	22 120	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	601 008	584 234	16 774	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	56 565	54 987	1 578	nd.	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	49 495	45 728	3 767	nd.	nd.

WZMOCNIENIE SYSTEMU WSPARCIA OSÓB W WIEKU SENIORALNYM ORAZ ICH ŚRODOWISKA RODZINNEGO - I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	ODDZIAŁYWANIE	STATUS PROJEKTU
MOPS + NGO	2017 - 2020	HORYZONTALNE	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt miał na celu rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców Katowic poprzez realizację usługi asystenta rodziny, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz mieszkania treningowego. Projekt skierowany był do osób, głównie z dzielnic: Śródmieścia, Załęża, Zawodzia, Bogucic, Janowa-Nikiszowca oraz Szopieniec-Burowca.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2017

Podjęto działania związane z zatrudnieniem kadry realizującej zadania, organizacją projektu tj. przygotowaniem dokumentacji projektowej, promocji projektów, przygotowaniem do realizacji działań projektowych. Przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu poprzez informowanie seniorów przez organizatorów społeczności lokalnej o ofercie projektu na spotkaniach, w których ww. uczestniczą np. w Klubie Ślązaka, Kafe Byfjy, MDK Bogucice, plakaty informujące o spotkaniach umieszczone w kluczowych miejscach dzielnic: w bibliotekach, przy szkołach, tablicy miejskiej, administracjach budynków, klatkach schodowych, facebooku Centrum Zimbardo.

W dzielnicy Janów – Nikiszowiec odbyły się: spotkanie z seniorami w ramach spotkań „Klubu Ślązaka” gdzie przedstawiono założenia projektu senioralnego, spotkania Klubu Społecznościowego, warsztaty decoupage, warsztaty „Stroiki na Wszystkich Świętych”, zajęcia z dietetykiem w ramach cyklu zajęć edukacyjnych, spotkania przedświąteczne.

W dzielnicy Bogucice odbyły się zajęcia „Klubu seniora”, w ramach których odbyły się warsztaty kreatywne, spotkanie ze specjalistą podologiem, spotkanie z dietetykiem na temat zdrowego odżywiania, warsztaty poświęcone przygotowaniom do Świąt Bożego Narodzenia Seniori, na których tworzone świąteczne dekoracje.

2018

W dzielnicy Bogucice działania realizowane są przez MOPS. W ramach Programu zorganizowano spotkania klubu społecznościowego „Senior w działaniu”, w czasie których odbyły się warsztaty rękodzieła, warsztaty kulinarne, warsztaty z tworzenia naturalnych kosmetyków oraz obchodzono „Tłusty czwartek”. Podczas jednego ze spotkań Klubu przedstawiono informacje na temat „Miejskiego systemu powiadamiania ratunkowego dla starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Katowic”. Odbyły się spotkania z dietetykiem w ramach cyklu „Na Zdrowie”. Również w ramach tego cyklu seniorzy zgłębiali tajniki ziołolecznictwa, wysłuchali wykładów dot. znaczenia aktywności ruchowej w życiu seniorów oraz stylu życia. Odbywały się treningi nordic walking. W ramach cyklu spotkań „Senior w Akcji” odbywały się systematyczne spotkania pod hasłem „Czytamy boguckim maluchom” w Miejskim Przedszkolu nr 22 w Katowicach. W ramach wspomnianego cyklu zajęć seniorzy zorganizowali również „Ogrodowy Turniej Scrabli”. W okresie sprawozdawczym seniorzy brali również udział w kulturalnych propozycjach Miasta Katowice tj „IV katowickim Dniu Aktywnego Seniora” czy darmowych wtorkach w Muzeum Śląskim. W ramach cyklu „Senior w podróży” zorganizowano wyjazd do ogrodów Kapias w Goczałkowicach – Zdroju oraz na Równicę w Ustroniu.

W dzielnicy Nikiszowiec-Janów działania realizowane są przez MOPS. W ramach Programu zorganizowano spotkania Klubu Społecznościowego, wyjazd do Gliwic, biesiadę dla seniorów. Ponadto zrealizowano jednodniowe wyjazdy m. in. : do ogrodu botanicznego w Mikołowie, wyjazd do ogrodów - Kapias w Goczałkowicach Zdroju i Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Realizowane były również zajęcia z nordic walking. Zorganizowano kolejne spotkania z dietetykiem oraz spotkanie z fizjoterapeutką w ramach cyklu „Na zdrowie”. Odbyły się spotkania z wizażystką w ramach zadania - „Piękna Seniora – przystojny Senior”.

W dzielnicy Zawodzie działania realizowane są przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”, które prowadzi Dzielnicową Akademię Seniora, w ramach której zrealizowano: 254 spotkań animatorów lokalnych, 25 spotkań integracyjno-edukacyjnych, trening Umiejętności Społecznych „Aktywność społeczna i obywatelska w otoczeniu lokalnym”, 2 wizyty studyjne polegające na wymianie doświadczeń z seniorami działającymi aktywnie na terenie innych miast – jedna w stowarzyszeniu Aktywny Wojkowicki Senior, a druga w Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie, kurs z zakresu obsługi urządzeń IT dla seniorów, 5 wydarzeń lokalnych o charakterze międzypokoleniowym m.in. Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy, wyjazdy i wyjścia integracyjne.

W *dzielnicy Załęże* zrealizowano działania w ramach Senioralnej Akademii Obywatelskiej (SAO), gdzie uczestnicy zostali przygotowani do podejmowania działań samopomocowych, wolontariatu. W ramach SOA parter projektu - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA” zrealizował:

- trening umiejętności społecznych,
- miniprojekty na rzecz społeczności lokalnej,
- spotkanie integracyjne oraz piknik integracyjny,
- integracja międzypokoleniowa w Przedszkolu nr 26,
- piknik, skierowany do tzw. trudnej młodzieży i dzieci w wieku 8-13 lat,
- warsztaty informatyczne warsztaty nt. zdrowia, praw i obowiązków seniora, inicjatywy obywatelskiej,
- seminaria z zakresu praw i obowiązków seniorów: np. prawa seniora w UE, prawa pacjenta,
- działania środowiskowe i samopomocowe skierowane do seniorów, ich rodzin i społeczności lokalnej,
- Kulturalne Kato (2 wyjścia do kina, 1 wyjście do teatru, 1 wyjście na występy kabaretowe, wyjście do Muzeum Śląskiego, wyjście do NOSPR oraz wyjście na Jarmark Świąteczny w Katowicach)
- wycieczki integracyjne do Pszczyny i do Cieszyna,
- zajęcia ruchowe,
- warsztaty manualna, rozwojowe i relaksacyjne,
- „Dzień seniora”.

W *dzielnicy Śródmieście* działania realizowane są przez Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”. W ramach działań w dzielnicy Śródmieście realizowane były:

- warsztaty: IT, warsztaty z języka angielskiego, warsztaty psychologiczne/psychoedukacyjne, warsztaty ruchowe, warsztaty ekonomia w domu, warsztaty rehabilitacyjne oraz psychoterapia indywidualna,
- nagranie cyklicznej audycji redaktor Beaty Tomanek w Radiu Katowice – audycja „Gdzieś obok nas”,
- warsztaty tematyczne w ramach Klubu – Kawiarni Przeciąg, których tematem było przybliżenie uczestnikom kultury kulinarnej Japonii,
- warsztaty „las w słoiku”, warsztaty fotograficzne, warsztaty kulinarne, warsztaty zielarsko – kosmetyczne,
- warsztaty muzyczne, cały rok pracy i spotkań zwieńczony został koncertem Świąteczno – Noworocznym.
- wyjścia do instytucji kulturalnych na spektakle, seanse kinowe, koncerty,
- wernisaże twórczości seniorów,
- udział w Światowym Dniu Seniora, w tym dniu zaproszono uczestników na spotkanie na katowicki Rynek gdzie Stowarzyszenie Teatr Bez Sceny organizowało Święto Seniorów,
- spotkanie andrzejkowe.

W *dzielnicy Szopienice* w działania realizowane są przez Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”. W ramach Klubu „Nasz CzAS” zorganizowano 95 spotkań animatora lokalnego z mieszkańcami oraz grupami senioralnymi, działającymi na terenie dzielnicy. Prowadzona jest akcja „Codziennie szklanka soku”, przeprowadzono warsztat plastyczny. Zorganizowano spotkanie świąteczne oraz prelekcje nt: smogu, zdrowia seniorów oraz przeciwdziałania oszustom.

Odbyły się: spotkanie z animatorem w trakcie „V Festynu ekologicznego Morawa – Borki 2018” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, warsztat „Pierwsza pomoc – senior też potrafi”, wyjazd integracyjny, piknik integracyjny. Włączono się w obchody XXII Dni Szopienic. Wzięto udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych oraz Dniach aktywnego seniora - Katowice Rynek. Zorganizowano 9 warsztatów plastycznych oraz II Integracyjny Piknik Żeglarski w ramach spotkania z animatorem - spotkania Klubu "Nasz CzAS".

W ramach działań kulturalnych i rekreacyjnych uzupełniających wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego zorganizowano:

- warsztatów informatyczne,
- spotkania integracyjne,
- Klub Podróżnika,
- warsztaty Sfilcowane Bogucice 2.0,
- spotkania z popularnymi autorami książek, aktorami teatralnymi, podróżnikami,
- świąteczno-noworoczny koncert Pieśni z placów i salonów,
- wystawę świątecznych ozdób w duchu EKO,
- spotkanie nt. zdrowia.

2019

W dzielnicy Bogucice działania realizowane są przez MOPS w Katowicach. W 2019 roku zrealizowano: spotkania z psychologiem, wycieczki integracyjne, warsztaty teatralne, prelekcje ekologiczne, treningi Nordic Walking, warsztaty wizażu, warsztaty kulinarne, rajd rowerowy, spotkania w ramach cykli: „Senior on-line”, „Senior on-line”, „Senior w akcji”, „Senior w działaniu”, „Na zdrowie”, „Senior w ruchu”.

W dzielnicy Janów-Nikiszowiec zrealizowano: warsztaty psychologiczne, spotkania klubu społecznościowego, spotkania w ramach inicjatywy seniorów, wyjścia do teatru, zajęcia sportowe, spotkania z fizjoterapeutką, spotkania z dietetykiem, wycieczki, spotkanie andrzejkowe, warsztaty z wizażystką.

W dzielnicy Zawodzie zrealizowano: spotkania animatora lokalnego z mieszkańcami, spotkania integracyjno-edukacyjne, stacjonarne szkolenie umiejętności społecznych, wydarzenia lokalne, wizyty studyjne.

W dzielnicy Załęże działania odbyły się następujące działania: zajęcia ruchowe, warsztaty manualne, warsztaty rozwojowe i relaksacyjne, spotkanie w ramach Treningu umiejętności społecznych, spotkania w ramach warsztatów Biorę sprawy w swoje ręce, warsztaty teatralne, seminaria Prawa i obowiązki seniora, wyjścia do Radia Katowice (NOSPRu, teatru, kina), spotkanie integracyjne w ramach tłustego czwartku, wydarzenia lokalne, warsztaty w ramach Treningu Umiejętności Społecznych, zajęcia informatyczne, wycieczka.

W dzielnicy Śródmieście zrealizowano: warsztaty IT, warsztaty z języka angielskiego, warsztaty psychologiczne/psychoedukacyjne, warsztatów ruchowe, warsztaty dot. ekonomii, warsztaty rehabilitacyjne, psychoterapie indywidualną, spotkania filmowych w ramach Klubu-kawiarni „Przeciąg”, warsztaty z ciekawym człowiekiem, warsztat bębniarski, wydarzenia lokalne, warsztat kulinarny.

W dzielnicy Szopienice zorganizowano: spotkania animatora lokalnego z mieszkańcami oraz grupami senioralnymi, akcję „Codziennie szklanka soku”, wyjazdy integracyjne, wykład nt. promocji zdrowia, warsztaty plastyczne, udział w Festynie Rodzinnym w Szopienicach, spotkania integracyjno – świąteczne, wykład edukacyjny nt. zdrowia, spotkania z podróżnikiem, spotkanie w ramach III Tygodnia Kultury Żydowskiej, spotkania szachowe, zajęcia edukacyjne z języka angielskiego, spotkanie dla seniorek pn. „Babski Comber”, warsztaty informatyczne, Dzień Aktywnego Seniora, spotkania w ramach Klubu Podróżnika, warsztaty Sfilowane Bogucice 2.0, spotkania z ciekawymi osobami, 3 koncerty, spotkania ze zdrowiem, „Festyn Trzeźwościowy dla zawodniańskich seniorów”, wyjścia kulturalne, spotkania w ramach cyklu „Niedzielne podwieczorki kulturalne”, wystawy, spotkania w ramach obchodów „Dni Seniora”.

2020

W dzielnicy Bogucice zrealizowano: wyjazdy integracyjne, rajd górski, warsztaty robienia zdrowych soków, spotkania edukacyjno-podróżnicze, spotkania ze współczesnym kinem, akcja czytania bajek w przedszkolu, fotozabawy (online), zajęcia kulinarne, warsztaty z tworzenia obrazów z mchu, Bogucki Spacer Botaniczny z Przyrodnikiem, warsztat Ikebany, warsztaty masażu relaksacyjnego i rehabilitacyjnego, warsztaty psychologiczne, spotkania planszówkowe i karciane, wieczór kołędowy, spotkanie w ramach obchodów "Dnia Kobiet", „Senior w ruchu”, zajęcia ruchowe oraz Nordic Walking.

W dzielnicy Janów - Nikiszowiec zrealizowano: zajęcia sportowe, warsztaty ceramiczne, Biesiada dla seniorów, wyjście do kina, spotkania klubu społecznościowego (np.: warsztaty kreatywne, rękodzielnicze, planszówki), zajęcia klubu społecznościowego z wykorzystaniem grupowej konwersacji na komunikatorze internetowym, internetowe konkursy dla uczestników np. kulinarne, rękodzielnicze z nagrodami, warsztaty wizażowe, warsztaty psychologiczne, konsultacje z psychologiem, wyjazdy integracyjne.

W dzielnicy Zawodzie zrealizowano: spotkania animatora lokalnego z mieszkańcami (m.in. „Lokalna Strefa Wolontariatu”, „Punkt Porad i Informacji Obywatelskich”, „Kawiarenka Sąsiedzka”), spotkania animatora lokalnego z mieszkańcami online poprzez portale społecznościowe, spotkania integracyjno – edukacyjne (w tym online) m.in. ogólnorozwojowa gimnastyka, zajęcia taneczne, organizacja przedsięwzięcia międzypokoleniowego w postaci sztuki teatralnej. Ponadto seniorzy przy pomocy animatorów włączyli się w akcję szycia maseczek dla medyków oraz innych katowickich seniorów.

W dzielnicy Załęże odbyły się następujące działania: zajęcia ruchowe, spotkania nt. inicjatywy obywatelskiej, warsztaty manualne, wsparcie psychologiczne online i telefoniczne dla seniorów, konkursy i zabawy w mediach społecznościowych przeznaczone dla uczestników projektu, spotkania informatyczne, realizacja 2 miniprojektów (inicjatyw) zrealizowanych w pełni przez uczestników projektu, wyjścia kulturalne (do kina, do teatru, do Filharmonii), wyjście integracyjne, wycieczka do Rud Raciborskich, zajęcia relaksacyjne, Biesiady Senioralne, warsztaty wizerunkowe, wizyty studyjne, seminaria edukacyjne dla seniorów. Ponadto prowadzono monitoring sytuacji uczestników, szczególnie osób samotnych - telefonicznie. W razie potrzeby była udzielana drobna pomoc (zakupy, towarzyszenie w załatwianiu spraw urzędowych).

W dzielnicy Śródmieście realizowane były: warsztaty komputerowe (w tym online), warsztaty rehabilitacyjne, warsztaty ruchowe, warsztaty psychoedukacyjne, warsztaty j. angielskiego (w tym online), psychoterapię indywidualną, spotkania w ramach czwartków w „Przeciągu”, warsztatów nt. ekonomii (w tym online).

W dzielnicy Szopienice zorganizowano: spotkania animatora lokalnego z mieszkańcami oraz grupami senioralnymi, akcje „Codziennie szklanka soku”, wyjazdy integracyjne, 2 Dni Aktywnego Seniora, spotkanie w ramach „Klubu Podróżnika, spotkania integracyjne, warsztaty plastyczne, warsztaty plastyczne (decoupage), zajęcia animacyjno-edukacyjno-kulturalne, warsztat kreatywności artystycznej, wernisaż, warsztaty rehabilitacyjnych, koncert, warsztaty „Nowe technologie”. Ponadto animatorzy lokali oraz wolontariusze prowadzili szereg działań angażując się we wsparcie uczestników pomagając im w codziennych zakupach, utrzymując stały kontakt telefoniczny z wszystkimi uczestnikami, wspierając ich w sprawach urzędowych. Prowadzono akcję bezpieczny senior, która miała na celu weryfikację stanu zdrowia seniorów oraz przypominanie im o panujących obostrzeniach. Ponadto seniorzy przy pomocy animatorów włączyli się w akcję szycia maseczek dla medyków oraz innych katowickich seniorów. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zalecenia ogólnokrajowe i zamknięcie placówek kulturalnych od połowy marca 2020 r. wstrzymano oraz zmodyfikowano realizację działań kulturalnych. Z działań odbyła się wystawa online prezentująca twórczość fotograficzną seniorów.

W ramach programu wspierającego rozwój zawodowy mieszkańców Katowic w 2020 roku prowadzono działania aktywizacyjne dla 5 osób. Działania z zakresu integracji zawodowej realizowane są przez Fundację Stałego Rozwoju z Nowego Sącza. W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym zrealizowano m.in.:

- zajęcia w ramach warsztatów aktywizacyjnych,
- zajęcia w ramach indywidualnej edukacji z zakresu orientacji prozawodowej,
- warsztaty psychologiczne,
- indywidualne konsultacje psychologiczne,
- treningi umiejętności społecznych w zakresie doskonalenia komunikacji i motywacji oraz wzmocnienia samooceny,
- kursy kwalifikacyjne,
- staże uczestników zadania publicznego.



Wyjazd do Muzeum Chleba – luty 2020



Nordic walking - październik 2019

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2020 r.
Razem wydatki	2 526 783 ¹	789 804	972 560	687 937	nd.
Fundusze strukturalne	2 152 298	672 123	870 190	687 937	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	253 212	79 074	102 370	71 768	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	121 273	38 607	0,00	6 184	nd.

RAMIĘ W RAMIĘ. ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W KATOWICACH – I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY

MOPS + NGO

LATA REALIZACJI

2018-2019

ODDZIAŁYWANIE

HORYZONTALNE

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt miał na celu rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców Katowic poprzez realizację usługi asystenta rodziny, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz mieszkania treningowego. Projekt skierowany był do osób, głównie z dzielnic: Śródmieścia, Załęża, Zawodzia, Bogucic, Janowa-Nikiszowca oraz Szopienic-Burowca.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2018

Projekt był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem FAON. Partner zatrudnił i przeszkolił dwóch asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, w okresie realizacji projektu prowadzona była ciągła rekrutacja uczestników chętnych do skorzystania z usługi asystenta. Z ww. usługi w okresie sprawozdawczym skorzystało 14 osób niepełnosprawnych. Prowadzone były treningi umiejętności społecznych (m.in. trening finansowy, trening kulinarny, trening zarządzania mieszkaniem, trening autonomii decyzyjnej, trening umiejętności integracji ze społecznością lokalną, trening załatwiania spraw urzędowych) dla czterech grup uczestników. Opiekun mieszkania treningowego nadzorował pracę w mieszkaniu i utrzymywał stały kontakt z rodzinami uczestników, przekazując im informacje o postępach treningu i wskazania do dalszej pracy w środowisku domowym w celu utrwalenia efektów treningu. Rozpoczęto również realizację kolejnego zadania z zakresu rozwoju usług asystenckich – asystę rodziny, w ramach której ze wsparcia 3 asystentów rodziny skorzystały 32 osoby.



Trening spędzania czasu wolnego, 2019 r.

2019

W okresie realizacji projektu prowadzona była ciągła rekrutacja uczestników chętnych do skorzystania z usługi asystenta. Z ww. usługi w okresie sprawozdawczym skorzystało 61 osób niepełnosprawnych. Prowadzone były treningi umiejętności społecznych (m.in. trening finansowy, trening kulinarny, trening zarządzania mieszkaniem, trening autonomii decyzyjnej, trening umiejętności integracji ze społecznością lokalną, trening załatwiania spraw urzędowych) dla czterech grup uczestników. Opiekun mieszkania treningowego nadzorował pracę w mieszkaniu i utrzymywał stały kontakt z rodzinami uczestników przekazując im informacje o postępach treningu i wskazania do dalszej pracy w środowisku domowym w celu utrwalenia efektów treningu. Realizowano również kolejne zadanie z zakresu rozwoju usług asystenckich – asystę rodziny, w ramach której ze wsparcia 3 asystentów rodziny skorzystało 41 osób.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	1 008 568	nd.	369 600	622 099	nd.
Fundusze strukturalne	853 750	nd.	323 548	530 202	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	80 354	nd.	30 452	49 902	nd.
Środki kredytu	0	nd.	0	0	nd.
Środki własne	74 464	nd.	15 600	41 995	nd.

RAMIĘ W RAMIĘ. ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W KATOWICACH – II ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	ODDZIAŁYWANIE	STATUS PROJEKTU
MOPS	2020-2022	HORYZONTALNE	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Głównymi działaniami w ramach projektu była m.in.: realizacja usług asystenta rodziny; asystenta osoby niepełnosprawnej; realizacja mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; utworzenie nowych miejsc w Specjalistycznym Klubie Młodzieżowym nr 3 w Zawodziu.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2020

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną początkowo udzielano uczestnikom wsparcia online, następnie prowadzono indywidualne treningi usamodzielniania, a od września rozpoczęto grupowe treningi. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa pobyty grupowe trwające 3 tygodnie i siedem pobyty adaptacyjnych, jedno tygodniowych. Przygotowując się do wznowienia działalności mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, przeprowadzono remont i bieżące konserwacje mieszkania przy ul. Chopina 9.

2021

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- Mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, przeprowadzono łącznie 105 indywidualnych treningów, z których skorzystało 14 uczestników projektu. W ramach zajęć indywidualnych ćwiczone umiejętności interpersonalne. Ponadto w okresie sprawozdawczym odbyło się 12 pobyty jednodniowych, 8 pobyty dwudniowych oraz 1 pobyt trzydniowy, z których skorzystało łącznie 15 osób, w tym 3 kobiety i 12 mężczyzn. Dodatkowo zorganizowano wyjście do Galerii Sztuki Współczesnej, wyjście na ognisko oraz warsztaty malowania drewnianych skrzynek na Dzień Matki i wyjście do kina.
- Wsparcie rodziny, w ramach którego usługi świadczyli asystenci rodziny, pedagog oraz terapeuta. Usługami pedagoga oraz terapeuty objętych zostało 50 osób. Usługami asysty rodzinnej objętych zostało 55 rodzin.

2022

W ramach projektu realizowano następujące zadania:

- mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie w roku 2022 przeprowadzono łącznie 111 indywidualnych treningów, z których skorzystało 18 uczestników projektu. W ramach zajęć indywidualnych ćwiczone umiejętności interpersonalne. Ponadto w okresie sprawozdawczym odbyły się 23 pobyty jednodniowe, z których skorzystały łącznie 22 osoby, w tym 8 kobiet i 14 mężczyzn. Dodatkowo zorganizowano m.in. 15 nocy filmowych, 4 wyjścia na pizzę, 6 wyjść do kina, wyjście do teatru, wyjazd do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach, 2 wyjścia na grilla, 3 warsztaty kulinarne organizowane przez firmę PrzetwoLove, wyjście do Biblioteki Śląskiej, wyjście do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności,
- wsparcie rodziny, w ramach którego usługi świadczyli asystenci rodziny, pedagog oraz terapeuta. Z usług pedagoga oraz terapeuty skorzystało 46 osób. Z usług asystentów rodziny skorzystało 67 rodzin,
- asystentura osobista osoby niepełnosprawnej w celu nabycia, przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej przez rodziny objęte wsparciem. W okresie sprawozdawczym z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej skorzystało 56 osób. W 2022 roku zrealizowano 14 797 godzin zegarowych usług AOON.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	2 508 779	1 126 455	1 382 324	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	2 129 560	974 199	1 155 362	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	200 430	91 689	108 741	nd.	nd.
Środki kredytu	0	nd.	0	nd.	nd.
Środki własne	178 789	60 567	118 222	nd.	nd.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC I DĄB

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	OBSZAR ZDEGRADOWANY	STATUS PROJEKTU
MOPS	2021-2022	WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC, DĄB	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt miał na celu poprawę funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec - Dąb, a także wzrost spójności całego obszaru, zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej. W ramach projektu będą realizowane m.in. animacja lokalna, klub aktywnego mieszkańca, program wspierający reintegrację zawodową i działania środowiskowe

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2021

Zrealizowano szereg działań w trybie stacjonarnym oraz online na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej m.in.:

- 139 spotkań w ramach Organizowania Społeczności, w tym:
 - 71 spotkań animacyjnych (m.in. warsztaty walentynkowe, tworzenie kartek wielkanocnych na rzecz Hospicjum Cordis, tworzenie pisanek i wianków wielkanocnych, warsztaty wielkanocne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach, gry i zabawy animacyjne dla dzieci, letni luzik z PAL-W – cykl letnich animacji i warsztatów podwórkowych, gry i zabawy animacyjne dla dzieci, warsztaty tworzenia biżuterii technika pracy z żywicą, malowanie na jedwabiu, rodzinne warsztaty świąteczne),
 - 39 spotkań w ramach Klubu Społecznościowego „Strefa Rodzica” (m.in. warsztaty plecienia makramowych kwietników, tworzenie personalizowanych breloczków, zdobienie skrzynek metodą decoupage, warsztaty kulinarne z tworzenia pączków, tworzenie koszyczków z wikliny papierowej, warsztaty farbowania koszulek, warsztaty tworzenia biżuterii na Dzień Matki, spotkanie z dietetykiem nt. chorób krążenia, spotkania „W kręgu kobiet” dot. uzależnień wśród dzieci i młodzieży, nowych mediów jako obszaru zagrożeń dla dzieci, trening budowania poczucia własnej wartości,
 - 29 spotkań w ramach Klubu Społecznościowego „Strefa Młodzieży” (m.in. warsztaty zdobienia eko przyborników, warsztaty kulinarne, tworzenie kartek walentynkowych, komponowanie personalizowanych breloczków, dekorowanie lampionów w stylu boho, Klub Wolontariusza (m.in. spotkania dotyczące podjęcia wolontariatu, pomocy w planowaniu i organizowaniu wydarzeń lokalnych oraz imprez z inicjatywy mieszkańców, współprowadzenie zajęć kreatywnych dla dzieci, warsztaty rozwojowe „Każdy może zostać bohaterem”, trening twórczego myślenia, warsztaty rozwojowe dot. m.in. komunikacji interpersonalnej, profilaktyki w Internecie i nowych technologii),
- 16 spotkań Akademii Aktywnego Mieszkańca dla seniorów,
- 91 spotkań w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym, w tym 8 spotkań w ramach Klubu Społecznościowego „Strefa Seniora”, m.in. zajęcia Nordic Walking, tworzenie zakładki do książek, zdobienie obrazów metodą decoupage, zdobienie szklanych butelek, dekorowanie drewnianych przyborników, tworzenie wiosennych koszyczków, spotkanie dot. dbania o zdrowie, trening pamięci, kreatywności i refleksyjności, warsztaty ogrodnicze, warsztaty dot. paintingu, tworzenie eko drzewek szczęścia, wielkanocne warsztaty malowania na szkle, warsztaty kulinarne, spotkanie z dietetykiem,
- 32 aktywności w ramach działań środowiskowych wzmacniających potencjał i integrację społeczności lokalnej, w tym:
 - 15 wyjść integracyjnych m.in. do kina „Światowid”, rodzinne wyjście integracyjne do śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, wycieczka rowerowa dla młodzieży szlakiem katowickich murali po Dzielnicach Wełnowiec-Józefowiec i Dąb, wycieczka edukacyjno-integracyjna dla Seniorów do Wisły i Koniakowa, rodzinny wyjazd integracyjny do Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz zagrody „Nieźle Ziółka”, wyjście seniorów do MDK „Koszutka” filia „Dąb” na spektakl „Mianujom mie Hanka”, rodzinne wyjście integracyjne, na spacer w ciemności w „Ważnym Miejsku” oraz
 - 4 wyjścia kulturalne w ramach wsparcia udziału uczestników projektu i ich otoczenia w lokalnych i regionalnych imprezach kulturalnych i sportowych - na spektakl muzyczny pt. „Pinokio. Il grande”, w którym wzięły udział 24 osoby oraz udział w koncercie „Pożegnania lata” Bożeny Mielnik ze specjalnym udziałem Waldemara Wiśniewskiego, wyjście na spektakl Teatru Piasku Tetiany Galitsyny pt. „Mały Książę” oraz do „Ogrodu światła Lampa Aladyna”.

Zrealizowano szereg działań w trybie stacjonarnym oraz online na rzecz organizowania i wspierania społeczności lokalnej m.in.:

- 158 spotkań w ramach „Organizowania Społeczności Lokalnej”:
 - 89 spotkań animacyjnych (w tym m.in. spotkania dotyczące uczestnictwa w projekcie, warsztaty kulinarne dla dzieci pn. „Kisz Mi Kids”, warsztaty pieczenia walentynkowych serc, wieczory planszówkowe, kreatywne warsztaty wielkanocne, warsztaty ilustratorskie, warsztaty tworzenia kokodemy dla dzieci, majsterkowanie dla dzieci, jesienne warsztaty kreatywne dla dzieci, rodzinne warsztaty kulinarne),
 - 40 spotkań w ramach Klubu Społecznościowego „Strefa Rodzica” (m.in. warsztaty kreatywne „Nowy Rok – Nowa Ja, na mapie marzeń”, warsztaty kulinarne, warsztaty tworzenia makram, spotkanie z dietetykiem, warsztaty pielęgnacyjne, spotkania z psychologiem: „Trudne emocje – jak sobie z nimi radzić i jak przeprowadzić przez nie dzieci”, „Jak rozwijać asertywność u dzieci i dlaczego warto to robić?”, warsztaty „Myślenie wizualne”),
 - 29 spotkań w ramach Klubu Społecznościowego „Strefa Młodzieży” (m.in. spotkania w ramach akcji „Ferie z PAL-W”, warsztaty filmowe, warsztaty kreatywne zdobienia szkatulek, warsztaty pn. „Myślenie wizualne”, cykl warsztatów kreatywnych, warsztaty kulinarne, warsztaty tworzenia drewnianych dekoracji z bluszczem, warsztaty kreatywne, warsztaty szycia termoforów, warsztaty szycia organizatorów, świąteczne warsztaty florystyczne),
- 77 spotkań w ramach „Organizowania Społeczności Lokalnej” dla osób w wieku senioralnym (m.in. zajęcia jogi, spotkanie pn. „Wspomnień czar - nasze życie na fotografiach”, trening umiejętności społecznych, spotkania z dietetykiem, warsztaty walentynkowe, warsztaty kreatywne, cykl warsztatów rozwojowych, warsztaty kulinarne, szycie świątecznych woreczków),
- 8 inicjatyw oddolnych, które powstały w ramach „Akademii Aktywnego Mieszkańca dla Seniorów” oraz „Akademii Aktywnego Mieszkańca dla Dorosłych i Młodzieży”,
- 55 aktywności w ramach działań środowiskowych wzmacniających potencjał i integrację społeczności lokalnej, w tym:
 - 18 wyjść integracyjnych: m.in. wyjścia integracyjne do kina, wyjście młodzieży i dzieci do parku trampolin w ramach akcji „Ferie z PAL-W”, wyjście dzieci i młodzieży do Galerii Sztuki Współczesnej BWA na warsztaty ekspresji twórczej, wyjście seniorów do kina na seans „Wiki i jej Sekret”, wycieczka osób w wieku senioralnym do Gliwic, wyjście dla dorosłych do Centrum Rozrywki LASERHOUSE, młodzieżowy Mini Rajd do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego,
 - 14 wyjść kulturalnych w ramach wsparcia udziału uczestników projektu i ich otoczenia w lokalnych i regionalnych imprezach kulturalnych i sportowych m.in.: wyjście dorosłych na koncert Marcina Wyrostka do Filharmonii Śląskiej, wyjście kobiet do Teatru Rozrywki w Chorzowie na musical „Zakonnica w przebraniu”,
 - 11 wydarzeń lokalnych: m.in. gra terenowa „Polowanie na PAL-owe pisanki”, „Sąsiedzki piknik wielkanocny”, „Wspólne pichcenie z Mieszkańcami”, „EKO piknik”, „Szafing, czyli wiosenne wietrzenie szaf na Wełnie”, „Kino plenerowe”, „Rodzinna gra terenowa – złap szczęście” zorganizowana we współpracy z Teatrem Ateneum,
 - 23 sąsiedzkie wymiany ubrań i akcesoriów (PALDZIELNIA),
 - certyfikowane szkolenie z „I pomocy przedmedycznej” dla 12 osób,
 - realizacja Programu wspierającego reintegrację zawodową mieszkańców dzielnic Wełnowiec-Józefowiec i Dąb”, w okresie sprawozdawczym zrealizowano: indywidualną edukację prozawodową, spotkania indywidualne z psychologiem, trening pracy, staż zawodowy, 24 kursy/szkolenia, „Trening Umiejętności Społecznych”, „Grupowe Warsztaty Aktywizacyjne”.

Efektom realizacji instrumentu aktywnej integracji o charakterze zawodowym jest:

- podjęcie pracy po opuszczeniu programu przez 14 uczestników projektu,
- poszukiwanie pracy po opuszczeniu programu przez 5 uczestników,
- uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 20 uczestników.

DANE FINANSOWE					
Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2019 r.
Razem wydatki	906 768 zł	276 129 zł	630 639 zł	nd.	nd.
Fundusze strukturalne	768 938 zł	276 129 zł	492 809 zł	nd.	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	137 830 zł	0	137 830 zł	nd.	nd.

CENTRUM AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻOWEJ

PODMIOT REALIZUJĄCY

MOPS

LATA REALIZACJI

2020-2023

ODDZIAŁYWANIE

HORYZONTALNE

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Zwiększenie poziomu aktywności społeczno - zawodowej młodych dorosłych (18 - 30 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację programu aktywności lokalnej w Katowicach w formie działań środowiskowych i prozatrudnieniowych.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2021

W okresie sprawozdawczym przeznaczono środki na zakupy materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy młodzieżowej pn. Strefa Zwierzoraju, która odbyła się w dniu 18.09.2021 r.

2022

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 6 inicjatyw młodzieżowych tj.: "Strefa Zwierzoraju v.2", "Zielono mi - zacznijmy jeszcze raz razem", "Charytatywny Festyn Rodzinny na zakończenie wakacji", "Załęskie kino plenerowe", "Piknik integracyjny", "Aktywizacja kulturalna dzielnicy Szopienice poprzez murale na Hucie Uthemanna".

2023

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 3 inicjatywy młodzieżowe (Eko Kato, Zdrowie na kanapie, Młodzież dla Seniorów). Projekt zakończono.

DANE FINANSOWE

Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2023 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia projektu po 2023 r.
Razem wydatki	1 187 005 ¹¹	34 970	73 256	31 336	nd.
Fundusze strukturalne	1 009 076	16 293	38 492	19 943	nd.
Dotacje stanowiące wkład krajowy	118 717	1 918	4 529	2 347	nd.
Środki kredytu	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Środki własne	59 211	16 759	30 234	9 045	nd.

¹¹ W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera tj. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w kwocie 1.047.444 zł (EFS 934.348 zł; BP 109.923 zł; wkład własny 3.173 zł)
